Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Service public de l'assainissement collectif

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX
REGIE INTERESSEE
SAAPD



Rapport du concessionnaire pour l'exercice 2024

En application de l'article L3131-5 du Code de la Commande Publique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.1. Le contrat 5
Le contrat 5
Le service concédé 5
Chap.2. Présentation de l'entreprise 6
Le groupe FCC 6
L'organisation de AQUAD 6
Chap.3. Les indicateurs du service assainissement 7
Chap.4. Les faits marquants de l'exercice 10
Les postes de relèvement 10
Le réseau 10
Les stations d'épuration 11
Chap.5. La description du patrimoine 15
Le schéma général 15
Le réseau de collecte 18
Les postes de relèvement 22
Les siphons 23
Les déshuileurs 23
Les bassins d'orage 24
Les points de rejet au milieu naturel 24
Les ouvrages de traitement 25
Chap.6. L'exploitation du service 39
Les indicateurs du service 39
Les interventions réalisées sur les postes de relèvement 39
Les interventions réalisées sur le réseau de collecte 42
Les autres données relatives au service 45
Chap.7. La gestion du patrimoine 60
L'inventaire des installations 60
Le contrôle de l'état du patrimoine 62
Les travaux de renouvellement réalisés par le délégataire 64
Les ouvrages et installations mises hors service 65
Les travaux financés par la collectivité 65
La facture 120 m^3 66
Chap.8. L'amélioration et l'évolution du service 68
Les interventions programmées par le délégataire 68
Les améliorations proposées par le délégataire 69
Les évolutions réglementaires 70
Chap.9. Le compte rendu financier 74

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap. 10. La gestion clientèle 75
Chap. 11. Annexes 80
ANNEXE 1 : Attestation d'assurance.....80
ANNEXE 2 : Fonctionnement des postes de relevage 81

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

73 969 habitants



Prix de l'assainissement HT
(Part collectivité au 1er janvier 2024)

Abonnement moyen annuel : **65.79€**
Prix moyen du m³ : **3,32 €**

398 km de réseau eaux usées
38 km de réseau unitaire
236 km de réseau eaux pluviales
147 postes relevage eaux usées et pluviales
44 postes relevage privatifs
5 stations de traitement des eaux usées

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.1. Le contrat

Le contrat

Les dates qui définissent depuis son origine les principales étapes de la régie intéressée sont présentées dans le tableau ci-après.

Désignation	Date de prise d'effet	Objet
Contrat	01/10/2023	▪ Concession du service public d'assainissement collectif sous la forme d'une régie intéressée

L'échéance du présent contrat est fixée au **31 décembre 2029**.

Les données 2023 ont été extraites du RAD 2023.

Le service concédé

Le périmètre de la concession est délimité par les communes suivantes :

- ✓ EU à compter du 01/10/2023 : Abondant, Aunay-sous-Crécy, Charpont, Chérisy, Crécy-Couvé, Dreux, Ecluzelles, Ezy-sur-Eure, Garnay, Ivry-la-Bataille, Le Boullay-Mivoye, Le Boullay-Thierry, Luray, Marville-Moutiers-Brulé, Mézières-en-Drouais, Sainte-Gemme-Moronval, Saulnières, Sérazereux, Tréon, Vernouillet, Vert-en-Drouais, Villemeux-sur-Eure ;
- ✓ EU à compter du 01/01/2024 : Châteauneuf-en-Thymerais, Saint-Sauveur-Marville (hameau de Bigeonnette), Thimert-Gâtelles ;
- ✓ Systèmes d'assainissement : Dreux, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Châteauneuf en Thymerais, Villemeux-sur-Eure (Cherville) ;
- ✓ Contrôle des branchements : Ardelles, Beauche, Bérou-la-Mulotière, Brezolles, Crucey-Village, Guainville, Laons, Le Mesnil-Simon, Maillebois (01/01/2024), Montreuil, Oulins, Saint-Georges-Motel, Saint-Maixme-Hauterive (01/01/2024), Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Sauveur-Marville, Tremblay-les-Villages ;
- ✓ EP à compter du 01/10/2023 : Abondant, Allainville, Aunay-sous-Crécy, Boissy-en-Drouais, Charpont, Chérisy, Crécy-Couvé, Dreux, Garancières-en-Drouais, Garnay, Ivry-la-Bataille, Le Boullay-Mivoye, Le Boullay-Thierry, Louvilliers-en-Drouais, Luray, Marville-Moutiers-Brulé, Mézières-en-Drouais, Sainte-Gemme-Moronval, Saulnières, Sérazereux, Tréon, Vernouillet, Vert-en-Drouais, Villemeux-sur-Eure ;
- ✓ EP à compter du 01/01/2024 : Châteuneuf-en-Thymerais ;

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.2. Présentation de la société dédiée


La **SAAPD, Société d'Assainissement de l'Agglomération du Pays de Dreux**, qui opère à partir de l'agence de Vernouillet (28), est une société dédiée au contrat assainissement de l'Agglomération du Pays de Dreux. Le nom commercial est AQUAD.

Aqualia France apporte une assistance et un support à AQUAD par le biais de ces services support :

Le service commercial,
La direction technique,
Le service facturation,
Le service comptabilité et financier,
Les ressources humaines,
Le service Qualité Sécurité Environnement.

Le service du présent contrat d'assainissement est géré par l'agence de la SAAPD dont l'organisation est décrite ci-après :

Les moyens humains :

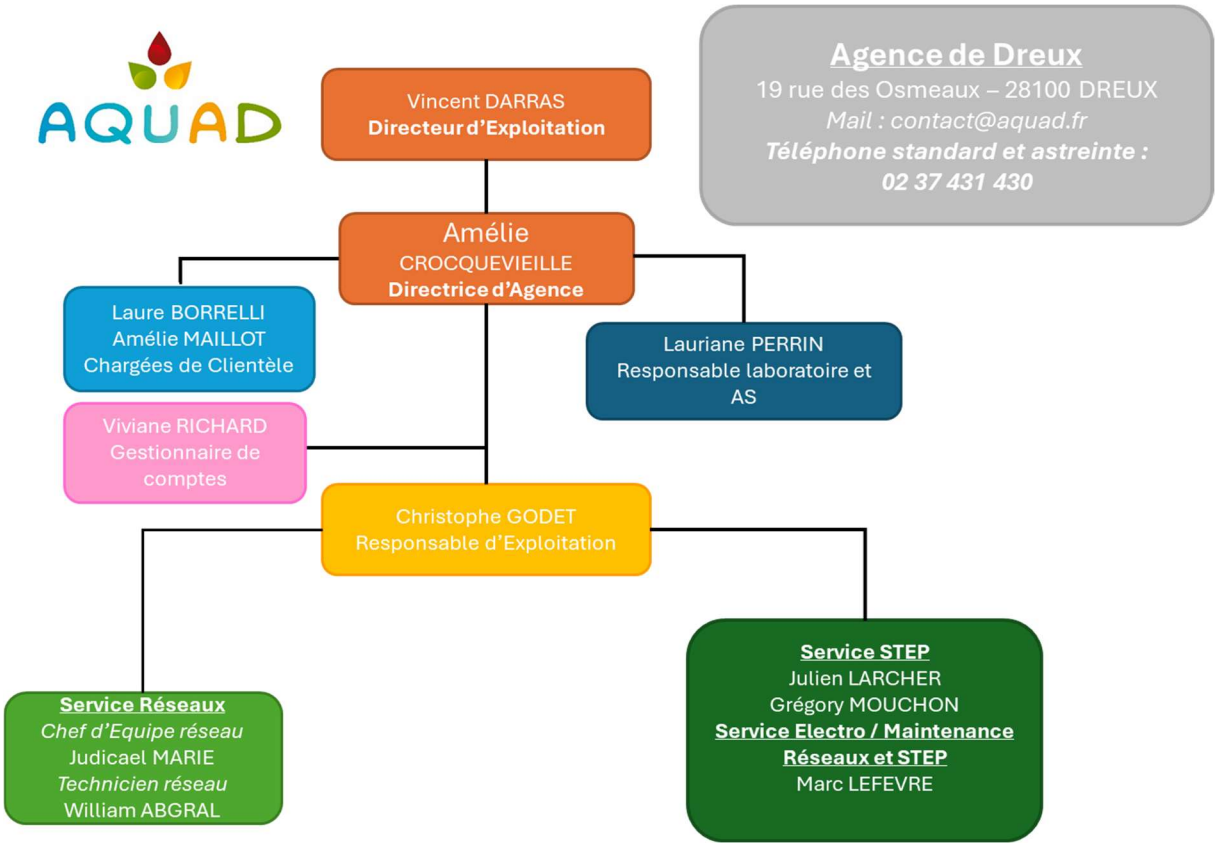

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.3. Les indicateurs du service assainissement

Les données devant figurer dans le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement prévu par l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales sont récapitulées ci-après. Elles sont complétées par les données financières figurant dans le compte-rendu financier.

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après, listés à l'annexe V du CGCT, sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service assure l'assainissement.

Code	Caractérisation technique du service		Valeurs 2023	Valeurs 2024
	Présentation du territoire desservi	Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux		
	Mode de gestion du service		Régie intéressée à compter du 01/10/2023	
	Date d'échéance du ou des contrats de délégation du service		31/12/2029	
D 201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif		70 120	73969
VP.056	Nombre d'abonnés (assainissement collectif)		12 593	19 972
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées		2	5
VP.200	Linéaire de réseau de collecte séparatif des eaux usées (hors branchements et refoulement)		381,34 Km	326,161 Km
VP.199	Linéaire de réseau de collecte unitaire (hors branchements et refoulement)		37,31 km	38,027 km
	Linéaire de réseau de collecte séparatif des eaux pluviales (hors branchements et refoulement)**		216,18 Km	235,371 Km
	Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants		STEP Dreux	STEP Dreux
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (MS)		244,15 TMS (oct-déc 2023)	675,23 TMS
	Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants		STEP EZY	STEP EZY
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (MS)		59,2 TMS (oct-déc 2023)	132,19 TMS

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Code	Caractérisation technique du service	Valeurs 2023	Valeurs 2024
	Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants	STEP IVRY	STEP IVRY
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (MS)	5,4 TMS (oct-déc 2023)	49,57 TMS
	Identification des ouvrages d'épuration des eaux usées, capacités d'épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants	STEP CHATEAUNEUF	STEP CHATEAUNEUF
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (MS)	-	31,65 TMS
VP.068	Assiette totale de la redevance (€)	-	2 787 776

Code	Indicateurs de performance	Valeurs 2023	Valeurs 2024
D204.0	Prix moyen TTC du service au m^3 pour 120 m^3 au 1/01/2024	2,78	3,32
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (détail dans tableau ci-après)***	26	26
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100 %	100 %
VP.046	Nombre de points noirs	62	62
	Linéaire de réseau renouvelé par le délégataire en 2024	0 km	0 km
	Linéaire de réseau renouvelé par le délégataire de 2023 à 2024	0 km	0 km
	Linéaire de réseau curé	4 865 ml (oct-déc 2023)	56 446 ml
	Désobstruction de conduites et de branchements	24 (oct-déc 2023)	54
	Linéaire des réseaux de collecte des eaux usées inspecté (ITV)	43,2 ml (oct-déc 2023)	16 124 ML
	Nombre de contrôles de conformité des branchements (toutes prestations confondues)	221 (oct-déc 2023)	751
P251.1	Taux de débordement d'effluents chez les usagers	-	~ 0
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées*	26	26
P258.1	Taux de réclamations (%)	-	4,41

** pour les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants*

**** + 10 points supplémentaires car mise en place d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau*
+ 10 points supplémentaires car mise en place d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement
- 2 points pour la connaissance de la date ou période de pose des canalisations
+ 1 point pour la connaissance de l'altimétrie des canalisations

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées		
	Descriptif	**2024**
Partie A : Plan des réseaux	VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10 points / non : 0 point)	10
Partie A : Plan des réseaux	VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 points / non : 0 point)	5
Sous-total - Partie A	**Plan des réseaux (15 points)**	**15**
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)	10
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (0 à 5 points)	0
Partie B : Inventaire des réseaux	VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15 points)	0
Sous-total - Partie B	**Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)**	**25**
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)	12
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,) (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)	0
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points)	10
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux	VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)	0
Sous-total - Partie C	**Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)**	**52**
TOTAL (indicateur P202.2B)	**Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées**	**92**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.4. Les faits marquants de l'exercice

Les postes de relèvement

➢ PR210 Charpont

- Décembre 2024, maintenance :

Le poste Charpont a fait l'objet d'une maintenance complète et d'un entretien de différents organes. A cette occasion, les 2 cuves ont été curées et mises à blanc. La vanne à palette d'arrivée a été remplacée sur la cuve 2. Le distributeur pneumatique de la cuve 2 a également été remplacé. Les poulies et les courroies des surpresseurs qui étaient en mauvais état ont été renouvelées.
En parallèle de cette maintenance, AQUAD a débuté une enquête sur les ECPP. Une proposition de communication auprès des administrés est à l'étude à l'Agglomération, sous forme de flyer.

➢ PR PIJONSSON

- Mai 2024, réparation du refoulement du poste :

La canalisation de refoulement a cassé, les clapets et les vannes sur les canalisations de refoulement ont été renouvelées.

En 2024, 154 interventions curatives ont été réalisées sur l'ensemble des postes de relèvements du territoire. Les principaux motifs d'intervention sont : Coupure électrique, pompe bouchée, poire de niveau HS, défaut général poste, divers défauts pompe et de nombreux niveaux hauts.

Le réseau

➢ Systèmes de collecte de Dreux

- Juillet 2024, expertise technique des dispositifs d'autosurveillance :

La société SGS, mandaté par l'AESN, a réalisé une expertise technique des DO supérieur ou égal à 120 kgDBO5/j et trop plein qui se rejettent en milieu naturel de la ville de Dreux. Le contrôle comprenait une partie de vérification administrative (contrôle du manuel d'autosurveillance, du scénario SANDRE, et des documents sur les ouvrages réseau) ainsi qu'une partie contrôle et vérification du bon fonctionnement des dispositifs de mesure sur le terrain et du/des pluviomètres associés.
Des mesures correctives ont été apportées à la suite de ce contrôle.


19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les stations d'épuration

➢ STEP de DREUX

- Juillet 2024, désensablage du PR principal et renouvellement de 2 pompes :

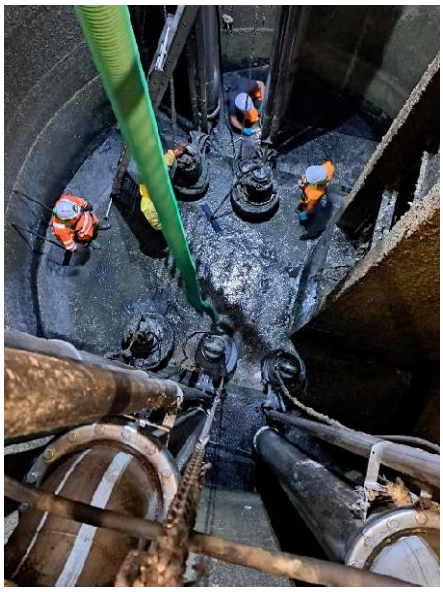

Après ballonage des 2 collecteurs d'entrée et le by-pass des effluents via des motopompes, la société SVR a effectué sous ARI le curage du poste. Un fois vidé, AQUAD a procédé à la vérification et resserrage des pieds d'assise des pompes ainsi qu'au renouvellement de 2 pompes. En l'absence de palan au-dessus du poste, la mise en place d'un nouveau moyen de levage a été nécessaire pour procéder à cette lourde opération.

- Février 2024, test du by-pass en A5 :

Le by-pass de la station d'épuration de Dreux a été testé le 21/02/2024 par temps sec. Le réseau stocke jusqu'à un certain point avant de déborder rue des Osmeaux. Cependant, le A5 ne déborde pas. La conclusion de ce test est :

1- Un bassin d'orage est indispensable
2- Le by-pass en A5 est inefficace et en temps de pluie, aucune décharge n'est possible sur la station
3- Le laps de temps pour une réaction opérationnelle en temps sec est de 1 h 30 en cas d'arrêt des pompes. En temps de pluie, nous l'estimons à 20 minutes
4- Nous n'avons pas réalisé la même expérience en temps de pluie ; aux vues des risques de débordement notamment en centre-ville et vers la zone occupée par les gens du voyage rue des Osmeaux.

Un rapport a été rédigé et envoyé à l'AESN et la DDT28.

- Juillet et Aout 2024, crise des surpresseurs d'air :

Le surpresseur B a lâché en juillet 2024 donnant lieu à la 1ère crise. AQUAD a mis en place un surpresseur ARZEN de secours afin d'assurer l'aération suffisante des bassins biologiques.
Le surpresseur C a lâché mi-aout 2024 donnant lieu à la 2ème crise. Le surpresseur ARZEN de secours a donc été conservé jusqu'à réparation des surpresseurs.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- Avril-Mai 2024, maintenance de la centrifugeuse :

AQUAD a réalisé une maintenance poussée de la centrifugeuse avec Andritz. La mise en place d'une unité mobile de déshydratation a été nécessaire en l'absence de secours sur l'atelier de traitement des boues. Les pièces suivantes ont été remplacées :
- Plateau bol
- Plaquettes de niveau qui n'avaient plus de graduations
- Buses de vis
- Petites fournitures (joints, visseries)

La pièce suivante a été réparée :
- Vis convoyeuse : Rechargement du distributeur avec une remise en état du revêtement puis équilibrage à haute vitesse

- Mars 2024, reprise de apports extérieurs :

Les apports de matières de vidange et de lixiviats ont repris en mars 2024. Le process de traitement étant stabilisé, AQUAD a validé les conventions et les protocoles de dépotage avec les différents apporteurs.
Ainsi, en 2024, la Step de Dreux a réceptionné 4999m3 de matières de vidange et 12077m3 de lixiviats.

- Aout 2024, remise en service de la flottation en automatique :

À la suite de l'intervention de SNEF pour la maintenance et la fourniture d'une nouvelle vanne Masoneilan, la flottation a pu être remise en service en automatique. Cela a permis d'améliorer le rendement de la centrifugeuse.

- Octobre 2024, mise en service des panneaux photovoltaïques :



Le chantier de pose des panneaux photovoltaïques sur le stockeur à boues s'est terminé en juin 2024. Le temps d'acquérir les diverses autorisations, la mise en service a eu lieu en octobre 2024. Le 07 novembre 2024 s'est déroulé l'inauguration de l'installation en présence de M. Le Président de l'Agglomération et de M. Le Vice-Président en charge de l'Assainissement de l'Agglomération.
Les 3 500 m2 de panneaux photovoltaïques produiront 730 000 kWh par an, ce qui représente 24% de la consommation totale de la Step.

- Visite de site :

La mission locale du Drouais a visité la Step en mai 2024.
Le pôle ressource de l'Agglomération du Pays de Dreux a visité le site sur 2 journées en novembre 2024.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025

La direction des déchets de l'Agglomération du Pays de Dreux, dans le cadre de ses ateliers citoyens, a visité la Step en présence d'administrés volontaires, en novembre 2024.

➢ STEP de EZY-SUR-EURE

- Juillet 2024, réparation du clarificateur :
-



Une dégradation du béton a été détecté sur le clarificateur de la Step d'Ezy-sur-Eure.
Un protocole de réparation a été mis en place en lien avec la DDT27.
L'utilisation du ciment prompt n'était pas adaptée donc AQUAD a réparé avec du matériau adapté (résistant à l'eau et aux différences de température) et une élasticité permettant de supporter les mouvements de la lame déversante.

➢ STEP de IVRY-LA-BATAILLE

- Janvier 2024, renouvellement de l'oxyclone :

Début janvier 2024, la Step d'Ivry-la-Bataille a débordé à la suite du colmatage de la conduite entre le prétraitement et le bassin d'aération. Cela n'a pas eu d'impact sur le milieu récepteur. Le colmatage est la conséquence du non-fonctionnement de l'oxyclone. Celui-ci a été remplacé.

➢ STEP de CHERVILLE

- Mars 2024, inauguration de la Step :

Le 27 mars 2024 au matin a eu lieu l'inauguration de la Step en présence de M. Le Président de l'Agglomération et de M. Le Vice-Président en charge de l'Assainissement de l'Agglomération.

- Septembre 2024, vandalisme :

La Step de Cherville a été le théâtre de vandalisme début septembre 2024 n'engendrant aucun impact sur la production de la Step ni sur le milieu récepteur.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ STEP de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

- Janvier 2024, prise en main de l'exploitation de la Step :

Après un tuilage de 2 jours sur le terrain avec SUEZ, AQUAD a pris en main l'exploitation de la Step.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.5. La description du patrimoine

Le schéma général

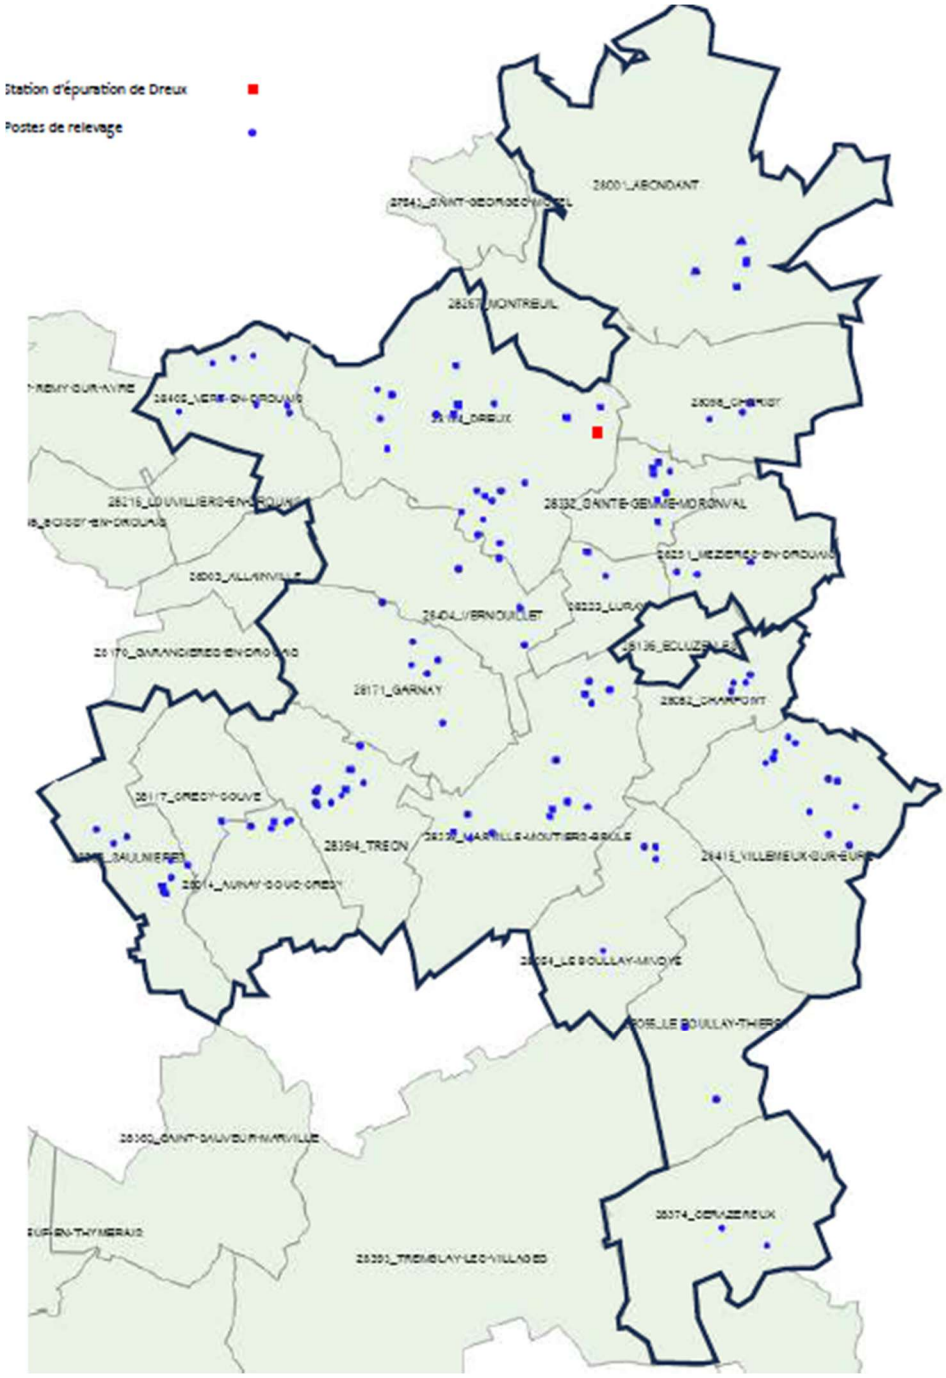


Figure 1 – Zone de collecte des eaux usées du système de Dreux

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

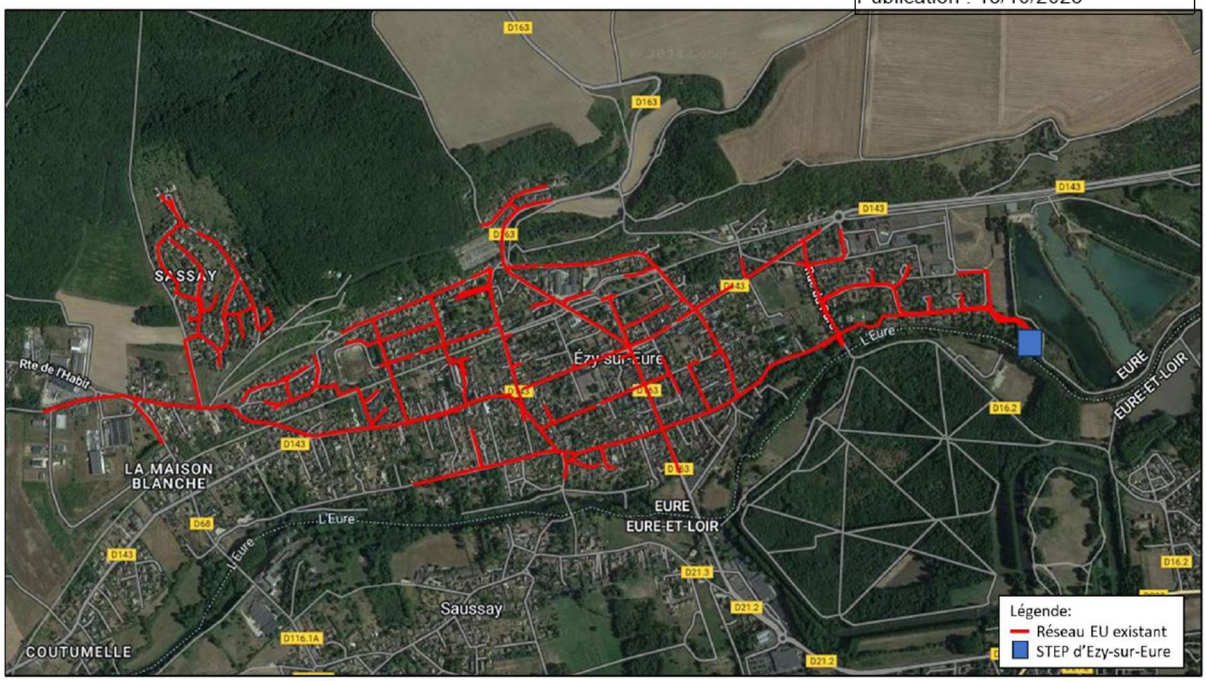


Figure 2 - Plan du réseau d'assainissement du système de Ezy-sur-Eure

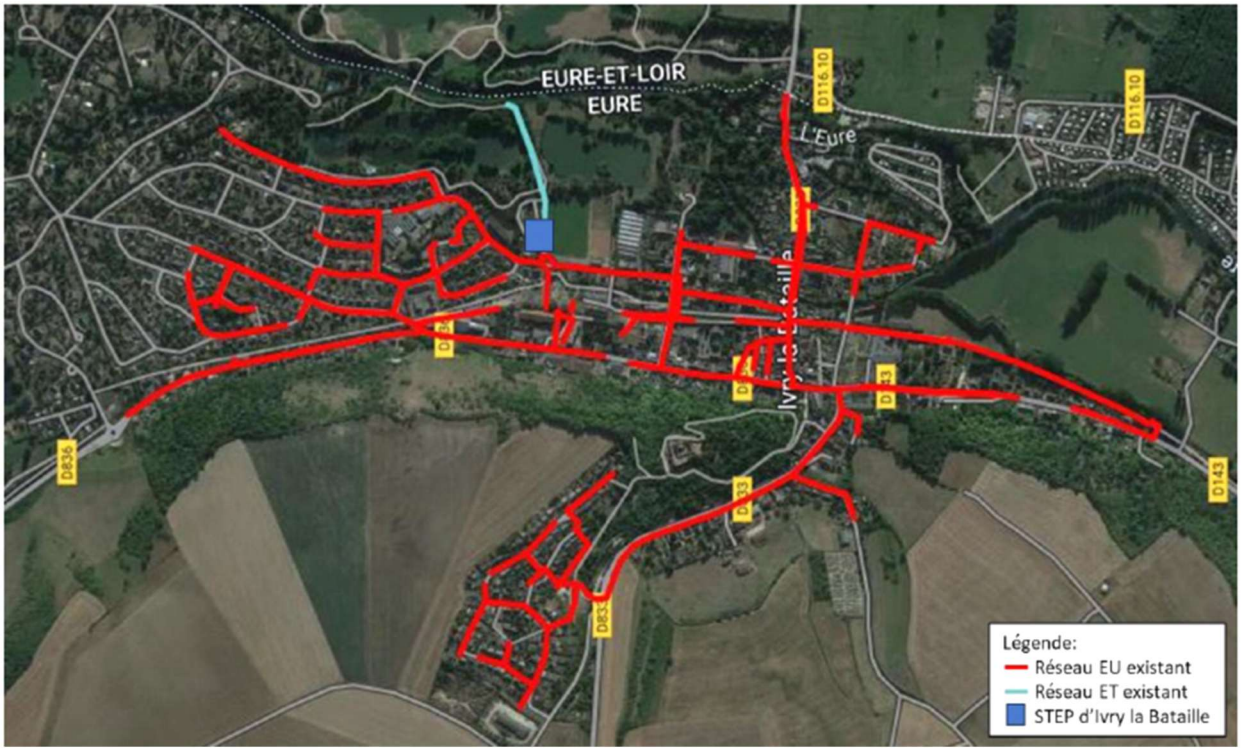


Figure 3 - Plan du réseau d'assainissement du système de Ivry-la-Bataille

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

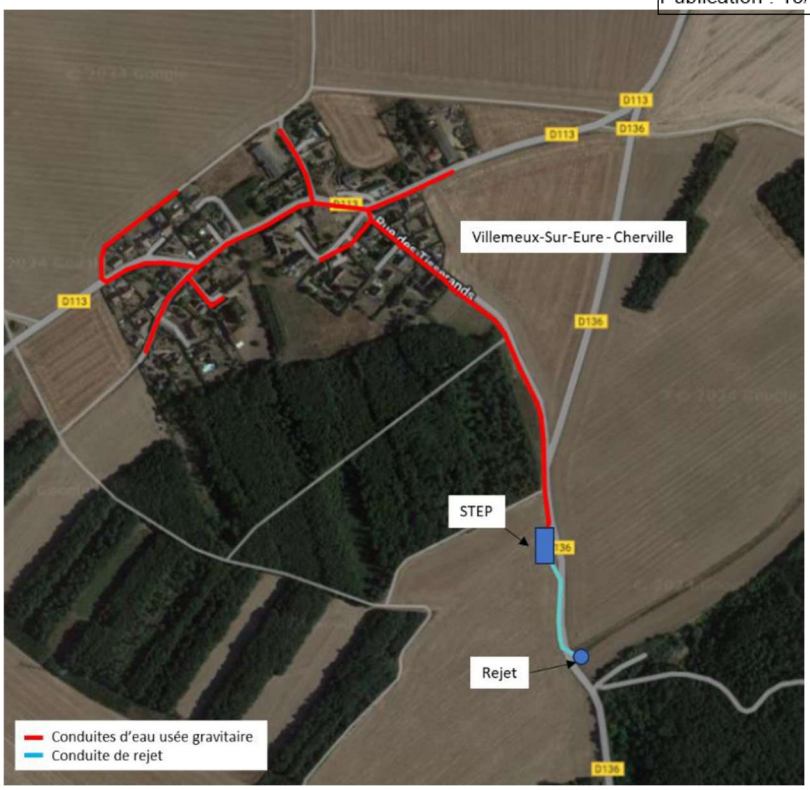


Figure 4 - Plan du réseau d'assainissement du système de Cherville

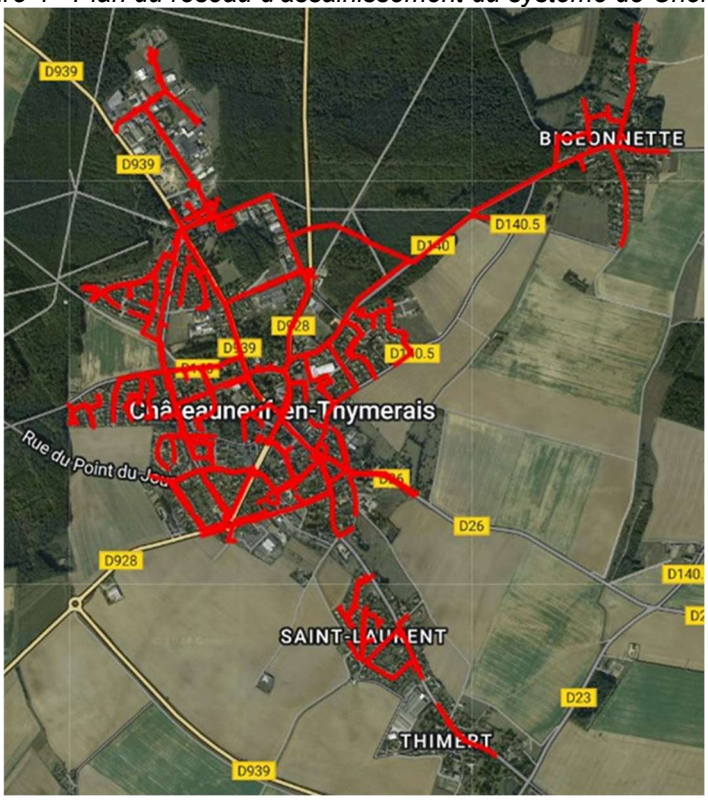


Figure 5 - Plan du réseau d'assainissement du système de Châteauneuf-en-Thymerais

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Le réseau de collecte

➢ Le linéaire de réseau

Les caractéristiques du linéaire du réseau sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Type de réseau	Linéaire (m)
Eaux usées hors refoulement	326 161
Eaux pluviales hors refoulement	235 371
Eaux unitaires hors refoulement	38 027
Total canalisations	599 559

Le détail par commune pour l'année en cours est le suivant :

COMMUNE D'IMPLANTATION	TYPE RESEAU	Linéaire (m)
ABONDANT	Eaux usées hors refoulement	10 861
	Eaux usées en refoulement	2 761
	Eaux pluviales hors refoulement	8000
Total ABONDANT		**21 623**
ALLAINVILLE	Eaux pluviales hors refoulement	15
Total ALLAINVILLE		**15**
AUNAY-SOUS-CRECY	Eaux usées hors refoulement	3 506
	Eaux usées en refoulement	1 841
	Eaux pluviales hors refoulement	1 585
	Unitaire hors refoulement	**1 282**
Total AUNAY-SOUS-CRECY		**8 214**
BOISSY-EN-DROUAIS	Eaux pluviales hors refoulement	989
Total BOISSY-EN - DROUAIS		**989**
CHARPONT	Eaux usées hors refoulement	4 259
	Eaux usées en refoulement	6 671
	Eaux pluviales hors refoulement	1 650
Total CHARPONT		12 580
CHERISY	Eaux usées hors refoulement	**11 709**
	Eaux usées en refoulement	**2 660**
	Eaux pluviales hors refoulement	**7 960**
Total CHERISY		**22 329**
CRECY-COUVE	Eaux usées hors refoulement	**3 994**
	Eaux usées en refoulement	**528**
	Eaux pluviales hors refoulement	**894**
Total CRECY COUVE		**5 416**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

COMMUNE D'IMPLANTATION	TYPE RESEAU	Linéaire (m)
DREUX	Eaux usées hors refoulement	92 509
	Eaux usées en refoulement	6 608
	Eaux pluviales hors refoulement	90 668
	Eaux pluviales en refoulement	701
	Unitaire hors refoulement	30 473
Total DREUX		220 959
EZY-SUR-EURE	Eaux usées hors refoulement	16 471
	Eaux usées en refoulement	918
	Eaux pluviales hors refoulement	7 588
Total EZY-SUR-EURE		24 977
GARANCIERES-EN-DROUAIS	Eaux pluviales hors refoulement	521
Total GARANCIERES-EN-DROUAIS		521
GARNAY	Eaux usées hors refoulement	6 875
	Eaux usées en refoulement	7 433
	Eaux pluviales hors refoulement	4 028
Total GARNAY		18 335
IVRY-LA-BATAILLE	Eaux usées hors refoulement	10 793
	Eaux usées en refoulement	1 585
	Eaux pluviales hors refoulement	4 379
	Eaux épurées	303
Total IVRY-LA-BATAILLE		17 059
LE BOULLAY-MIVOYE	Eaux usées hors refoulement	4 095
	Eaux usées en refoulement	5 743
	Eaux pluviales hors refoulement	3 315
Total LE BOULLAY-MIVOYE		13 153
LE BOULLAY-THIERRY	Eaux usées hors refoulement	851
	Eaux usées en refoulement	3 808
	Eaux pluviales hors refoulement	1 722
	Unitaire hors refoulement	4 125
Total LE BOULLAY-THIERRY		10 506
LOUVILLIERS-EN-DROUAIS	Eaux pluviales hors refoulement	265
Total LOUVILLIERS-EN-DROUAIS		265
LURAY	Eaux usées hors refoulement	5 883
	Eaux usées en refoulement	240
	Eaux pluviales hors refoulement	4 797
Total LURAY		10 920

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

COMMUNE D'IMPLANTATION	TYPE RESEAU	Linéaire (m)
MARVILLE-MOUTIERS-BRULE	Eaux usées hors refoulement	8 535
	Eaux usées en refoulement	10 449
	Eaux pluviales hors refoulement	2 302
Total MARVILLE-MOUTIERS-BRULE		21 286
MEZIERES-EN-DROUAIS	Eaux usées hors refoulement	7 390
	Eaux usées en refoulement	925
	Eaux pluviales hors refoulement	4 436
Total MEZIERES-EN-DROUAIS		12 751
SAINTE-GEMME-MORONVAL	Eaux usées hors refoulement	10 543
	Eaux usées en refoulement	1 987
	Eaux pluviales hors refoulement	4 107
	Unitaire hors refoulement	1
Total SAINTE-GEMME-MORONVAL		16 638
SAINT-SAUVEUR-MARVILLE	Eaux usées hors refoulement	2 077
	Eaux usées en refoulement	3 926
Total SAINT-SAUVEUR-MARVILLE		3 003
SAULNIERES	Eaux usées hors refoulement	6 055
	Eaux usées en refoulement	3 503
	Eaux pluviales hors refoulement	140
Total SAULNIERES		9 697
SERAZEREUX	Eaux usées hors refoulement	3 031
	Eaux usées en refoulement	4 207
	Eaux pluviales hors refoulement	5 223
Total SERAZEREUX		12 461
TREON	Eaux usées hors refoulement	9 932
	Eaux usées en refoulement	1 673
	Eaux pluviales hors refoulement	2 934
Total TREON		14 538
VERNOUILLET	Eaux usées hors refoulement	66 192
	Eaux usées en refoulement	514
	Eaux pluviales hors refoulement	57 843
	Eaux pluviales en refoulement	412
	Unitaire hors refoulement	409
Total VERNOUILLET		125 370
VERT-EN-DROUAIS	Eaux usées hors refoulement	9 321
	Eaux usées en refoulement	2 775
	Eaux pluviales hors refoulement	2 586
Total VERT-EN-DROUAIS		14 682

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

COMMUNE D'IMPLANTATION	TYPE RESEAU	Linéaire (m)
VILLEMEUX-SUR-EURE	Eaux usées hors refoulement	**13 565**
	Eaux usées en refoulement	**4 177**
	Eaux pluviales hors refoulement	**4 340**
	Eaux épurées	**162**
Total VILLEMEUX-SUR-EURE		**22 244**
Total général		**673 328**

➢ Les autres équipements du réseau

Nombre des principaux équipements du réseau est retracée dans le tableau ci-dessous :

	2024
Regards de visite	18 287
Avaloirs	7 286
Branchements publics	19 436
Ouvrages de prétraitement réseau	45
Vannes	7

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les postes de relèvement

Les postes de relèvement des eaux usées

Inventaire des installations de relevage

Commune	Nombre de PR
ABONDANT	5
AUNAY-SOUS-CRÉCY	5
CHARPONT	4
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS	5
CHERISY	3
CRÉCY-COUVÉ	2
DREUX	24
ECLUZELLES	1
EZY-SUR EURE	2
GARNAY	6
IVRY-LA-BATAILLE	9
LE BOULLAY-MIVOYE	4
LE BOULLAY-THIERRY	2
LURAY	3
MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ	13
MÉZIÈRES-EN-DROUAIS	3
SAINT-SAUVEUR-MARVILLE	2
SAINTE-GEMME-MORONVAL	7
SAULNIÈRES	8
SERAZEREUX	2
THIMERT-GÂTELLES	1
TRÉON	10
VERNOUILLET	7
VERT-EN-DROUAIS	8
VILLEMEUX-SUR-EURE	11
Total général	**147**

En sus des PR sur le domaine public, la SAAPD a en charge la maintenance des PR du réseau ramifié sous pression d'Ecluzelles. Il y en a 44 en tout.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les siphons

Les siphons des eaux usées du système de Dreux

Inventaire des installations des siphons

Commune	Nombre de Siphons
DREUX	6
GARNAY	2
SAINTE-GEMME-MORONVAL	1
VERNOUILLET	2
Total général	**11**

Les déshuileurs

Les déshuileurs des eaux usées du système de Dreux

Inventaire des installations des déshuileurs

Commune	Nombre de deshuileurs
DREUX	17
LURAY	1
SAINTE-GEMME-MORONVAL	2
VERNOUILLET	9
VERT-EN-DROUAIS	1
Total général	**30**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les bassins d'orage

Les bassins d'orage des eaux usées du système de Dreux

Inventaire des installations des bassins d'orage

Commune	Nombre de bassins d'orage
ABONDANT	4
BOISSY-EN-DROUAIS	1
CHERISY	2
DREUX	24
GARANCIERES-EN-DROUAIS	1
GARNAY	1
LE BOULLAY-MIVOYE	1
LURAY	1
MARVILLE-MOUTIERS-BRULE	3
SAINT-GEMME-MORONVAL	1
VERNOUILLET	16
VERT-EN-DROUAIS	4
Total général	**58**

Les points de rejet au milieu naturel

Les point de rejets et DO au milieu naturel du système de Dreux

Inventaire des rejets au milieu naturel

COMMUNE	SITE	CHARGE (KG BDO5/J)
DREUX	DO BOIS-SABOT	Supérieur à 600 kg DBO5/Jour
DREUX	DO BOSTON	Supérieur ou égal à 120 kg DBO5/Jour et inférieur à 600
DREUX	DO DUBOIS	Supérieur ou égal à 120 kg DBO5/Jour et inférieur à 600
DREUX	DO BEAUREPAIRE	Supérieur ou égal à 120 kg DBO5/Jour et inférieur à 600

Inventaire des déversoirs d'orage

Commune	Nombre des déversoirs d'orage
CHATEAUNEUF -EN-THYMERAIS	1
DREUX	16
VERNOUILLET	2
Total général	**19**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les ouvrages de traitement

STEP de DREUX

C'est une station d'épuration de type boues activées avec traitement des boues par déshydratation. Le milieu récepteur de son rejet est la Blaise.

- ✓ Elle a une capacité théorique réglementaire de 86 666 équivalents-habitants (EH), soit 5 200 kg de DBO_5 par jour.



Figure 6 - Vue aérienne de la station d'épuration de Dreux

La station a été mise en service en 1997.

File Eau :

Types de traitement :

- *Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg(O_2)/l*
- *Nitrification plus poussée NK ≤ 6 mg(N)/l*
- *Dénitrification plus poussée NGL ≤ 10 mg(N)/l*
- *Déphosphatation plus poussée Pt ≤ 0,8 mg(P)/l*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Filières de traitement :

- *Boues activées faible charge*
- *Finition : Traitement physico-chimique (Densadeg)*

Ouvrages et équipements :

- *1 Dégrilleur automatique sur l'arrivée principale avec vis compacteuse*
- *Site de dépotage pour matières de vidange équipé d'un débitmètre électromagnétique. Fosse de récupération équipée d'un échantillonneur réfrigéré*
- *Site de dépotage pour Lixiviat équipé d'un débitmètre électromagnétique. Fosse de récupération équipée d'un échantillonneur réfrigéré*
- *Un poste de relevage équipé de 5 pompes de relevage (4 + 1 secours) et un trop plein (vers le by-pass). Le PR est équipé d'un dégrilleur grossier avec compacteur*
- *Un by-pass équipé d'un canal venturi avec sonde US de mesure de débit*
- *1 poste toutes eaux équipé de 3 pompes, en fonctionnement par alternance*
- *1 traitement biologique des graisses (Biomaster)*
- *2 files de traitement :*
  - *Prétraitement*
  - *Traitement biologique*
- *3 surpresseurs d'air (2 + 1 secours) fonctionnant en alternance sur horloge*
- *1 Traitement tertiaire (Densadeg)*
- *Un pluviomètre à auget*
- *Une désodorisation physico-chimique*

Prétraitement :

- *2 dégrilleurs fins avec presse lavante*
- *2 Dessableurs/deshuileurs*
  - *2 pompes à sable (1 par dessableur) envoient les sables vers le laveur. Les sables sont stockés en benne*
  - *Les graisses, récupérées en surverse par les ponts racleurs, sont traitées dans le Biomaster*
- *1 préleveur automatique fixe, réfrigéré*
- *1 canal venturi équipé d'une sonde US pour la mesure de débit d'entrée*
- *1 vanne automatique permettant le by-pass de la station*

Traitement Biologique :

- *1 ouvrage de répartition (Répartiteur) qui permet l'alimentation des bassins d'aération et la recirculation*
- *2 bassins d'aération avec zone anoxie. Chaque bassin est équipé :*
  - *4 pale-banane (zone aérobie)*
  - *2 agitateurs (zone anaérobie/anoxie)*
  - *Sonde de mesure (pH, O_2, rédox, ..)*
  - *Diffuseurs d'air fine bulle (Flexazur)*
- *2 clarificateurs circulaires à succion des boues. Chaque clarificateur est équipé :*
  - *D'un pont suceur équipé de 14 tubes de soutirage tournant avec le pont*
  - *D'un siphon permettant l'aspiration des boues vers la bâche de recirculation*
  - *Une bâche de recirculation des boues équipée d'une pompe à débit fixe et d'une pompe à débit variable*
  -

Traitement Tertiaire :

- *2 canaux venturi équipés de sonde US permettant la mesure de débit avant rejet en rivière*
- *1 Décanteur-épaississeur à recirculation des boues (Densadeg) composé :*
  - *D'un mélangeur*
  - *D'un décanteur lamellaire*
- *1 injection de Chlorure Ferrique équipée de 2 pompes doseuses fonctionnant en alternance*

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- *1 préparation polymère avec polymère en poudre*

File Boue :

Types de traitement :

- *Déshydratation des boues*
- *Stabilisation des boues (Chaux)*

Filières de traitement :

- *Epaississement par flottation*
- *Déshydratation mécanique*
- *Stockage sur site avant épandage selon plan d'épandage*

Ouvrages et équipements :

- *1 flottateur raclé*
- *1 débitmètre électromagnétique en amont de la centrifugeuse (S4)*
- *1 centrifugeuse pour la déshydratation mécanique*
- *Hygiénisation des boues par injection de chaux*

La limite des possibilités de l'installation fixées dans l'Arrêté préfectoral de la station d'épuration est rappelée ci-dessous :

Charge hydraulique

Volume moyen journalier
21 800 m3/j

Charge polluante

Paramètre	Moyenne
DBO5	5200 kg/j
DCO	13500 kg/j
MES	6100 kg/j
NTK	1150 kg/j
Pt	366 kg/j

En cas de dépassement des limites de traitement de la station d'épurations suivantes, la SAAPD doit assurer au mieux le traitement des effluents entrants.

La station fait l'objet d'une autosurveillance dont les points de mesure sont figurés sur le schéma ci-après :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

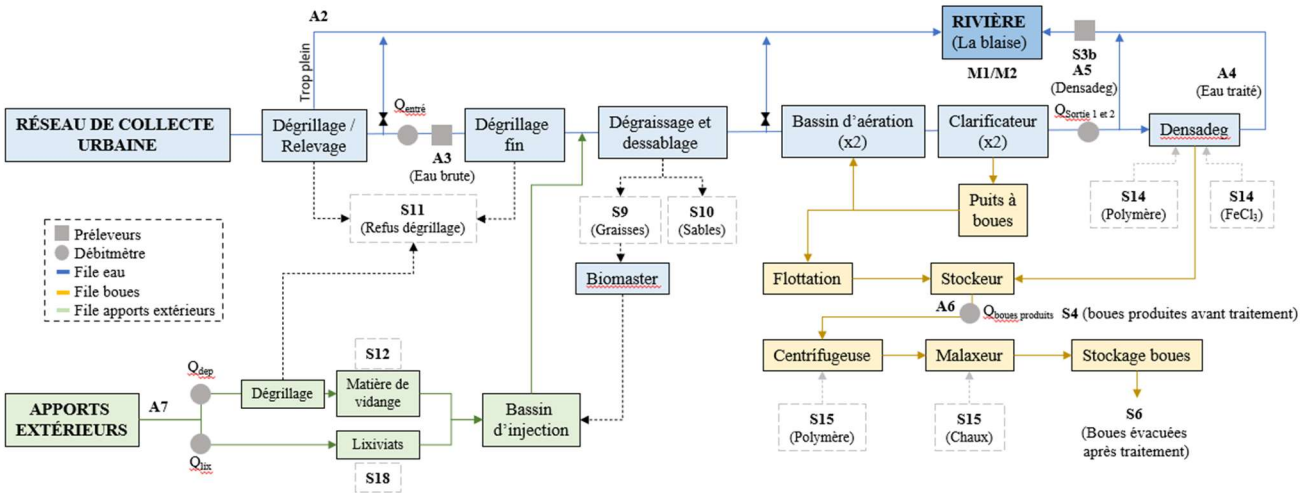


Figure 7 - Schéma des points SANDRE sur la station de Dreux

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

STEP d'EZY-SUR-EURE

C'est une station d'épuration de type boues activées avec traitement des boues par déshydratation. Le milieu récepteur de son rejet est l'Eure.

- ✓ Elle a une capacité théorique réglementaire de 4000 équivalents-habitants (EH), soit 240 kg de DBO_5 par jour.



Figure 8 - Vue aérienne de la station d'épuration de Ezy-sur-Eure

La station a été mise en service en 2015.

File Eau :

Types de traitement :
- Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg(O2)/l
Filières de traitement :
- Boues activées faible charge

Ouvrages et équipements :
- Relevage : 2 pompes de relevage
- 1 Dégrilleur grossier automatique

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- *1 Dessableur deshuileur*
- *1 Bassin d'orage*
- *1 bassins d'aération*
- *1 décanteurs*

File Boue :

Types de traitement :

- *Epaississement des boues*

Filières de traitement :

- *Epaississement*

Ouvrages et équipements :

- *1 Table d'égouttage*
- *2 Silo à boues*

La limite des possibilités de l'installation fixées dans l'Arrêté préfectoral de la station d'épuration est rappelée ci-dessous :

Charge hydraulique

Volume moyen journalier
600 m3/j

Charge polluante

Paramètre	Moyenne
DBO5	240 kg/j
DCO	540 kg/j
MES	360 kg/j
NTK	60 kg/j
Pt	16 kg/j

En cas de dépassement des limites de traitement de la station d'épurations suivantes, la SAAPD doit assurer au mieux le traitement des effluents entrants.

La station fait l'objet d'une autosurveillance dont les points de mesure sont figurés sur le schéma ci-après :

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

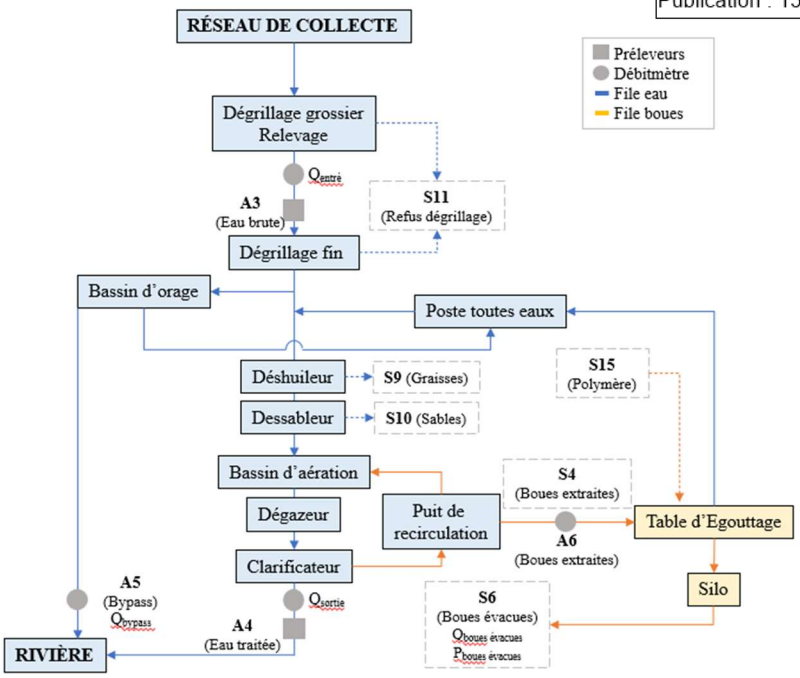


Figure 9 - Schéma des points SANDRE sur la station de Ezy-sur-Eure

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

STEP d'IVRY-LA-BATAILLE

C'est une station d'épuration de type boues activées avec traitement des boues par déshydratation.
Le milieu récepteur de son rejet est l'Eure.

- ✓ Elle a une capacité théorique réglementaire de 2500 équivalents-habitants (EH), soit 150 kg de DBO_5 par jour.



Figure 10 - Vue aérienne de la station d'épuration de Ivry-la-Bataille

La station a été mise en service en 1990.

File Eau :

Types de traitement :
- *Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg(O2)/l*

Filières de traitement :
- *Boues activées faible charge*

Ouvrages et équipements :
- *Relevage : 2 pompes de relevage*
- *1 Dégrilleur*
- *1 Dessableur déshuileur*
- *1 bassin d'aération*
- *1 clarificateur*

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

File Boue :

Types de traitement :
- *Déshydratation des boues par table d'égouttage*

Filières de traitement :
- *Déshydratation mécanique*

Ouvrages et équipements :
- *Silo de stockage équipé d'une colonne filtrante*
- *Déshydratation par table d'égouttage*

La limite des possibilités de l'installation fixées dans l'Arrêté préfectoral de la station d'épuration est rappelée ci-dessous :

Charge hydraulique

Volume moyen journalier
375 m3/j

Charge polluante

Paramètre	Moyenne
DBO5	150 kg/j
DCO	350 kg/j
MES	225 kg/j
NTK	37,5 kg/j
Pt	10 kg/j

En cas de dépassement des limites de traitement de la station d'épurations suivantes, la SAAPD doit assurer au mieux le traitement des effluents entrants.

La station fait l'objet d'une autosurveillance dont les points de mesure sont figurés sur le schéma ci-après :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

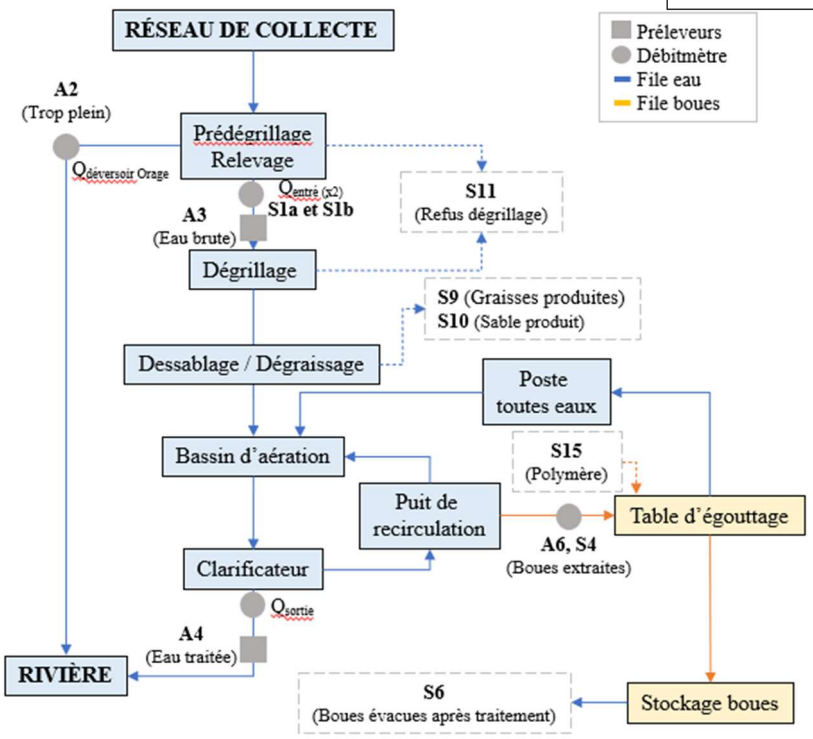


Figure 11 - Schéma des points SANDRE sur la station de Ivry-la-Bataille

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

STEP de CHERVILLE

C'est une station d'épuration de type lit plantes de roseaux.
Le milieu récepteur de son rejet est le fossé 01 de la Vallée des Caves.

- ✓ Elle a une capacité théorique réglementaire de 152 équivalents-habitants (EH), soit 9,12 kg de DBO_5 par jour.

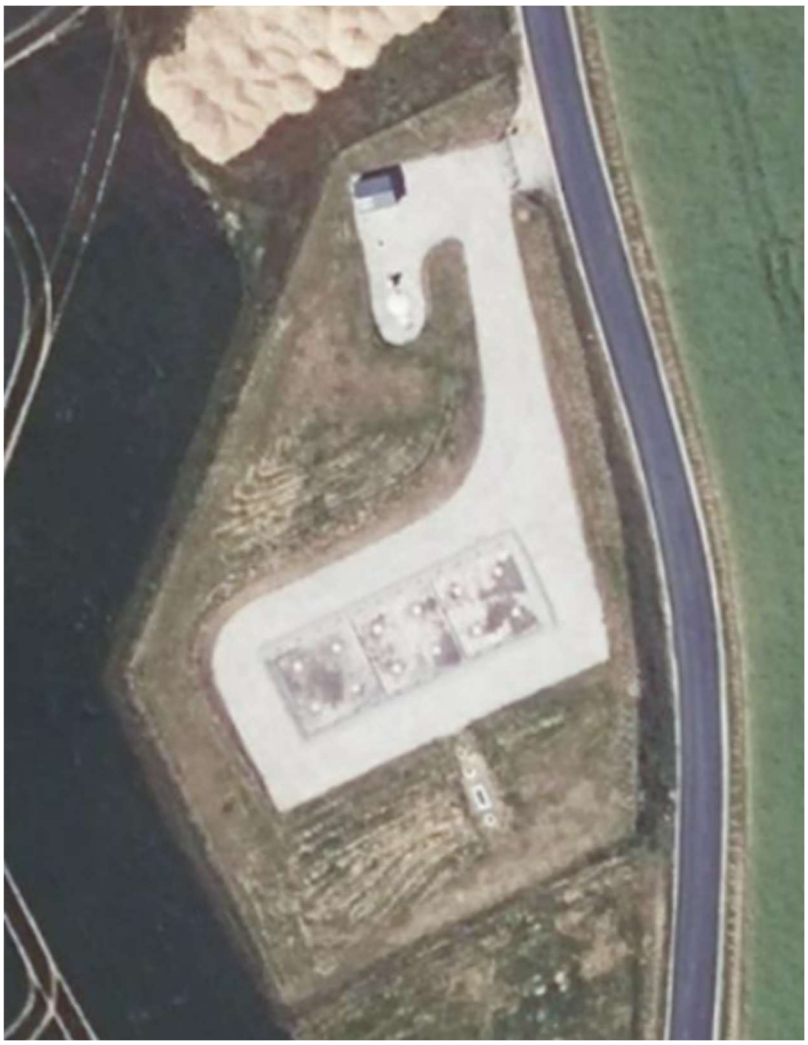


Figure 12 - Vue aérienne de la station d'épuration de Cherville

La station a été mise en service en 2023.

File Eau :

-Traitement :
L'eau usée est collectée gravitairement a l'entrée de la STEP et en suite traité par un dégrilleur automatique solaire. L'eau usée sortant du prétraitement est repartie par cycles (1 semaine par cycle + 2 semaines de repos) sur 3 lits a filtres plantées de roseaux (80 m3chaque lit).
Débit de sortie des lits mesuré a la sortie de la STEP par un canal de mesure.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

File boues (*si indépendante de la file eau) :*

Tous les 10 ans, ou dans le moment du remplissage si avant, les boues des lites sont évacués vers une filière de compostage.

La station fait l'objet d'une autosurveillance dont les points de mesure sont figurés sur le schéma ci-après :

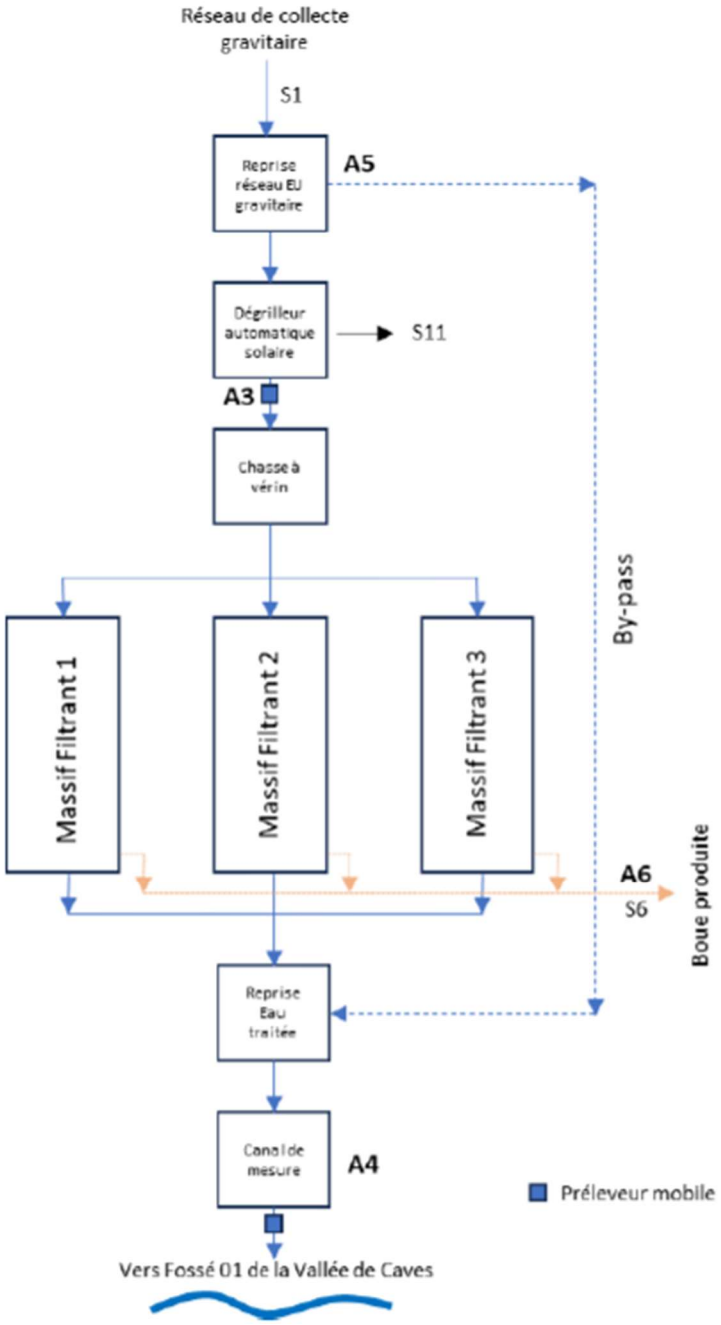


Figure 13 - Schéma des points SANDRE sur la station de Cherville

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

STEP de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS

C'est une station d'épuration de type boues activées avec traitement des boues par déshydratation.
Le milieu récepteur de son rejet est la Bigeonette.

- ✓ Elle a une capacité théorique réglementaire de 4683 équivalents-habitants (EH), soit 282 kg de DBO_5 par jour.

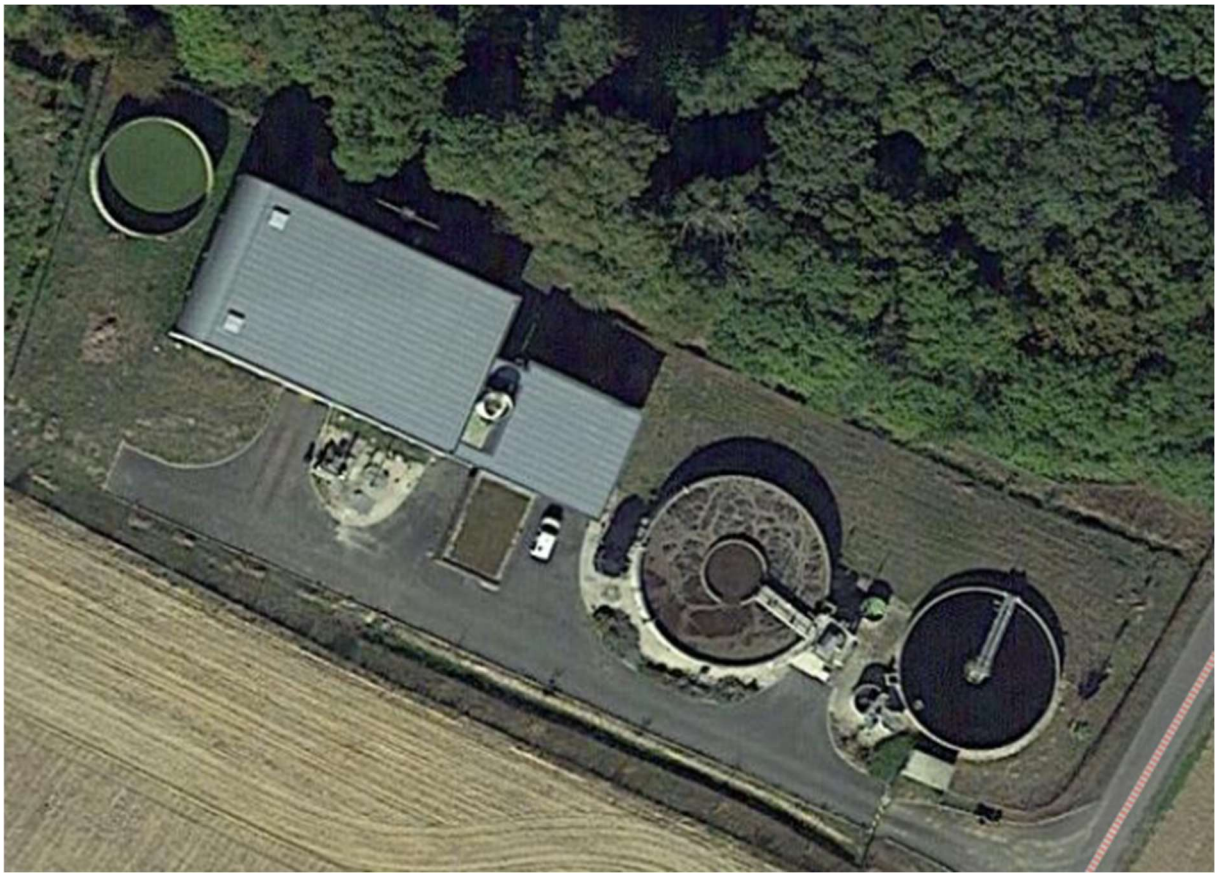


Figure 14 - Vue aérienne de la station d'épuration de Châteauneuf-en-Thymerais

La station a été mise en service en 2010.

File Eau :

Types de traitement :
- *Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg(O2)/l*

Filières de traitement :
- *Boues activées faible charge*
- *Finition : Traitement physico-chimique par FeCl3*

Ouvrages et équipements :
- *2 pompes de relevage + 1 en secours*
- *1 Dégrilleur fin automatique + dégrilleur statique de secours*
- *1 Tamis Rotatif*
- *1 Répartiteur*
- *1 bassin d'anaérobie*

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- *1 bassin d'aération fines bulles*
- *1 Dégazeur*
- *1 clarificateur*
- *1 Canal de sortie avec comptage*

File Boue :

Types de traitement :
- *Déshydratation des boues, stabilisation par chaulage puis épandage*

Filières de traitement :
- *Déshydratation mécanique*

Ouvrages et équipements :
- *Déshydratation par 1 centrifugeuse*
- *Addition de chaux en poudre stockée dans un silo*
- *Stockage en silo*

La limite des possibilités de l'installation fixées dans l'Arrêté préfectoral de la station d'épuration est rappelée ci-dessous :

Charge hydraulique

Volume moyen journalier
665 m3/j

En cas de dépassement des limites de traitement de la station d'épurations suivantes, la SAAPD doit assurer au mieux le traitement des effluents entrants.

La station fait l'objet d'une autosurveillance dont les points de mesure sont figurés sur le schéma ci-après :

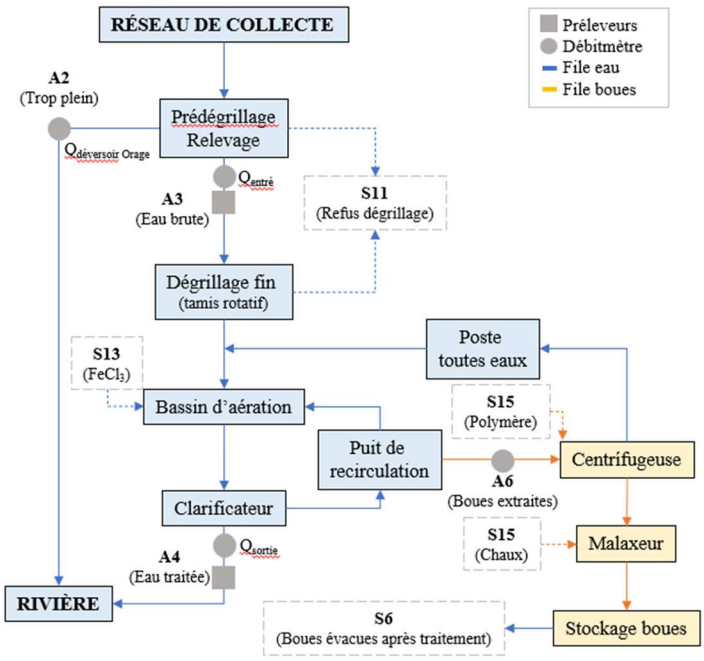


Figure 15 - Schéma des points SANDRE sur la station de Châteauneuf-en-Thymerais

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.6. L'exploitation du service

Les indicateurs du service

Dans le tableau ci-dessous est récapitulée l'évolution annuelle des principaux indicateurs relatifs au service :

	2024
Nombre d'habitants	73 969
Nombre de clients assujettis à la redevance assainissement	19 972
Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers (nb/1000 abonnés)	~ 0
Taux de désobstruction du réseau (nb/km)	0,08

Les interventions réalisées sur les postes de relèvement

➢ La surveillance des installations

Tous les postes sont surveillés de la façon suivante :

- Un contrôle systématique de tous les postes est réalisé sur place par un technicien qui permet notamment de constater d'éventuelles défaillances ou dégradations échappant à la télésurveillance et de relever des index ;
- Un contrôle périodique de certains équipements est exigé par la réglementation (armoires électriques, équipements de levage, réservoirs sous pression, extincteurs, …) ou par nos procédures internes (actionneurs, capteurs) ;
- Une télésurveillance permet de connaître à distance l'état instantané et l'évolution des principaux actionneurs ainsi que la valeur des paramètres mesurés sur chacun des sites ;
- Des téléalarmes préviennent instantanément un technicien d'astreinte en cas de défaut majeur détecté sur un site.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ La conduite des installations

Tous les postes fonctionnent de façon automatique selon le principe général suivant : une (ou plusieurs) pompe(s) est (sont) démarrée(s) lorsque la bâche d'aspiration est pleine (poire de niveau haute) ; la (ou les) pompe(s) s'arrête(nt) lorsque la bâche est vide (poire de niveau basse).

Aussi les interventions pour conduite manuelles des installations sont rares. Elles se produisent par exemple en cas de remise en service d'un équipement ou d'un poste. Tous les postes permettent de choisir entre un fonctionnement automatique ou manuel.

➢ L'entretien préventif des installations

A l'occasion des tournées périodiques évoquées plus haut, des opérations préventives d'entretien sont réalisées systématiquement sur certains équipements à une fréquence adaptée (graissage de pompes, resserrage des connections électriques, …).

Le tableau ci-dessous reprend, pour l'année 2024, les passages mensuels réalisés :

SITES	Postes de relevage
Périodicités	Mensuelle
Janvier	OUI
Février	OUI
Mars	OUI
Avril	OUI
Mai	OUI
Juin	OUI
Juillet	OUI
Aout	OUI
Septembre	OUI
Octobre	OUI
Novembre	OUI
Décembre	OUI

Au cours des tournées hebdomadaires, certains postes sont contrôlés de manière que chacun d'entre eux soit vérifié une fois par mois.

➢ L'entretien curatif des installations

Lorsqu'une des opérations de surveillance citées plus haut détecte la défaillance d'un équipement celui-ci est réparé dans les meilleurs délais. Si la réparation n'est pas possible techniquement ou économiquement, l'équipement est remplacé.

Les opérations d'entretien curatives comprennent toutes les interventions non programmées.
Ces opérations déclenchées par des alarmes (via une gestion technique centralisée) et l'analyse des fiches d'exploitations issues des tournées préventives sont réalisées dans un délai imposé par le maintien opérationnel des postes de relèvement. Elles se déclinent en deux types :

Les interventions d'urgence, nécessitant un déplacement immédiat des agents d'astreintes pour manœuvrer la station en position de repli (l'installation assure toujours son service mais une partie de ses installations ne sont plus opérationnelles) ou une opération de réparation immédiate (l'installation n'assure plus son service un dépannage immédiat est réalisé)

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les interventions curatives programmées, issues d'une mise en repli de l'installation ou de la détection par la maintenance préventive et la gestion technique centralisée d'un défaut de fonctionnement.

➢ Le renouvellement des installations

Le renouvellement des installations s'effectue généralement équipement par équipement :

- De façon curative lorsqu'un équipement tombe en panne et que sa réparation n'est pas possible ou opportune ;
- De façon préventive lorsqu'un équipement devient obsolète (pannes fréquentes, fonctionnement dégradé, pièces de rechanges indisponibles, évolution de la réglementation environnementale ou sanitaire, risque pour la sécurité du personnel, logiciel dépassé ;
- De façon programmée lorsque le contrat de délégation du service comporte un programme de renouvellement détaillé.

On notera que le renouvellement est du ressort de la collectivité pour certains équipements, selon une répartition détaillée dans le contrat de délégation du service.

Les opérations de renouvellement sont détaillées au chapitre Chap.7.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les interventions réalisées sur le réseau de collecte

➢ Les différents types d'interventions sur le réseau

Pour prévenir tout risque d'engorgement de réseau et garantir le libre écoulement des eaux durant toute l'année, la SAAPD procède à différentes interventions préventives sur l'ensemble des réseaux d'assainissement :

- Mise en place du programme de curage préventif du réseau des eaux usées par secteur de la ville
- Visites des points noirs
- Pompage et nettoyage des stations de refoulement

➢ Le curage du réseau

En 2024, 56 446 mètres de réseau ont été curés selon le détail ci-dessous :

Commune	Linéaire réalisé en ml
ABONDANT	790.84
AUNAY-SOUS-CRECY	330
CHARPONT	625.42
CHERISY	850.27
CRECY-COUVE	263.66
DREUX	20938.53
EZY-SUR-EURE	1769.59
GARNAY	756.53
IVRY-LA-BATAILLE	3508
LE BOULAY-MIVOYE	392.49
LE BOULAY-THIERRY	438
LURAY	1128.10
MARVILLE-MOUTIER-BRULE	1057.39
MEZIERES-EN-DROUAIS	492
SAINTE-GEMME-MORONVAL	2291.57
SAULNIERES	553
SERZEREUX	432
TREON	731.54
VERNOUILLET	17158.98
VERT-EN-DROUAIS	678
VILLEMEUX-SUR-EURE	998.75
Total général	**56184.59**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ La désobstruction des canalisations et des branchements

Lors de l'année 2024, le concessionnaire a réalisé, en urgence, 54 dégorgements (canalisations principales et branchements confondus). Le détail est le suivant :

Commune	Nombre dégorgements réalisés	Dont nombres effectués en astreinte
Abondant	2	0
Châteauneuf-en-Thymerais	1	1
Chérisy	1	0
Dreux	29	1
Ezy-sur-Eure	2	0
Ivry-la-Bataille	3	0
Le Boulay-Mivoye	1	1
Le Boulay-Thierry	1	0
Marville-Moutier-Brulé	1	0
Sainte-Gemme-Moronval	3	0
Sérazereux	1	0
Vernouillet	9	2
Total général	**54**	**5**

➢ Les points noirs du réseau de collecte

Les linéaires de « points noirs » du réseau de collecte, c'est à dire les points du réseau nécessitant au moins quatre interventions par an, sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Commune	Linéaire réalisé en ml
DREUX	14244
EZY-SUR-EURE	772
IVRY-LA-BATAILLE	2776
SAINTE-GEMME-MORONVAL	1676
VERNOUILLET	13332
Total général	**32800**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ Le contrôle de conformité du raccordement des eaux usées

Le nombre de contrôles de conformité réalisés pour mutation et construction neuve pendant l'année 2024 est le suivant :

	Bilan 2024	
	Mutation	**Neufs**
Nombre de contrôle réalisés	697	54
Nombre de contrôles improductifs	42	0
Nombre de contrôles conformes	500	41
Nombre de contrôles non conformes	162	13

Un contrôle improductif est un contrôle qui n'a pas été réalisé du fait d'un rendez-vous non honoré.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les autres données relatives au service

Le réseau d'assainissement est sujet à des infiltrations importantes d'eaux claires parasites permanentes. Une étude est en cours sur Ezy-sur-Eure et sur Dreux.
Ces dernières étant tributaires de la pluviométrie, les volumes pompés par les postes, et donc leurs consommations électriques, peuvent varier sensiblement dans le temps.
Le détail des données par poste est donné en annexe.

Tous les postes ne sont pas télégérés. La liste ci-dessous les référence :

Type	Nom	Commune
PR EU	PR353 TOISON d'OR	ABONDANT
PR EP	PR13 PAUL BERT	DREUX
PR EU	PR26 LIVRAINDIERE	DREUX
PR EP	PR27 LIVRAINDIERE	DREUX
PR EP	PR Clos des Vergers	DREUX
PR EU	PR CHATEAU 2	ÉZY-SUR-EURE
PR EU	PR42 LOT ILE D'AMOURETTE	SAINTE-GEMME-MORONVAL
PR EU	PR190 BOUCONVILLE	SERAZEREUX
PR EU	PR37 Rue des charmes	VERNOUILLET
PR EU	PR94 PR 15 MAUZAISE	VILLEMEUX-SUR-EURE


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ Les données de fonctionnement des stations de traitement d'eaux usées

○ Bilan sur les volumes et paramètres mesurés


Les graphiques ci-dessous présentent le volume journalier entrant dans la station (point A3, après le déversoir en tête de station), le débit de référence

- STEP Dreux

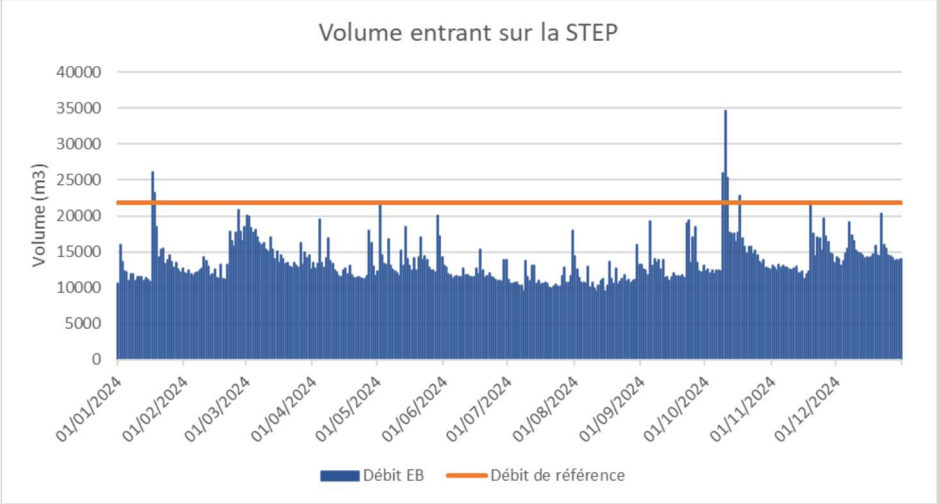

Le débit de référence a été dépassé 8 fois au cours de l'année.

- STEP Ezy-sur-Eure

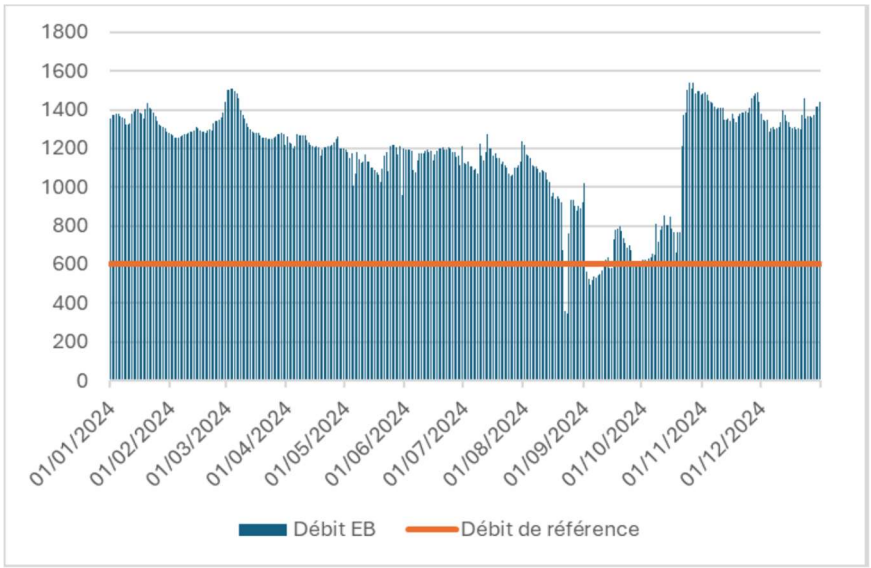


Le débit entrant moyen sur la station est de 1167 m3/jour, soit presque le double de son débit de référence.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Ivry-la-Bataille

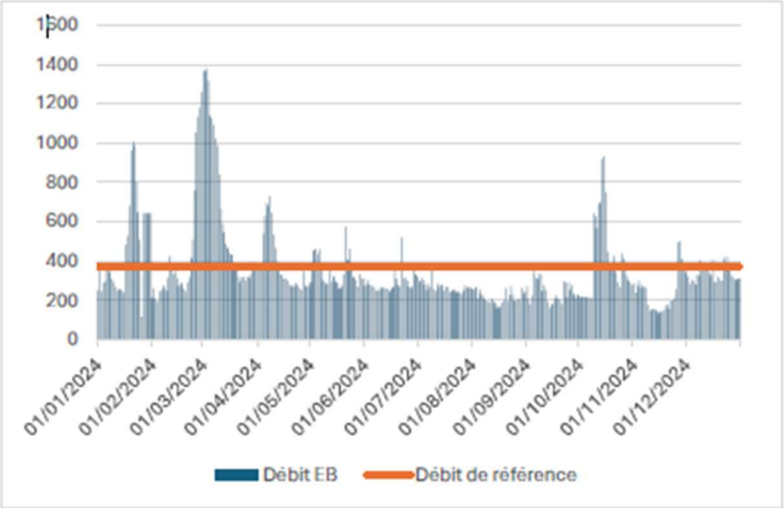

Sur Ivry-la-Bataille, la station accuse des pics de débit sur la période correspondant à des pluviométries fortes. Le débit moyen entrant sur la station est de 358 m3/jour. Ce qui correspond a son débit de référence. Le débit minimum enregistré est de 116 m3/jour et le débit maximum de 1382 m3/jour.

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

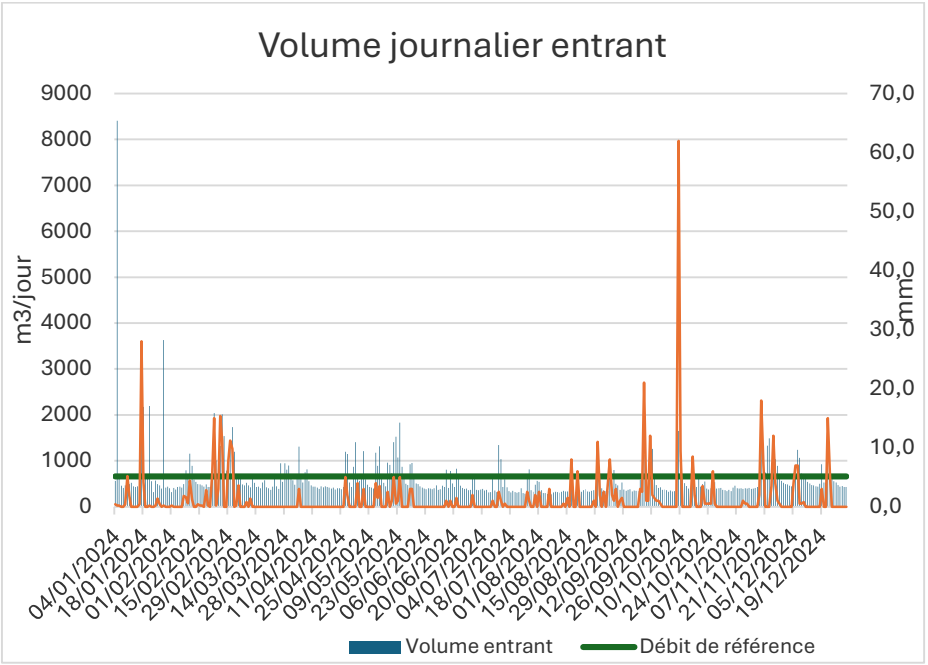


Un tier des réseaux de collectes étant unitaires, le débit de référence est dépassé durant les épisodes pluvieux.


Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les graphiques ci-dessous présentent la pluviométrie 2024 :

- STEP Dreux

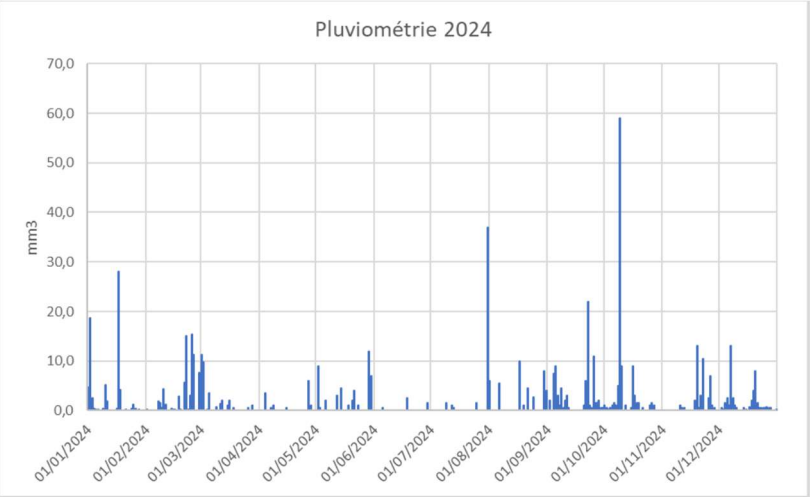


- STEP Ezy-sur-Eure

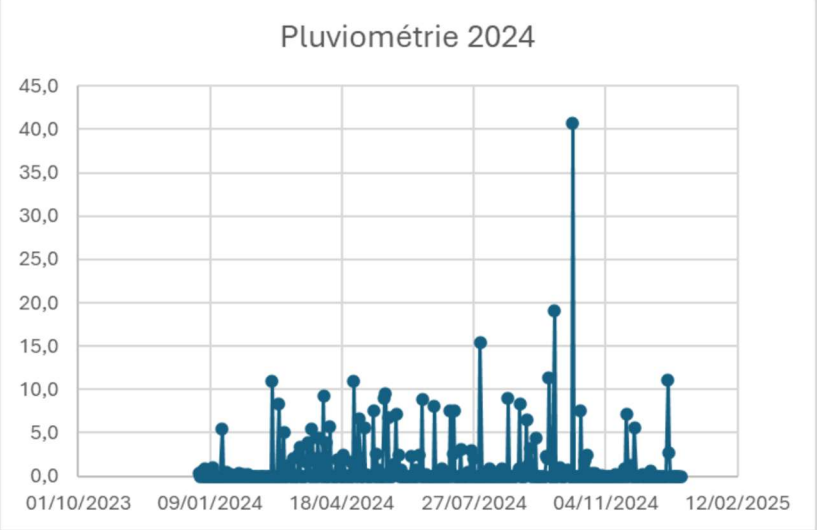


19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Ivry-le-Bataille

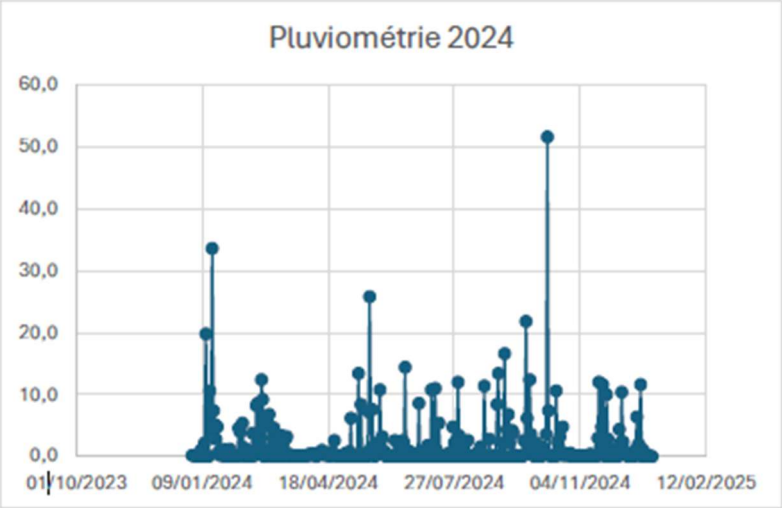

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

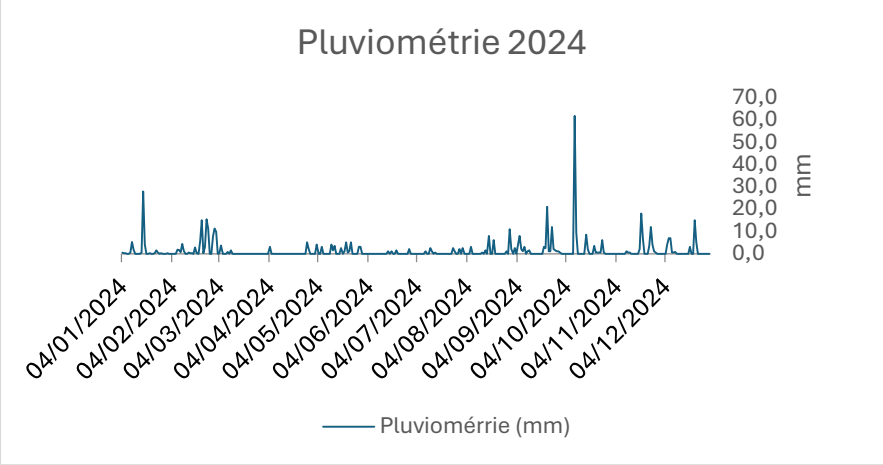

La pluviométrie de la période est très active. En cumulé, il y a eu 586.2 mm de pluie sur Dreux. Il y a eu 393.1 mm de pluie sur Ezy-sur-Eure avec un pic de 40.7 mm le 10 octobre. Il y a eu 721.4 mm de pluie sur Ivry-la-Bataille avec un pic de 51.6 mm le 09 octobre.

Les tableaux ci-après présentent les moyennes journalières (débit, pluviométrie, MES, DCO, DBO_5, NTK, NGL et PT mesurées en **entrée de station** :

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Dreux

Moyenne journalière du total mesuré en entrée de la station d'épuration Kg/j								
	débit	pluvio	MES	DCO	DBO5	NGL	NTK	PT
mois	m3/j	mm	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	13596	2,2	2695	6178	2272	830,6	809,1	85,4
févr-24	13781	2,5	2365	4764	1968	860,3	839,2	85,6
mars-24	15205	1,1	3545	6570	2472	942,9	925,4	114,2
avr-24	13077	0,4	2883	5251	2452	814,3	807,1	104,3
mai-24	14262	1,5	3320	5513	2025	868,9	852,2	87,6
juin-24	11970	0,2	5453	7520	3588	892,2	882,5	89,2
juil-24	11203	1,3	3399	6951	3028	761,9	755,1	115,2
août-24	11405	1,3	2264	4005	1797	805,0	795,8	1569,8
sept-24	13478	2,7	3182	4494	2191	858,9	845,4	100,4
oct-24	16028	3,2	3515	5737	2101	932,7	929,6	108,5
nov-24	14183	1,4	3344	4908	1655	809,4	809,4	74,8
déc-24	14987	1,4	3087	4112	1945	831,0	825,2	70,7
total estimé	163175,0	19,2	39052,0	66003,0	27494,0	10208,1	10076,0	2605,7

- STEP Ezy-sur-Eure

Moyenne journalière du total mesuré en entrée de la station d'épuration Kg/j								
	débit	pluvio	MES	DCO	DBO5	NGL	NTK	PT
mois	m3/j	mm	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	1361	0,1	274	463	61	47,6	47,6	6,0
févr-24	1301	0,4	335	322	150			
mars-24	1331	1,4	22	625	77	30,4	29,6	3,3
avr-24	1225	1,4	183	356	159			
mai-24	1134	2,0	44	127	57	31,4	30,1	2,1
juin-24	1175	0,8	152	293	123			
juil-24	1140	0,9	38	217	70	32,7	32,7	3,1
août-24	958	1,2	79	145	65			
sept-24	642	1,8	39	450	75	35,3	35,3	3,3
oct-24	987	1,8	102	160	75			
nov-24	1411	0,5	64	123	4	29,8	21,8	3,7
déc-24	1347	0,5	181	413	25			
total estimé	14012,0	12,8	1512,4	3693,8	941,0	207,2	197,1	21,5

- STEP Ivry-la-Bataille

Moyenne journalière du total mesuré en sortie de la station d'épuration Kg/j									
	Pluvio	débit	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	mm	m3/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	3,1	470	2	6	1	1,0	0,7	0,2	0,3
févr-24	2,3	432	1	7	1				
mars-24	1,2	646	10	11	2	3,8	1,8	1,1	0,9
avr-24	0,4	381	1	5	1				
mai-24	3,0	345	4	11	2	3,1	2,3	1,3	0,4
juin-24	1,2	283	1	7	1				
juil-24	1,8	269	2	12	1	1,7	1,6	1,0	0,9
août-24	1,5	217	5	16	2				
sept-24	3,1	245	3	14	1	3,7	1,6	0,7	1,2
oct-24	2,9	415	4	17	2				
nov-24	1,6	240	2	9	1	2,0	0,8	0,6	0,4
déc-24	1,2	338	4	16	1				
total estimé	23,3	4281,0	39,0	131,0	16,0	15,3	8,8	4,9	4,1

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

Moyenne journalière du total mesuré en entrée de la station d'épuration Kg/j								
	débit	pluvio	MES	DCO	DBO5	NGL	NTK	PT
mois	m3/j	mm	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	1013	2,1	211	466	114	42,8	42,8	5,3
févr-24	758	2,0	118	311	162			
mars-24	652	11,2	158	158	143	31,0	30,9	4,1
avr-24	556	0,3	161	207	83			
mai-24	842	1,2	449	747	271	70,1	70,1	10,0
juin-24	484	0,2	90	194	101			
juil-24	454	0,3	87	133	83	27,8	27,7	2,7
août-24	383	1,1	115	263	52			
sept-24	527	2,3	175	235	91	33,4	31,3	4,2
oct-24	528	3,0	84	305				
nov-24	645	1,7	475	691	302	87,8	87,7	11,9
déc-24	626	1,4	124	106				
total estimé	7468,0	26,8	2247,0	3816,0	1402,0	292,9	290,5	38,2

Les tableaux ci-après présentent les moyennes journalières (débit, pluviométrie, MES, DCO, DBO_5, NTK, NGL et PT mesurées en **sortie de station** :

- STEP Dreux

Moyenne journalière du total mesuré en sortie de la station d'épuration Kg/j									
	Pluvio	débit	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	mm	m3/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	2,2	13596	127	295	43	135,7	115,9	114,4	8,4
févr-24	2,5	13781	77	238	37	105,5	63,4	56,9	8,6
mars-24	1,1	15205	85	278	42	74,3	45,8	32,1	9,9
avr-24	0,4	13077	104	235	40	59,8	49,0	38,9	8,0
mai-24	1,5	14262	317	485	144	327,0	297,8	248,4	51,5
juin-24	0,2	11970	330	362	92	291,0	260,8	212,5	22,0
juil-24	1,3	11203	90	219	40	128,9	102,5	90,5	6,7
août-24	1,3	11405	43	214	39	95,3	76,2	59,4	33,2
sept-24	2,7	13478	65	290	62	130,7	78,6	73,1	10,7
oct-24	3,2	16028	185	252	44	110,9	59,5	46,1	8,3
nov-24	1,4	14183	189	278	48	216,1	149,7	128,0	21,1
déc-24	1,4	14987	208	265	50	165,2	59,7	37,9	25,5
total estimé	**19,2**	**163175,0**	**1818,9**	**3413,2**	**680,2**	**1840,2**	**1358,8**	**1138,0**	**213,9**

- STEP Ezy-sur-Eure

Moyenne journalière du total mesuré en sortie de la station d'épuration Kg/j									
	Pluvio	débit	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	mm	m3/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	0,1	1361	22	74	6	29,8	28,5	28,5	29,3
févr-24	0,4	1301	8	27	5				
mars-24	1,4	1331	20	20	8	10,8	5,8	4,0	3,8
avr-24	1,4	1225	14	14	5				
mai-24	2,0	1134	6	14	5	5,6	4,8	3,0	1,2
juin-24	0,8	1175	3	19	6				
juil-24	0,9	1140	6	21	4	14,5	14,5	13,8	1,3
août-24	1,2	958	7	14	4				
sept-24	1,8	642	6	24	5	12,9	12,9	11,1	1,4
oct-24	1,8	987	2	13	2				
nov-24	0,5	1411	9	35	5	23,2	19,2	16,4	0,8
déc-24	0,5	1347	6	21	5				
total estimé	**12,8**	**14012,0**	**108,0**	**296,0**	**60,0**	**96,8**	**85,7**	**78,8**	**37,8**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Ivry-la-Bataille

Moyenne journalière du total mesuré en sortie de la station d'épuration Kg/j									
	Pluvio	débit	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	mm	m3/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	3,1	470	2	6	1	1,0	0,7	0,2	0,3
févr-24	2,3	432	1	7	1				
mars-24	1,2	646	10	11	2	3,8	1,8	1,1	0,9
avr-24	0,4	381	1	5	1				
mai-24	3,0	345	4	11	2	3,1	2,3	1,3	0,4
juin-24	1,2	283	1	7	1				
juil-24	1,8	269	2	12	1	1,7	1,6	1,0	0,9
août-24	1,5	217	5	16	2				
sept-24	3,1	245	3	14	1	3,7	1,6	0,7	1,2
oct-24	2,9	415	4	17	2				
nov-24	1,6	240	2	9	1	2,0	0,8	0,6	0,4
déc-24	1,2	338	4	16	1				
total estimé	**28,3**	**4281,0**	**39,0**	**131,0**	**16,0**	**16,3**	**8,8**	**4,9**	**4,1**

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

Moyenne journalière du total mesuré en sortie de la station d'épuration Kg/j									
	Pluvio	débit	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	mm	m3/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j	Kg/j
janv-24	2,1	1013	2	9	2	1,4	0,4	0,3	0,6
févr-24	2,0	758	1	9	1				
mars-24	0,9	652	2	10	1	1,5	1,3	0,5	0,1
avr-24	0,3	556	1	9	2				
mai-24	1,2	842	67	128	58	38,5	28,1	19,3	2,6
juin-24	0,2	484	1	6	1				
juil-24	0,3	454	1	8	1	0,9	0,5	0,1	0,0
août-24	1,1	383	1	8	1				
sept-24	2,3	527	34	61	18	9,3	6,1	5,0	0,9
oct-24	3,0	528	3	10					
nov-24	1,7	645	43	99	17	23,5	22,5	18,0	2,5
déc-24	1,4	626	12	7					
total estimé	**16,5**	**7467,8**	**165,8**	**363,9**	**101,3**	**75,0**	**58,8**	**43,2**	**6,7**

Le rendement de la station est quant à lui présenté dans les tableaux ci-dessous :

- STEP Dreux

Rendement de la station (%)							
	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.
janv-24	95	95	98	84	86	85	90
févr-24	97	95	98	88	92	93	90
mars-24	98	96	98	92	95	96	91
avr-24	96	96	98	93	94	94	92
mai-24	90	91	93	63	65	60	41
juin-24	94	95	97	68	71	67	75
juil-24	97	97	99	83	87	83	94
août-24	98	95	98	88	91	85	98
sept-24	98	94	97	85	91	87	89
oct-24	95	96	98	88	94	93	92
nov-24	94	94	97	74	82	80	73
déc-24	93	94	97	80	93	94	64
MOYENNE	96	95	98	83	87	86	92
MAXIMUM	99	99	99	98	99	99	99
MINIMU	59	79	85	45	47	40	-25

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Ezy-sur-Eure

Mois	Rendement de la station (%)						
	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.
Janvier	92	84	91	37	40	23	-297
Février	98	92	97				
Mars	10	97	90	64	80	84	-14
Avril	92	96	97				
Mai	86	89	91	82	84	81	46
Juin	98	94	95				
Juillet	85	90	94	56	56	34	56
Août	91	90	94				
Septembre	84	95	93	63	63	55	57
Octobre	98	92	97				
Novembre	87	71	-27	22	12	11	79
Décembre	97	95	81				
MOYENNE (1)	93	92	94	54	56	48	-12
MAXIMUM	98	97	97	82	84	84	79
MINIMUM	10	71	-27	22	12	11	-297

- STEP Ivry-la-Bataille

Mois	Rendement de la station (%)						
	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.
Janvier	98	98	99	96	97	99	91
Février	99	96	99				
Mars	84	97	99	89	94	97	70
Avril	99	97	99				
Mai	95	95	97	85	88	92	82
Juin	99	95	99				
Juillet	96	93	99	91	92	93	55
Août	97	91	97				
Septembre	91	87	97	78	90	96	43
Octobre	87	84	89				
Novembre	95	93	97	90	96	97	69
Décembre	91	40	81				
MOYENNE (1)	96	94	98	89	94	96	71
MAXIMUM	99	98	99	96	97	99	91
MINIMUM	84	40	81	78	88	92	43

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

Rendement de la station (%)							
	MES	DCO	DBO5	NG	NK	N-NH4	PT
mois	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.	Rend.
janv-24	99	98	99	97	99	99	88
févr-24	99	97	99				
mars-24	99	94	99	95	96	98	98
avr-24	99	96	98				
mai-24	87	85	82	60	71	72	79
juin-24	99	97	99				
juil-24	99	94	99	97	98	99	99
août-24	99	97	98				
sept-24	83	78	83	76	83	84	82
oct-24	96	97					
nov-24	92	87	95	79	79	80	83
déc-24	91	93					
MOYENNE	93	91	93	78	83	84	85
MAXIMUM	99	98	99	97	99	99	99
MINIMU	83	78	82	60	71	72	79

Les volumes totaux annuels entrant et sortant sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

- STEP Dreux

	Débit en m3		
	Entrée A3	Sortie A4	By-Pass A5
2024	6 513 728	4 501 735	0

	Bilan 2024
Volume Matières de Vidange (m^3)	4898
Volume Lixiviats (m^3)	12077

- STEP Ezy-sur-Eure

	Débit en m3		
	Entrée A3	Sortie A4	By-Pass A2
2024	427 491	538 900	108

- STEP Ivry-la-Bataille

	Débit en m3		
	Entrée A3	Sortie A4	By-Pass A2
2024	130 300	169 563	0

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

	Débit en m3		
	Entrée A3	Sortie A4	By-Pass A2
2024	219 594	204 360	8 856

Le by-pass en A5 de la STEP de Dreux est non fonctionnel. Un rapport a été envoyé à la DDT28 ainsi qu'à l'AESN justifiant la non-fonctionnalité du A5. Une réflexion sera menée en 2025 pour la définition d'un nouvel A2 pour la STEP de Dreux.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

○ Bilan sur la pollution traitée et rejetée

Les tableaux ci-après présentent les bilans en pollution traitée et rejetée pour les paramètres DBO_5, DCO, NTK :

- STEP Dreux

	DCO	DBO5	NK
mois	Kg/an	Kg/an	Kg/an
janv-24	183091	73864	26309
févr-24	139788	61509	26225
mars-24	208649	75980	28445
avr-24	155209	69958	23025
mai-24	14585	52846	22236
juin-24	222587	103666	25499
juil-24	225117	95513	23818
août-24	127373	59573	26836
sept-24	123665	51434	19843
oct-24	175392	73645	32576
nov-24	151454	49529	23971
déc-24	130247	63126	26777
total estimé	**1857157**	**830643**	**305560**

- STEP Ezy-sur-Eure

	DCO	DBO5	NK
mois	Kg/an	Kg/an	Kg/an
janv-24	12214	1860	1459
févr-24	9580	4450	1687
mars-24	20007	2459	949
avr-24	10845	4853	
mai-24	4150	1857	988
juin-24	8706	3666	
juil-24	6504	2107	979
août-24	4781	2138	
sept-24	8510	1417	666
oct-24	7527	3519	
nov-24	3809	127	677
déc-24	13158	794	
total estimé	**109791**	**29247**	**7405**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- STEP Ivry-la-Bataille

	DCO	DBO5	NK
mois	Kg/an	Kg/an	Kg/an
janv-24	10891	36062	1072
févr-24	8319	3996	
mars-24	17990	5930	1482
avr-24	7382	3702	
mai-24	4893	1774	470
juin-24	4998	2503	
juil-24	5309	2780	597
août-24	4799	2054	
sept-24	2891	1317	455
oct-24	6502	1273	
nov-24	5613	1353	864
déc-24	954	281	
total estimé	**80541**	**63025**	**4940**

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

	DCO	DBO5	NK
mois	Kg/an	Kg/an	Kg/an
janv-24	25886	6314	2378
févr-24	13874	7234	
mars-24	7883	7115	1544
avr-24	8167	3267	
mai-24	16607	6032	1559
juin-24	6839	3558	
juil-24	6150	3856	1281
août-24	8888	1768	
sept-24	3667	1422	487
oct-24	13661		
nov-24	8844	3871	1122
déc-24	3182		
total estimé	**123648**	**44437**	**8371**

○ Bilan sur les boues et déchets

En 2024, ont été produites :

- 675,231 tonnes de MS de boues pour la STEP de Dreux ;
- 132,19 tonnes de MS de boues pour la STEP de Ezy-sur-Eure ;
- 49,54 tonnes de MS de boues pour la STEP d'Ivry-la-Bataille ;
- 31,658 tonnes de MS de boues pour la STEP de Châteauneuf-en-Thymerais

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Ces boues seront valorisées en épandage via SEDE (sous-traitant AQUAD) :

- 2421,03 tonnes de boues pour la STEP de Dreux à destination de Saint-Jean-de-Rebervilliers, de Marville-Moutiers-Brûlé, Dampierre-sur-Avre, La Saucelle, Boissy-lès-Perche, Le Boullay-les-Deux-Eglises et Saint-Sauveur-Marville ;
- 294 tonnes de boues pour la STEP de Ezy-sur-Eure à destination de Mousseaux-Neuville ;
- 647,97 tonnes de boues pour la STEP d'Ivry-la-Bataille à destination de Mousseaux-Neuville ;
- 209 tonnes de boues pour la STEP de Châteauneuf-en-Thymerais à destination de Châteauneuf-en-Thymerais.

En 2024, les sous-produits évacués sont :

- Refus de dégrillage Dreux : 45 m^3
- Refus de dégrillage Ezy-sur-Eure : 5 m^3
- Refus de dégrillage Ivry-la-Bataille : 4,8 m^3
- Refus de dégrillage Châteauneuf-en-Thymerais : 12,48 m^3

Les refus de dégrillage sont envoyés en incinération et les sables sont traités par RVD (filiale de traitement).

- Sables Dreux : 89,4 m3

○ Bilan de la consommation énergétique et des réactifs

Le tableau ci-dessous présente la consommation annuelle de la station d'épuration en kWh :

- STEP Dreux

Energie / Consommation (kWh/an)	2024	2023	2022
Electricité	2 594 613	3 326 927	3 322 468

- STEP Ezy-sur-Eure

Energie / Consommation (kWh/an)	2024	2023	2022
Electricité	95 910	167 674	208 153

- STEP Ivry-la-Bataille

Energie / Consommation (kWh/an)	2024	2023	2022
Electricité	87 668	117 908	116 075

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

Energie / Consommation (kWh/an)	2024	2023	2022
Electricité	231 391	327 099	-

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Le tableau ci-dessous présente les quantités de réactifs consommés en 2024 :

- STEP Dreux

Réactifs utilisés (matière commerciale)	File	2024	2023 (oct-déc)	2022
Sels de fer (T)	File(s) eau (point S14)	149,345	77,536	392,916
Polymères (kg)	File(s) boue (point S15)	40 125	2 075	24 000
Chaux (T)	File(s) boue (Point S15)	1,5	-	-

- STEP Ezy-sur-Eure

Réactifs utilisés (matière commerciale)	File	2024	2023 (oct-déc)	2022
Polymères (kg)	File(s) boue (point S15)	920	75	950

- STEP Ivry-la-Bataille

Réactifs utilisés (matière commerciale)	File	2024	2023 (oct-déc)	2022
Polymères (kg)	File(s) boue (point S15)	805	25	775

- STEP Châteauneuf-en-Thymerais

Réactifs utilisés (matière commerciale)	File	2024	2023 (oct-déc)	2022
Sels de fer (T)	File(s) eau (point S14)	32,262	-	-
Polymères (kg)	File(s) boue (point S15)	2000	-	-
Chaux (T)	File(s) boue (Point S15)	11,82	-	-

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

➢ Les contrats passés avec des tiers

En 2024, la SAAPD a utilisé les services des entreprises suivantes :

- SVR pour la réalisation des prestations de curage et de passage d'ITV
- SEDE pour la gestion du plan d'épandage
- ASS'O/SOC pour l'assistance à l'exploitation dans le cadre de la prise de contrat et la maintenance des installations.

➢ Les assurances contractées

Les attestations correspondantes sont fournies en annexe.

➢ Les études et travaux

La SAAPD dispose de son propre bureau d'étude apte à fournir une assistance technique à la collectivité au-delà de son rôle d'exploitant.

Elle assure une veille technologique et réglementaire dans le domaine de l'assainissement.

Elle réalise des études techniques de conception des stations de relèvement et de dimensionnement des réseaux de collecte des eaux usées ou pluviales.

Elle peut réaliser certains travaux avec ses propres équipes : armoire électrique et automatismes, réseaux enterrés, branchements.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.7. La gestion du patrimoine

L'inventaire des installations

➢ L'inventaire des postes de relèvement et des ouvrages spécifiques du réseau de collecte

La SAAPD tient à jour, pour le compte de la collectivité, l'inventaire des biens constituant le patrimoine du service d'assainissement.

L'inventaire des postes est réalisé à l'aide d'un tableur informatique qui recense les équipements de chacun d'entre eux, en précisant leurs caractéristiques, leur année de pose, leur état et leur aptitude à assurer le service.

Par ailleurs, la SAAPD utilise un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) (Autocad) pour dessiner et mettre à jour les plans des postes et ouvrages spécifiques du service d'assainissement.

➢ L'inventaire des réseaux de collecte

La SAAPD utilise un Système d'Information Géographique (AqualiaGIS) pour tenir à jour le descriptif du réseau de collecte des eaux pluviales et des eaux usées de la collectivité.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

RESEAU D'ASSAINISSEMENT
Commune de Dreux: Extrait GEO (2023)

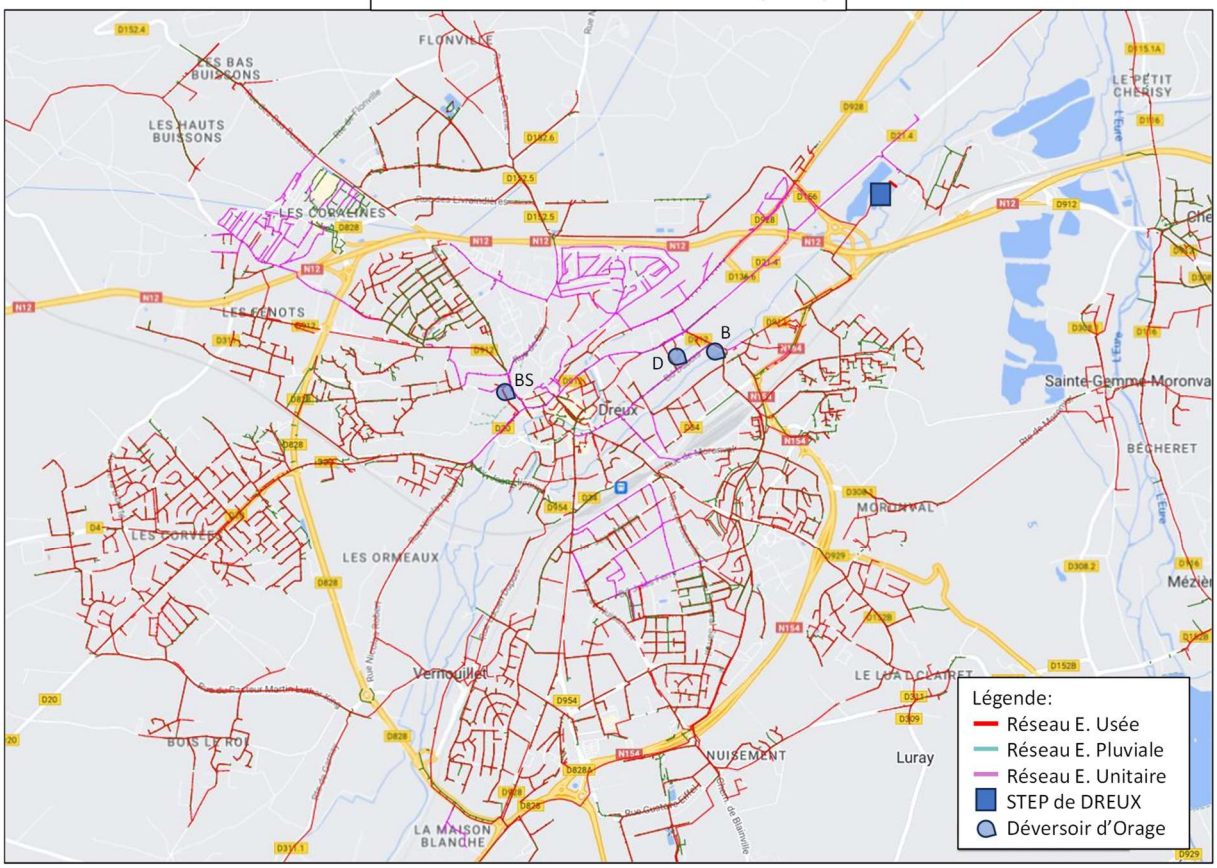


Figure 13 – Exemple vue du réseau de Dreux

La collectivité a accès en continu aux données enregistrées dans le SIG de la SAAPD relatives à son service d'assainissement.

Enfin, ces données sont transmises à la collectivité sur demande de celle-ci pour qu'elle mette à jour son propre SIG.

Un inventaire détaillé du réseau est fourni en annexe.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Le contrôle de l'état du patrimoine

➢ L'inspection des postes

Les contrôles effectués sont décrits au Chap.6.

➢ L'inspection télévisée du réseau

L'inspection télévisée du réseau est un moyen permettant un contrôle systématique de l'état du réseau. Elle consiste à introduire dans un collecteur une caméra mobile qui filme l'intérieur du tronçon inspecté ce qui permet de visualiser d'éventuels défauts (déboitement, pénétration de racines, accumulation de dépôts, …).

En 2024, le programme d'inspection télévisée du réseau suivant a été réalisé :

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Nom de la rue	Ville	Date réalisation	Linéaire réalisé (ml)	Branchement réalisés (ml)	Nombre de branchement	N° ITV
AVENUE DES ACACIAS	AUNAY SOUS CRECY	06-02-2024	360,00	144,00	20,00	D24023
AVENUE DES ACACIAS	AUNAY SOUS CRECY	06-02-2024	118,00	35,00	5,00	D24024
ALLEE DES ERABLES	AUNAY SOUS CRECY	01-02-2024	318,00	79,00	14,00	D24022
RUE DES MARNERONS	LE BOULAY MIVOYE	07-02-2024	537,00	96,00	23,00	D24025
RUE SAINT NICOLAS	LE BOULAY MIVOYE	07-02-2024	338,00	24,00	8,00	D24026
RUE DES MARNERONS	LE BOULAY MIVOYE	06-02-2024	537,00	96,00	23,00	D24025
ALLEE DES BOUVIERS	CHARPONT	15-04-2024	366,00	76,00	13,00	D24051
CHEMIN RURAL No28 (CHEMIN D'ECLUZELLES A OUERRE CHEMIN DES COLOMBIERS)	CHARPONT	15-04-2024	11,00	113,00	22,00	D24063
CHEMIN RURAL No29 (SENTE DEBUCHE DES FONDS)	CHARPONT	15-04-2024	108,00			D24063
IMPASSE DES FLEURS	CHARPONT	15-04-2024	30,00			D24063
ROUTE DEPARTEMENTALE No116 (ROUTE D'ANET ANGERVILLE PAR COULOMBS)	CHARPONT	15-04-2024	290,00			D24063
RUE DES BOUVIERS	CHARPONT	15-04-2024	406,70	76,30	13,00	D24051
ALLEE DU DOCTEUR DURAND	DREUX	16-05-2024	169,00	48,00	8,00	D24079
ALLEE L, LECOIN	DREUX	14-05-2024	96,00	46,00	5,00	D24078
AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY	DREUX	02-09-2024	448,00	0,00	0,00	D24112
CR N, 81 DIT DE CONTEVILLE	DREUX	06-10-2024	165,00	9,00	1,00	D24114
RUE ALBERT BESSIERE	DREUX	15-07-2024	180,00	25,00	4,00	D24103
TRAIT D'UNION	DREUX	06-09-2024	520,00	10,00	1,00	D24113
PLACE DES ORIELS	DREUX	04-09-2024	186,00	40,00	11,00	D24115
AVENUE PRESIDENT J.F KENNEDY	DREUX	17-07-2024	86,00	0,00	0,00	D24106
RUE FRAPIE	DREUX	17-07-2024	10,50	10,50	1,00	D24106
IMPASSE DU 8 MAI 1945	EZY SUR EURE	30-01-2024	518,00	154,00	27,00	D24017
RUE ALFRED VEILLET	EZY SUR EURE	31-01-2024	245,00	83,00	13,00	D24020
RUE BEAUSOLEIL	EZY SUR EURE	31-01-2024	361,00	136,00	19,00	D24019
RUE DU 8 MAI 1945	EZY SUR EURE	30-01-2024	518,00	153,00	27,00	D24017
RUE JEAN MOULIN	EZY SUR EURE	30-01-2024	113,00	29,00	8,00	D24018
RUE PAULINE ROLAND	EZY SUR EURE	31-01-2024	224,00	9,00	1,00	D24021
PLACE DE LA CROIX PAGEOT	EZY SUR EURE	29-07-2024	135,90	16,00	3,00	D24110
PLACE FELIX HULIN	EZY SUR EURE	13-09-2024	122,60	33,00	6,00	D24119
RUE ARISTIDE BRIAND	EZY SUR EURE	30-10-2024	246,00	15,00	3,00	D24120
RUE DU QUAI	EZY SUR EURE	NON REALISABLE	/	/	/	/
RUE FREDERIC PASSY	EZY SUR EURE	NON REALISABLE	/	/	/	/
RUE OCTAVE LENOIR	EZY SUR EURE	29-10-2024	503,00	157,00	38,00	D24131
RUE RENOU	EZY SUR EURE	30-07-2024	227,50	56,00	10,00	D24111
CHAMBLEAN RUE DE LA MARE A LA BONNETTE	GARNAY	15-05-2024	60,00	0,00	0,00	D24080
RUE DES HAIES	GARNAY	06-05-2024	492,00	71,00	18,00	D24076
CHEMIN DEPARTEMENTAL No312 (RUE DE CHAILLOY)	GARNAY	07-05-2024	10,00	5,00	1,00	D24076
RUE DE LA LISSE	GARNAY	13-05-2024	559,00	140,00	27,00	D24077
D833, RUE DU BEARNAIS	IVRY LA BATAILLE	13-02-2024	409,00	101,00	18,00	D24035
RUE MONTPENSIER	IVRY LA BATAILLE	14-02-2024	97,00	17,00	5,00	D24037
PLACE SAINT CLAIR	LURAY	08-02-2024	90,00	48,00	6,00	D24027
RUE DE L' EGLISE	LURAY	08-02-2024	293,00	82,00	13,00	D24031
RUE DE LA COMMANDERIE	LURAY	08-02-2024	169,00	40,00	8,00	D24029
RUE DU PRESSOIR	LURAY	08-02-2024	59,00	17,00	4,00	D24030
RUE EMILE ZOLA	LURAY	08-02-2024	231,00	29,00	7,00	D24028
RUE DES GIGNOTS	MARVILLE MOUTIER BRULE	07-11-2024	400,00	46,00	20,00	D24134
RUE DE LA LIBERATION	MARVILLE MOUTIER BRULE	08-11-2024	92,00	3,00	2,00	D24135
RUE DE LA LIBERATION	MARVILLE MOUTIER BRULE	08-11-2024	208,00	21,00	3,00	D24136
RUE DE SAINT PIERRE	MARVILLE MOUTIER BRULE	10-10-2024	297,00	56,00	14,00	D24126
ALLEE DU BOIS D'OREE / RUE DES HAUTS DE MORONVAL	SAINTE GEMME	21-05-2024	44,00	/	/	D24084
ALLEE CHEMIN GUEVARA	VERNOUILLET	04-10-2024	172,00	77,00	9,00	D24116
ALLEE FRANCISCO MIRANDA	VERNOUILLET	11-04-2024	9,40	0,00	0,00	D24062
AVENUE LOUISE MICHEL	VERNOUILLET	08-04-2024	299,00	37,00	6,00	D24059
BOULEVARD MARCEL PAGNOL	VERNOUILLET	17-04-2024	110,00	0,00	0,00	D24067
IMPASSE DES BOUVREUILS	VERNOUILLET	16-04-2024	114,00	50,00	6,00	D24064
PASSAGE SALVADOR ALLENDE	VERNOUILLET	10-04-2024	143,00	63,00	8,00	D24060
PLACE DU 16 AOUT 1944	VERNOUILLET	17-04-2024	48,00	/	/	D24065
RUE DANIELE CASANOVA	VERNOUILLET	18-04-2024	390,00	152,00	25,00	D24066
RUE DANTON	VERNOUILLET	11-04-2024	131,00	33,00	5,00	D24061
RUE NICOLAS ROBERT	VERNOUILLET	05-11-2024	107,00	/	/	D24132
RUE NICOLAS ROBERT	VERNOUILLET	03-10-2024	1834,00	450,00	78,00	D24121
RUE DE LA PYRAMIDE	VERT EN DROUAIS	15-10-2024	164,00	29,00	8,00	D24128
RUE DES CORNEILLES	VERT EN DROUAIS	16-10-2024	129,00	/	/	D24129
RUE DES CORNEILLES	VERT EN DROUAIS	16-10-2024	469,00	53,00	15,00	D24130

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les travaux de renouvellement réalisés par le délégataire

Les opérations de renouvellement sont détaillées ci-après :

Référence	Commune	Ouvrage	Détail	Ouvrage/Nom équipement	P = Programmé/Patrimonial G = Garantie/Fonctionnel
8	DREUX	STEU à Dreux	clarificateur	pompe recirculation 2 file A débit fixe	P
9	DREUX	STEU à Dreux	clarificateur	pompe recirculation 2 file B débit fixe	P
10	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	sonde voile de boue niveau bas	G
12	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	transmetteur sonde voile de boue niveau bas	G
14	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	transmetteur sonde voile de boue niveau haut	G
15	DREUX	STEU à Dreux	centrifugation	pompe boues centrifugées	P
116	CHARPONT	PR210 PR11 CHARPON à charpont	poste de relèvement	armoire générale BT	G
600	DREUX	STEU à Dreux	dégrilleur entrée station - grille by-pass	motoréducteur dégrilleur	P
601	DREUX	STEU à Dreux	dégrilleur entrée station - grille by-pass	armoire de commande dégrilleur primaire	G
608	DREUX	STEU à Dreux	relèvement	pompe relevement 2	G
612	DREUX	STEU à Dreux	relèvement	pompe relevement 5	P
619	DREUX	STEU à Dreux	relèvement	palan sur monorail relèvement	G
621	DREUX	STEU à Dreux	relèvement	support monorail relèvement	G
626	DREUX	STEU à Dreux	relèvement	sonde de niveau EB	P
640	DREUX	STEU à Dreux	dégrilleur secondaire	motoréducteur vis collecte déchets	P
749	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	moteur surpresseur A	G
750	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	moteur surpresseur B	P
763	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	réducteur MERGER ligne A	P
765	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	réducteur MERGER ligne B	P
786	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur redox zone aérobie file A	P
787	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur redox zone aérobie file B	G
790	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur de MES file A	G
791	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur de MES file B	G
795	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur d'oxygène file A	P
796	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	capteur d'oxygène file B	G
808	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	sonde oxygene witos A	P
809	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	sonde oxygene witos B	P
810	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	sonde Redox witos BA A	P
811	DREUX	STEU à Dreux	bassin zone d'aération	sonde Redox witos BA B	P
877	DREUX	STEU à Dreux	clarificateur	sonde de niveau puit recirculation file B	G
912	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	pompe recirculation densadeg	P
914	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	ballon hydrophore	G
923	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	sonde voile de boue niveau bas	P
932	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	agitateur hélico-mélangeur à vitesse fixe (*2)	P
946	DREUX	STEU à Dreux	densadeg	pompe doseuse FeCl3 A	P
1035	DREUX	STEU à Dreux	poste préparation polymère boues centri	moteur doseur poudre polymère	P
1037	DREUX	STEU à Dreux	poste préparation polymère boues centri	pompe alim polymère centri	P
1049	DREUX	STEU à Dreux	centrifugation	Pièces centrifugeuse	G
1064	DREUX	STEU à Dreux	centrifugation	variateur de frequence moteur vis centri	G
1104	DREUX	STEU à Dreux	poste de chaulage	variateur de fréquence commande gaveuse	G
1209	DREUX	STEU à Dreux	local exploit , labo, topkapi	onduleur(*10)	P
1210	DREUX	STEU à Dreux	local exploit , labo, topkapi	PC Topkapi	P
1228	DREUX	STEU à Dreux	local exploit , labo, topkapi	onduleur(*10)	P
1252	DREUX	STEU à Dreux	eau industrielle	pompe eau industrielle A	P
1256	DREUX	STEU à Dreux	eau industrielle	pompe eau industrielle C	P
1266	DREUX	STEU à Dreux	eau industrielle	pompe eau industrielle B	G
1586	LURAY	PR60 ANCIENNE MAIRIE à Luray	poste de relèvement	pompe 2	P
1651	MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ	PR131 IMBERMAIS à marville	poste de relèvement	pompe 1	G
1935	SAULNIÈRES	PR180 BRETONNIERES à Saulnières	poste de relèvement	pompe 2	G
1975	SAULNIÈRES	PRS185 MARVILLE à saulnières	poste de relèvement	télétransmission	G
2145	VERNOUILLET	PR33 JEAN BERTIN EU à Vernouillet	poste de relèvement	pompe 2	P
2368	VILLEMEUX-SUR-EURE	PR93 PR14 MESNIL PONCEAU à villemeux	poste de relèvement	télétransmission	P
2373	VILLEMEUX-SUR-EURE	PR94 PR 15 MAUZAISE à villemeux	poste de relèvement	pompe 2	P
2574	CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS	STEP à Châteauneuf	relèvement	sonde de niveau	P
2788	ÉZY-SUR-EURE	STEP à Ezy/Eure	Poste de relevage lotissement	pompe relevage 1	G
2851	ÉZY-SUR-EURE	STEP à Ezy/Eure	Bassin d'aération	sonde redox	P
2865	ÉZY-SUR-EURE	STEP à Ezy/Eure	Puits recirculation	pompe recirculation 1	G
2869	ÉZY-SUR-EURE	STEP à Ezy/Eure	Traitement des boues	doseur distrubution polymère	G
2871	ÉZY-SUR-EURE	STEP à Ezy/Eure	Traitement des boues	Groupe surpesseur lavage toile	G
3095	IVRY-LA-BATAILLE	STEP à Ivry La Bataille	dégrilleur	motoréducteur	P
3153	IVRY-LA-BATAILLE	STEP à Ivry La Bataille	point de sortie des boues	surpresseur eau industrielle (x2)	P

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les ouvrages et installations mises hors service

Il n'y a pas eu en 2024, d'ouvrages ou d'installations mis hors services.

Les travaux financés par la collectivité

➢ Les nouvelles installations réalisées

En 2024, aucun investissement n'a été réalisé.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

La facture 120 m³

Un exemple de facture type de 120 m³ est présentée ci-dessous :

Facture d'un client ayant consommé 120 m³

établie sur la base des tarifs au 1er janvier pour un abonné d'Aunay-sous-Crécy (28)

	m³	Prix de base au 1/1/2024	Montant 2024 (€HT)
SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT			
Part du délégataire			
sans objet			
Part des Collectivités			
redevance communautaire (CA Pays de Dreux)	120	3,7000 €HT/m3	444,00
Part des organismes publics			
Redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif (Agence de l'eau)	120	0,0267 €HT/m3	3,20
TVA		10,0%	44,72
Total TTC de la facture			**491,92**
Soit le m3 TTC			**4,9192**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Ci-dessous est détaillé le prix de l'assainissement (part collectivité €HT) par commune :

Communes	ASST 2023		ASST 2024	
	Prime fixe	Part variable (m^3)	Prime fixe	Part variable (m^3)
Abondant	-	2,28	-	2.40
Ardelles		3,25		3.25
Aunay-sous-Crécy		3,70		3.70
Charpont		4,87		4.87
Châteauneuf-en-Thymerais	45.16	2.04	45.16	2.16
Chérisy		2,28		2.40
Crécy-Couvé		4,87		4.87
Dreux		2,38		2.55
Ecluzelles	32,00	4,10	32.00	4.10
Ezy-sur-Eure	62,00	2,63	62.00	2.69
Garnay		2,28		2.4
Ivry-la-Bataille	124,00	2,70	124.00	2.76
Le Boullay-Mivoye		4,87		4.87
Le Boullay-Thierry		2,53		2.59
Luray		2,28		2.40
Marville		4,87		4.87
Mézières-en Drouais		2,28		2.40
Saint-Sauveur-Marville		3,33		3.33
Sainte-Gemme-Moronval		2,28		2.40
Saulnières		4,87		4.87
Serazereux		4,87		4.87
Thimert-Gâtelles		1,64		1.76
Tréon		2,66		2.72
Vernouillet		2,22		2.34
Vert-en-Drouais		4,87		4.87
Villemeux-sur-Eure		2,92		2.98

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.8. L'amélioration et l'évolution du service

Les interventions programmées par le délégataire

➢ Le réseau de collecte

En 2025, la SAAPD a prévu les interventions spécifiques suivantes :

		2023	2024	205
CURAGE	Contractuel	14 026	56 107	56 107
	A réaliser avec report	-	63 857	63 518
	Réalisé	6 276	56 446	
	Report	7 750	7 411	
		2023	**2024**	**2025**
ITV	Contractuel	7 013	28 054	28 054
	A réaliser avec report	-	35 067	46 997
	Réalisé	-	16 124	
	Report	7 013	18 943	

Dans le tableau ci-dessous, pour l'année 2025, le contractuel comprend l'obligation contractuelle de l'année en cours, plus l'avance ou le retard de l'année précédente.

➢ Le renouvellement

En 2025, AQUAD prévoit de rattraper le retard sur le renouvellement programmé et envisage une enveloppe de 800K€ HT.
AQUAD priorisera sur le remplacement de toutes les pompes des postes de relèvement ayant qu'une pompe au démarrage du contrat. Elle poursuivra la remise à niveau des installations, toujours dans l'optique d'améliorer leur fonctionnement et de réaliser des gains énergétiques.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les améliorations proposées par le délégataire

STEP de Dreux :

➢ Remplacement des surpresseurs d'air

AQUAD, propose à la collectivité le remplacement des surpresseurs de la Station de Dreux par des surpresseurs nouvelle génération, moins énergivore et plus efficient pour le traitement des effluents. Cette optimisation permettra de faire fonctionner deux surpresseurs en même temps sans dépasser la puissance électrique souscrite de 600 kVa.

Les travaux proposés pour la remise en état et l'optimisation du système d'aération comprennent :

- Remplacement des vannes d'isolement des rampes d'aération
- Réparation des fuites d'air dans les tuyauteries d'alimentation entre les suppresseurs nouvellement installés et les diffuseurs d'air
- Modification des nourrices d'aération dans le local d'aération pour les adapter aux nouveaux surpresseurs y compris vannes d'isolement et trois dilatoflex
- Modification de l'alimentation électrique à partir de l'armoire électrique Aération y compris la fourniture et pose de trois armoires déportées pour l'alimentation électrique et le contrôle/commande de chaque surpresseur
- Fourniture et pose des nouveaux surpresseurs au lieu et place des surpresseurs existants

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Les évolutions réglementaires

Les derniers textes législatifs ou réglementaires relatifs au service public d'assainissement collectif et d'assainissement pluvial sont listés ci-après :

Domaine d'application	Type de texte	Date	Titre	Renvoi
Assainissement	Arrêté	10/07/2024	Arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif	1
Assainissement	Décret	12/07/2024	Décret n° 2024-796 du 12 juillet 2024 relatif à des utilisations d'eaux impropres à la consommation humaine	
Assainissement	Arrêté	12/07/2024	Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques	
Assainissement	Arrêté	10/07/2024	Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de désagrégation et d'évacuation des matières fécales	
Assainissement	Décret	11/04/22	Décret no 2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour la transmission du rapport établi à l'issue du contrôle de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires	
Assainissement	Décret	30 /06/20	Décret n°2020-828 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau	2
Assainissement	Arrêté	31/07/20	Arrêté modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif	2
Travaux	Arrêté	06/07/22	Arrêté du 6 juillet 2022 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour l'année 2022	
Travaux	Arrêté	04/10/22	Arrêté du 4 octobre 2022 portant création du titre professionnel d'opérateur en détection de réseaux	
Travaux	Arrêté	04/10/22	Arrêté du 4 octobre 2022 portant création du titre professionnel de technicien en détection et géoréférencement de réseaux	
Facturation	Arrêté	05-juil-24	Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales	

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Domaine d'application	Type de texte	Date	Titre	Renvoi
Facturation	Arrêté	05-juil-24	Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	
Facturation	Décret	09-juil-24	Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau 2	
Facturation	Arrêté	10-juil-24	Arrêté du 10 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau [et] modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte	
Facturation	Arrêté	02-oct-24	Arrêté du 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées	
Facturation	Avis	30-oct-24	Avis relatif à la délibération no CA 24-27 du 19 septembre 2024 adoptant les tarifs des redevances AESN pour les années 2025 à 2030	
Facturation	Arrêté	07-mai-24	Arrêté du 7 mai 2024 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement pour l'année 2024	

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025

1	L'arrêté du 10 juillet modifie l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Ainsi, dans le cas des systèmes d'assainissement collectif et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, le maître d'ouvrage doit désormais décrire dans le manuel d'autosurveillance du système d'assainissement de manière précise le système d'assainissement et son fonctionnement, les obligations réglementaires associées, son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et de prélèvements, les équipements d'autosurveillance installés, les modalités de transmission et de fiabilisation des données d'autosurveillance conformément au scénario visé à l'article 19 de l'arrêté du 21 juillet 2025, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. De plus, l'arrêté ajoute que les manuels d'autosurveillance sont établis conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr. Les manuels des systèmes d'assainissement existants sont mis en conformité avec ce modèle dès lors qu'au moins une des stations de traitement des eaux usées du système est nouvelle ou fait l'objet d'une réhabilitation ou dès lors que le manuel nécessite une modification notable, et au plus tard le 31 décembre 2028. De même, en ce qui concerne les rôles des agences de l'eau et des offices de l'eau et l'expertise technique du dispositif d'autosurveillance des systèmes d'assainissement, rappelons que l'agence de l'eau ou l'office de l'eau s'appuie sur les informations fournies par le maître d'ouvrage permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d'autosurveillance. L'arrêté dispose qu'à cette fin, le maitre d'ouvrage fait réaliser un contrôle technique du dispositif d'autosurveillance par un organisme compétent et indépendant. Ce contrôle technique est réalisé au moins une fois tous les deux ans sur l'ensemble des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l'environnement à l'adresse suivante : https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr par le maitre d'ouvrage qui le transmet à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle. Lorsque le rapport démontre l'absence de fiabilité du dispositif d'autosurveillance, l'agence de l'eau ou l'office de l'eau peut demander au maitre d'ouvrage de faire réaliser un nouveau contrôle dans un délai maximum d'un an suivant cette demande. Les organismes en charge du contrôle devront justifier d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-34 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2028.

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025

2	L'obligation de réaliser un diagnostic périodique du système d'assainissement est étendue à tous les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique (CBPO). Le calendrier de mise en œuvre du diagnostic est le suivant : - CBPO ≥ 600 kg/ j de DBO5 : au plus tard le 31 décembre 2021, - 120 ≤ CBPO < 600 kg/ j de DBO5 : au plus tard le 31 décembre 2023, - CBPO < 120 kg/j de DBO5 : au plus tard le 31 décembre 2025. L'obligation de diagnostic permanent, auparavant seulement applicable aux systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter des CBPO supérieures ou égales à 600kg/j (avant le 31 décembre 20121), est également étendue à ceux pour lesquels cette valeur est supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (avant le 31 décembre 2024). En outre, dans le cadre de ce diagnostic permanent, une coopération entre les maîtres d'ouvrages d'un même système d'assainissement est instaurée afin que le diagnostic soit cohérent. L'arrêté étend également l'obligation de réaliser une analyse des risques de défaillance aux systèmes d'assainissement existants et fixe un nouvel échéancier pour sa mise en œuvre, selon leur CBPO : - 12 ≤ CBPO < 120 kg/j de DBO5 : au moment de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées - 120 ≤ CBPO < 600 kg/j de DBO5 : analyse transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2023 - CBPO ≥ 600 kg/j de DBO5 : analyse transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2021. L'arrêté précise en outre les informations devant être transmises par les maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement dans le cadre du registre des systèmes d'assainissement (instauré par le décret n°2020-828 du 30 juin 2020). Cette obligation, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021, concerne les propriétaires des systèmes d'assainissement dont 12 ≤ CBPO < 120 kg/j de DBO5 (article R. 214-106-1 C. env.). Ces informations sont relatives à « la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement » (R. 214-106-1 C. env.). L'arrêté précise ces informations en son annexe IV. Il s'agit notamment des informations administratives relatives au maître d'ouvrage et à l'exploitant du système d'assainissement, à la station de traitement des eaux usées (notamment date du permis de construire, date de mise en service ou encore localisation), à la zone de collecte des eaux usées (notamment le nombre d'habitations desservies, l'estimation de la charge brute de pollution organique, nom et nature des milieux récepteurs, etc.) ou encore les informations relatives aux technologies utilisées pour le traitement, valorisation ou élimination des boues. Le maître d'ouvrage doit mettre à jour les informations du registre au plus tard un mois après que la modification est effective.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap.9. Le compte rendu financier

Le rendu financier 2024 est celui présenté ci-dessous.

Charges	Montant(€)	Produits	Montant(€)
-Redevance percu pour le compte de tiers		**-Redevance percu pour le compte de tiers**	
-Personnel	**615 164,35**	-Refacturation sur dépenses remboursable	**1 963 431,28**
		Semestre I	860 630,65
-Energie électrique	**735 546,37**		
		Semestre II	1 102 800,63
-Produits de traitement	**228 447,75**		
-Analyse	**48 853,92**		
		-Refacturation sur dépenses refacturables	**1 312 305,59**
-Matieres et fournitures	**93 000,99**		
		Semestre I	639 781,53
-Sous traitance	**781 806,72**		
		Semestre II	672 524,06
-Télécommunication	**6 549,87**		
-Véhicules et frais de deplacement	**85 405,76**		
-Informatiques	**35 899,56**		
-Assurances	**4 475,12**		
-Locaux	**55 787,16**		
-Personnel	**13 438,50**		
-Frais generaux	**145 950,60**		
-Renouvellement	**419 523,64**		
-Petit materiel	**5 886,56**		
	3 275 736,87		**3 275 736,87**
		Prime de performance économique	**3 171,87**
		Prime de gestion	**48 121,14**
		Prime aux resultat d'exploitation	**33 274,70**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Chap. 10. La gestion clientèle

L'accueil physique des usagers est réalisé à l'adresse suivante :

AQUAD – 1 rue Jean Bertin – 28500 VERNOUILLET
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

L'accueil téléphonique des usagers est réalisé :

Au moyen d'un numéro unique et local non surtaxé : 02 37 431 430
Pour un accueil téléphonique avec des agents de clientèle locaux
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Un service d'astreinte 24H/24 et 365 j/an

Les branchements neufs réalisés en 2024 sont :

Adresse	Commune	Date Travaux
2Bis rue de Mauzaize	VILLEMEUX-SUR-EURE	16/07/2024
13 rue des Landes	LURAY	27/09/2024
14 rue des Caves	DREUX	02/10/2024
Rue de la Libération	VILLEMEUX-SUR-EURE	09/10/2024
6 rue des Forts	CHERISY	20/08/2024
16 rue Henri Dunant	DREUX	20/09/2024
16 rue des Bâtes	DREUX	06/11/2024
7Bis rue de la Muette	DREUX	02/08/2024
8 rue Christian Valenci	SAINT-GEMME-MORONVAL	03/07/2024
17 rue de la Libération	VILLEMEUX-SUR-EURE	04/06/2024
6Bis rue de la Libération	RAVILLE	03/07/2024
Rue André Ravalée	DREUX	09/09/2024
15 rue Blaise Pascal	DREUX	28/10/2024
2 route du Mans	ARDELLES	08/10/2024
2 route du Mans	ARDELLES	17/09/2024
Chemin de Bellevue	SAINT-GEMME-MORONVAL	12/08/2024
14 rue du vieux pré	DREUX	11/09/2024
3 côte du Boisfort	VILLEMEUX-SUR-EURE	17/07/2024
79 rue de Dreux	LURAY	30/09/2024
20 bd du Lattre de Tassigny	CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS	11/09/2024
31 bd Jean Jaurès	DREUX	27/10/2024
134 route de Crécy	VERNOUILLET	07/08/2024
7a route de Paris	CHERISY	19/08/2024
Lot 1,2,3 rue du Feu	SAUNIERES	01/07/2024
Lot 4,5,6 rue du Feu	SAUNIERES	01/07/2024
13 rue du Pasteur Martin Luther King	VERNOUILLET	06/11/2024
18 bis rue Henri Dunant	DREUX	09/12/2024

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Nombre d'abonnés par commune dont AQUAD gère la facturation ou non :

VILLE_SITE	AC raccordable	AC raccordé	AEP défaut	AEP NON RACCORDE	AEP RACCORDE	AEP standard	ASS défaut	Total général
ABONDANT		701						**701**
ARDELLES		57				111		**168**
AUNAY-SOUS-CRECY		222	3			294		**519**
CHARPONT		231				1		**232**
CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS				43	1352			**1395**
CHERISY		712						**712**
CRECY-COUVE		131				140	1	**272**
DIGNY						11		**11**
DREUX		44481				1		**44482**
ECLUZELLES		72						**72**
EZY-SUR-EURE		1591						**1591**
FAVIERES						242		**242**
FONTAINE-LES RIBOUTS-						116		**116**
GARANCIERES-EN-DROUAIS						122		**122**
IVRY-LA-BATAILLE		1053						**1053**
GARNAY		487				491	1	**979**
LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES						112		**112**
LE BOULLAY-MIVOYE		236						**236**
LE BOULLAY-THIERRY		239				249		**488**
LURAY		613				636	2	**1251**
MARVILLE-MOUTIERS-BRULE		414	1			419	1	**835**
MARVILLE-LES-BOIS						169		**169**
MEZIERES-EN-DROUAIS		439					1	**440**
ORMOY						108		**108**
PUISEUX						64		**64**
SAULNIERES		275				352	2	**629**
SERAZEREUX	1	174				256		**431**
ST-ANGE-ET-TORCAY						143		**143**
ST-JEAN-DE REBERVILLIERS						114		**114**
ST-MAIXME-HAUTERIVE						229		**229**
ST-SAUVEUR-MARVILLE						259		**259**
THIMERT-GATELLES						539		**539**
TREMBLAY-LES-VILLAGES						1116		**1116**
TREON	1	612	2			630		**1245**
VERNOUILLET		4784					1	**4785**
VERT-EN-DROUAIS		489						**489**
VILLEMEUX-SUR-EURE		747				1		**748**
Total général	**2**	**58 760**	**6**	**43**	**1352**	**6925**	**9**	**78 732**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Volumes assainissement facturés par commune :

Communes	Volume en m3
ABONDANT	**54169**
Collectivité	*465*
Domestiques	*43224*
Professionnel	*10480*
ARDELLES	**4533**
Domestiques	*4533*
AUNAY SOUS CRECY	**19927**
Domestiques	*19927*
CHARPONT	**19238**
Domestiques	*19238*
CHERISY	**53676**
Collectivité	*108*
Domestiques	*50946*
Professionnel	*2622*
CRECY COUVE	**9699**
Domestiques	*9699*
DREUX	**NC**
Domestiques	*NC*
ECLUZELLES	**4859**
Domestiques	*4859*
EZY-SUR-EURE	**117079**
Domestiques	*117079*
GARNAY	**40105**
Domestiques	*40094*
Professionnel	*11*
IVRY LA BATAILLE	**90967**
Domestiques	*90967*
LE BOULLAY MIVOYE	**18489**
Domestiques	*18489*
LE BOULLAY THIERRY	**21422**
Agriculteur	*220*
Domestiques	*20821*
Professionnel	*381*
LURAY	**52499**
Collectivité	*103*
Domestiques	*51708*
Professionnel	*688*
MARVILLE MOUTIERS BRULE	**34862**
Domestiques	*34862*
MEZIERES EN DROUAIS	**42442**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Domestiques	*42442*
SAULNIERES	**19766**
Domestiques	*19766*
SERAZEREUX	**10748**
Domestiques	*10748*
TREON	**53143**
Domestiques	*53143*
VERNOUILLET	**444629**
Collectivité	*18637*
Domestiques	*341905*
Professionnel	*84087*
VERT EN DROUAIS	**37078**
Collectivité	*627*
Domestiques	*34276*
Professionnel	*2175*
VILLEMEUX SUR EURE	**50875**
Domestiques	*50875*
TOTAL GENERAL	**1200205**

Nombre de demandes par mails faites par les usagers en 2024 :

Nombre de Mails/typologie	2024
Demande d'abonnement	100
Demande contrôle de conformité	322
Demande client	618
Facturation	96
Communication d'index	96
Demande d'intervention	155
Communication de mandat de prélèvement	1290
Demande de raccordement	34
Réclamation	32
Relève de compteur	306
Demande de résiliation	57
Communication de RIB	67
Autres demandes	48
TOTAL	**3221**

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

Nombre de demandes par courriers faites par les usagers en 2024 :

Nombre de Mails/typologie	2024
Demande client	6
Facturation	8
Communication d'index	2
Communication de mandat de prélèvement	5
Réclamation	8
Relève de compteur	1
Demande de résiliation	13
Autres demandes	2
TOTAL	**45**

Sur les 3221 mails reçus et 45 courriers reçus, uniquement 144 concernent des réclamations soit 4,41% des demandes reçues par mail et courriers.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

ANNEXE 1 : Attestation d'assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE

Allianz IARD, dont le siège social est situé, 1 cours Michelet - CS30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que :

AQUALIA FRANCE
13 Rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine

est garanti par le contrat «**ALLIANZ ENTREPRISE 3**» souscrit **sous le numéro 62007323**, qui a pris effet le 1er juillet 2021.

Pour le risque sis à :
AQUAD
DREUX
BO-1 - BASSIN DE PASDELOUP

Pour les garanties suivantes :
- Incendie - évènements assimilés
- Tempête - Grêle - Neige
- Attentats et actes de terrorisme
- Actes de vandalisme
- Action de l'eau - Gel
- Accidents aux appareils électriques
- Bris de Glaces
- Vol
- Bris des matériels informatiques et de bureautique
- Catastrophes Naturelles
- Responsabilité Civile Propriétaire d'immeuble

Limitation Contractuelle d'Indemnité : 19 900 000 € par sinistre

La présente attestation est valable du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Le présent document, établi par Allianz IARD, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Etablie à Lyon, le 07 mars 2024

Pour Allianz,

Frédéric BACCELLI
Chargé Assurances de biens et de Responsabilités

Attestation d'assurance
ALLIANZ ENTREPRISE 3

Page 1 de 1 - Contrat N° 62007323

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

ANNEXE 2 : Fonctionnement des postes de relevage

- ABONDANT

	PR350 Echalier							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	91,03	3 925	91,02	3 925	3 277,0	16,06	82,97	69,0
01/02/2024	74,05	3 219	74,06	3 219	2 666,0	0,00	74,04	71,6
01/03/2024	80,84	3 664	80,86	3 664	2 910,5	17,25	72,21	27,0
01/04/2024	76,83	3 328	76,84	3 326	2 766,1	27,72	62,98	0,0
01/05/2024	74,26	3 174	90,88	3 619	2 972,6	35,15	64,98	99,0
01/06/2024	87,49	3 481	87,49	3 481	3 149,5	0,00	87,46	0,0
01/07/2024	80,02	3 154	80,02	3 154	2 880,7	5,33	77,32	0,0
01/08/2024	61,39	2 710	61,37	2 709	2 209,6	16,83	52,96	0,0
01/09/2024	74,88	3 220	74,88	3 220	2 695,7	18,56	65,59	0,0
01/10/2024	108,11	3 995	108,12	3 995	3 892,1	0,00	108,08	0,0
01/11/2024	94,16	3 837	94,16	3 837	3 389,9	0,00	94,13	3,4
01/12/2024	109,62	4 690	109,62	4 690	3 946,4	0,00	109,61	36,3
MAX	**109,6**	**4 690**	**109,6**	**4 690**	**3 946**	**35**	**110**	**99**
MOYEN	**84,4**	**3 533**	**85,8**	**3 570**	**3 063**	**11**	**79**	**26**
MIN	**61,4**	**2 710**	**61,4**	**2 709**	**2 210**	**0**	**53**	**0**
TOTAL	**1 012,7**	**42 397**	**1 029,3**	**42 839**	**36 756**	**137**	**952**	**306**
%Tps Pluie	**8%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR351 Brissard					
	RELEVAGE POMPE 1		RELEVAGE POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	0,02	18	571,29	1 063	10 283,7	69,0
01/02/2024	0,00	0	479,23	1 137	8 626,1	71,6
01/03/2024	0,01	7	556,37	1 068	10 014,8	27,0
01/04/2024	0,00	0	529,50	901	9 531,0	0,0
01/05/2024	310,45	285	375,53	529	12 347,7	99,0
01/06/2024	576,99	717	127,94	115	12 688,8	0,0
01/07/2024	544,91	918	23,82	51	10 237,1	0,0
01/08/2024	510,28	953	18,37	41	9 515,8	0,0
01/09/2024	562,87	676	98,67	124	11 907,7	0,0
01/10/2024	624,40	590	168,95	215	14 280,3	0,0
01/11/2024	625,88	420	228,27	423	15 374,7	3,4
01/12/2024	742,19	10	451,67	951	21 489,5	36,3
MAX	**742,2**	**953**	**571,3**	**1 137**	**21 489**	**99**
MOYEN	**374,8**	**383**	**302,5**	**552**	**12 191**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**18,4**	**41**	**8 626**	**0**
TOTAL	**4 498,0**	**4 594**	**3 629,6**	**6 618**	**146 297**	**306**
%Tps Pluie	**13%**					

	PR352 Minières							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	70,75	4 417	69,92	4 418	2 532,0	140,66	0,00	69,0
01/02/2024	47,97	3 050	47,20	3 050	1 713,0	89,65	2,76	71,6
01/03/2024	60,15	3 566	59,76	3 562	2 158,4	113,87	3,02	27,0
01/04/2024	63,94	3 436	62,49	3 432	2 275,6	120,13	3,14	0,0
01/05/2024	69,10	3 856	67,10	3 857	2 451,7	126,05	5,08	99,0
01/06/2024	68,45	3 681	66,99	3 681	2 437,8	122,45	6,49	0,0
01/07/2024	55,16	3 180	54,25	3 178	1 969,3	99,30	5,06	0,0
01/08/2024	45,84	2 856	44,29	2 854	1 622,4	88,27	0,93	0,0
01/09/2024	52,52	3 308	52,42	3 308	1 888,9	100,48	2,23	0,0
01/10/2024	80,33	4 111	80,28	4 110	2 890,9	140,52	10,04	0,0
01/11/2024	66,77	4 056	66,70	4 054	2 402,5	132,62	0,42	3,4
01/12/2024	87,54	5 025	87,64	5 023	3 153,2	170,88	2,15	36,3
MAX	**87,5**	**5 025**	**87,6**	**5 023**	**3 153**	**171**	**10**	**99**
MOYEN	**64,0**	**3 712**	**63,3**	**3 711**	**2 291**	**120**	**3**	**26**
MIN	**45,8**	**2 856**	**44,3**	**2 854**	**1 622**	**88**	**0**	**0**
TOTAL	**768,5**	**44 542**	**759,0**	**44 527**	**27 496**	**1 445**	**41**	**306**
%Tps Pluie	**9%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR354 Impasse de l'Echalier					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	0,00	0	3,04	66	30,4	69,0
01/02/2024	0,00	0	2,50	54	25,0	71,6
01/03/2024	0,01	2	2,35	74	23,6	27,0
01/04/2024	0,00	0	3,15	72	31,5	0,0
01/05/2024	0,00	2	3,03	69	30,3	99,0
01/06/2024	0,00	0	3,06	69	30,6	0,0
01/07/2024	0,00	0	2,80	64	28,0	0,0
01/08/2024	0,00	0	2,21	50	22,1	0,0
01/09/2024	0,00	0	3,31	74	33,1	0,0
01/10/2024	0,00	0	3,22	71	32,2	0,0
01/11/2024	0,00	0	3,44	72	34,4	3,4
01/12/2024	0,00	0	3,45	73	34,5	36,3
MAX	**0,0**	**2**	**3,4**	**74**	**34**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**3,0**	**67**	**30**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**2,2**	**50**	**22**	**0**
TOTAL	**0,0**	**4**	**35,6**	**808**	**356**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

- AUNAY-SOUS-CRECY

	PR150 Aunay							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	203,36	1 534	4 115	203,47	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	184,17	1 416	2 885	184,28	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	184,49	1 480	1 420	184,59	0,00	27,0
01/04/2024	67,68	1 179	91,48	1 309	0	154,70	2,31	0,0
01/05/2024	138,15	3 272	138,15	3 272	0	0,00	138,34	99,0
01/06/2024	119,41	3 179	119,41	3 179	0	0,00	97,94	0,0
01/07/2024	122,41	3 176	122,41	3 176	0	0,00	100,26	0,0
01/08/2024	108,37	2 924	108,37	2 924	0	0,00	88,88	0,0
01/09/2024	126,46	2 952	126,46	2 952	0	0,00	103,50	0,0
01/10/2024	143,04	3 034	143,03	3 034	1 924	0,00	116,84	0,0
01/11/2024	136,52	2 853	136,52	2 853	3 646	0,00	111,47	3,4
01/12/2024	143,92	3 951	143,92	3 951	3 907	0,01	118,09	36,3
MAX	**143,9**	**3 951**	**203,4**	**3 951**	**4 115**	**203**	**138**	**99**
MOYEN	**92,2**	**2 210**	**141,8**	**2 590**	**1 491**	**61**	**73**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**91,5**	**1 309**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**1 105,9**	**26 520**	**1 701,8**	**31 080**	**17 897**	**727**	**878**	**306**
%Tps Pluie	**88%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR151 Filature							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	10,55	379	10,90	380	533,1	17,83	1,83	69,0
01/02/2024	14,79	600	14,79	600	0,0	0,00	14,85	71,6
01/03/2024	15,26	601	15,26	601	0,0	0,00	15,32	27,0
01/04/2024	9,81	427	9,81	426	0,6	0,02	9,84	0,0
01/05/2024	17,82	739	17,81	738	0,0	0,00	17,89	99,0
01/06/2024	11,70	488	11,70	488	0,0	0,00	11,75	0,0
01/07/2024	12,94	557	12,94	557	0,0	0,00	12,99	0,0
01/08/2024	11,48	511	11,48	511	0,0	0,00	11,53	0,0
01/09/2024	10,59	476	10,59	476	0,0	0,00	10,63	0,0
01/10/2024	13,42	580	13,42	580	0,0	0,00	13,48	0,0
01/11/2024	8,36	374	8,36	374	0,0	0,00	8,40	3,4
01/12/2024	7,64	363	7,64	363	0,2	0,01	7,68	36,3
MAX	**17,8**	**739**	**17,8**	**738**	**533**	**18**	**18**	**99**
MOYEN	**12,0**	**508**	**12,1**	**508**	**44**	**1**	**11**	**26**
MIN	**7,6**	**363**	**7,6**	**363**	**0**	**0**	**2**	**0**
TOTAL	**144,4**	**6 095**	**144,7**	**6 094**	**534**	**18**	**136**	**306**
%Tps Pluie	**100%**							

	PR152 Rue Gare							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	27,36	615	27,36	615	601,9	0,00	27,41	69,0
01/02/2024	24,10	551	24,10	551	530,3	0,00	24,16	71,6
01/03/2024	26,07	622	26,07	622	573,5	0,00	26,14	27,0
01/04/2024	25,22	521	25,22	520	554,8	0,01	25,26	0,0
01/05/2024	27,46	534	27,45	534	604,0	0,00	27,50	99,0
01/06/2024	26,18	546	26,18	546	576,0	0,00	26,23	0,0
01/07/2024	27,71	571	27,71	571	609,6	0,00	27,76	0,0
01/08/2024	16,64	526	16,64	526	366,1	0,00	16,71	0,0
01/09/2024	20,36	502	20,36	501	447,9	0,00	20,40	0,0
01/10/2024	34,72	593	34,72	592	763,8	0,00	34,77	0,0
01/11/2024	22,23	551	22,23	551	489,1	0,00	22,30	3,4
01/12/2024	27,01	631	27,01	631	594,2	0,00	27,06	36,3
MAX	**34,7**	**631**	**34,7**	**631**	**764**	**0**	**35**	**99**
MOYEN	**25,4**	**564**	**25,4**	**563**	**559**	**0**	**25**	**26**
MIN	**16,6**	**502**	**16,6**	**501**	**366**	**0**	**17**	**0**
TOTAL	**305,1**	**6 763**	**305,1**	**6 760**	**6 711**	**0**	**306**	**306**
%Tps Pluie	**2%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR153 Rue Menou					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	8,25	2 784	8,16	2 784	164,1	69,0
01/02/2024	7,68	2 145	7,59	2 146	152,8	71,6
01/03/2024	8,90	4 036	8,79	4 036	177,0	27,0
01/04/2024	11,58	1 423	11,33	1 419	229,2	0,0
01/05/2024	12,10	1 211	8,67	1 211	207,7	99,0
01/06/2024	11,50	1 096	8,40	1 096	199,1	0,0
01/07/2024	12,04	1 179	8,76	1 177	208,0	0,0
01/08/2024	8,25	3 484	8,10	3 485	163,4	0,0
01/09/2024	7,24	2 743	6,99	2 743	142,3	0,0
01/10/2024	9,12	3 126	8,98	3 125	181,0	0,0
01/11/2024	8,12	2 816	7,99	2 817	161,1	3,4
01/12/2024	12,25	3 708	12,03	3 708	242,7	36,3
MAX	**12,2**	**4 036**	**12,0**	**4 036**	**243**	**99**
MOYEN	**9,8**	**2 479**	**8,8**	**2 479**	**186**	**26**
MIN	**7,2**	**1 096**	**7,0**	**1 096**	**142**	**0**
TOTAL	**117,0**	**29 751**	**105,8**	**29 747**	**2 228**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

	PR154 Grande Rue							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	2,04	57	2,04	58	122,1	4,09	0,00	69,0
01/02/2024	2,22	61	2,15	60	130,8	4,38	0,00	71,6
01/03/2024	2,95	81	2,75	81	170,7	5,72	0,00	27,0
01/04/2024	2,83	87	2,72	87	166,1	5,57	0,00	0,0
01/05/2024	2,70	80	2,59	80	158,1	5,30	0,00	99,0
01/06/2024	2,65	80	2,60	80	157,4	5,27	0,00	0,0
01/07/2024	2,67	78	2,56	78	156,5	5,24	0,00	0,0
01/08/2024	3,08	92	3,00	93	182,0	6,10	0,00	0,0
01/09/2024	2,87	86	2,75	86	168,1	5,63	0,00	0,0
01/10/2024	3,29	96	3,10	95	191,0	6,40	0,00	0,0
01/11/2024	2,76	85	2,85	86	167,7	5,62	0,00	3,4
01/12/2024	3,00	93	2,92	92	177,1	5,94	0,00	36,3
MAX	**3,3**	**96**	**3,1**	**95**	**191**	**6**	**0**	**99**
MOYEN	**2,8**	**81**	**2,7**	**81**	**162**	**5**	**0**	**26**
MIN	**2,0**	**57**	**2,0**	**58**	**122**	**4**	**0**	**0**
TOTAL	**33,0**	**976**	**32,0**	**976**	**1 948**	**65**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- CHARPONT

	PR210 Charpont								
	COMPRESSEUR 1		COMPRESSEUR 2		VANNE 1		VANNE 2		
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	509,59	7 825	503,59	8 165	159,96	11 292	230,95	16 305	69,0
01/02/2024	432,96	4 971	429,34	5 128	157,26	11 103	194,12	13 701	71,6
01/03/2024	534,20	3 170	532,11	3 306	227,77	16 080	246,50	17 408	27,0
01/04/2024	399,70	4 432	396,49	4 572	146,43	10 398	178,73	12 691	0,0
01/05/2024	460,39	6 397	455,60	6 670	155,43	10 971	194,16	13 704	99,0
01/06/2024	384,23	6 310	379,62	6 485	119,25	8 416	164,66	11 624	0,0
01/07/2024	425,72	7 745	420,01	7 958	125,46	8 852	179,82	12 688	0,0
01/08/2024	461,95	4 180	253,87	3 723	183,76	10 437	210,79	12 103	0,0
01/09/2024	398,40	2 988	328,10	2 951	156,40	10 204	177,95	11 645	0,0
01/10/2024	674,33	255	446,65	207	345,89	21 391	293,04	17 609	0,0
01/11/2024	541,74	607	0,00	0	257,17	11 156	269,28	11 679	3,4
01/12/2024	575,42	1 121	0,33	17	251,15	10 905	299,72	13 006	36,3
MAX	**674,3**	**7 825**	**532,1**	**8 165**	**345,9**	**21 391**	**299,7**	**17 609**	**99**
MOYEN	**483,2**	**4 167**	**345,5**	**4 099**	**190,5**	**11 767**	**220,0**	**13 680**	**26**
MIN	**384,2**	**255**	**0,0**	**0**	**119,2**	**8 416**	**164,7**	**11 624**	**0**
TOTAL	**5 798,6**	**50 001**	**4 145,7**	**49 182**	**2 285,9**	**141 205**	**2 639,7**	**164 163**	**306**

	PR212 Sablons						
	POMPE 1		POMPE 2				
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	0,00	0	192,52	4 520	1 690	243	69,0
01/02/2024	0,00	0	164,45	3 805	1 446	184	71,6
01/03/2024	0,00	0	332,98	534	3 019	323	27,0
01/04/2024	0,00	0	183,05	315	1 622	189	0,0
01/05/2024	0,00	0	125,33	227	1 115	131	99,0
01/06/2024	0,00	0	121,94	2 275	1 069	130	0,0
01/07/2024	0,00	0	179,44	3 562	1 491	175	0,0
01/08/2024	0,00	0	152,14	2 714	1 260	152	0,0
01/09/2024	0,00	0	151,77	2 907	1 256	150	0,0
01/10/2024	0,00	0	455,91	1 509	3 537	399	0,0
01/11/2024	0,00	0	196,14	2 822	1 550	208	3,4
01/12/2024	0,00	0	220,30	4 070	1 770	246	36,3
MAX	**0,0**	**0**	**455,9**	**4 520**	**3 537**	**399**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**206,3**	**2 438**	**1 735**	**211**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**121,9**	**227**	**1 069**	**130**	**0**
TOTAL	**0,0**	**0**	**2 476,0**	**29 260**	**20 825**	**2 531**	**306**
%Tps Pluie	**3%**						

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR211 Eglise						
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	36,10	728	11,06	729	149	127	69,0
01/02/2024	15,54	685	10,55	679	154	72	71,6
01/03/2024	22,94	3 827	6,55	3 827	197	83	27,0
01/04/2024	12,99	837	10,35	835	171	60	0,0
01/05/2024	14,20	815	12,57	816	189	55	99,0
01/06/2024	12,38	885	10,92	885	184	51	0,0
01/07/2024	13,09	866	11,50	867	202	52	0,0
01/08/2024	12,50	1 008	10,28	1 001	199	50	0,0
01/09/2024	11,79	1 128	10,03	1 129	185	50	0,0
01/10/2024	40,73	11 138	37,27	11 132	466	116	0,0
01/11/2024	15,91	1 727	12,11	1 728	217	74	3,4
01/12/2024	14,12	1 403	10,83	1 403	191	93	36,3
MAX	**40,7**	**11 138**	**37,3**	**11 132**	**466**	**127**	**99**
MOYEN	**18,5**	**2 087**	**12,8**	**2 086**	**209**	**73**	**26**
MIN	**11,8**	**685**	**6,6**	**679**	**149**	**50**	**0**
TOTAL	**222,3**	**25 047**	**154,0**	**25 031**	**2 504**	**882**	**306**
%Tps Pluie	**0%**						

- CHERISY

	PR360 Petit Chérisy					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	138,20	3 373	183,10	3 355	5 783,5	69,0
01/02/2024	173,26	2 744	100,36	2 732	4 925,1	71,6
01/03/2024	168,20	386	534,96	382	12 657,0	27,0
01/04/2024	206,04	1 834	251,47	1 823	8 235,1	0,0
01/05/2024	258,84	2 026	205,01	2 017	8 349,4	99,0
01/06/2024	258,21	1 800	197,19	1 793	8 197,1	0,0
01/07/2024	455,14	1 563	49,93	1 554	9 091,3	0,0
01/08/2024	111,03	2 911	76,76	2 902	3 380,1	0,0
01/09/2024	198,60	2 229	172,42	2 223	6 678,3	0,0
01/10/2024	186,48	2 411	275,78	2 409	8 320,7	0,0
01/11/2024	281,15	975	285,74	975	10 204,1	3,4
01/12/2024	197,46	2 006	305,35	1 998	9 050,6	36,3
MAX	**455,1**	**3 373**	**535,0**	**3 355**	**12 657**	**99**
MOYEN	**219,4**	**2 022**	**219,8**	**2 014**	**7 906**	**26**
MIN	**111,0**	**386**	**49,9**	**382**	**3 380**	**0**
TOTAL	**2 632,6**	**24 258**	**2 638,1**	**24 163**	**94 872**	**306**
%Tps Pluie	**14%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR361 Petit Raville							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	30,71	1 248	29,97	1 247	1 092,2	60,68	0,00	69,0
01/02/2024	17,78	625	36,89	1 441	984,0	53,37	0,65	71,6
01/03/2024	30,40	1 083	27,72	1 083	1 046,1	58,12	0,00	27,0
01/04/2024	30,02	1 082	27,12	1 083	1 028,5	57,14	0,00	0,0
01/05/2024	37,33	1 183	30,90	1 179	1 228,1	64,53	1,85	99,0
01/06/2024	31,94	1 095	27,17	1 098	1 063,9	55,90	1,61	0,0
01/07/2024	26,73	1 000	24,22	1 001	917,0	48,54	1,21	0,0
01/08/2024	21,43	922	20,33	921	751,5	41,75	0,00	0,0
01/09/2024	25,04	1 095	25,14	1 096	903,4	50,19	0,00	0,0
01/10/2024	28,89	1 154	27,48	1 154	1 014,8	55,68	0,35	0,0
01/11/2024	26,80	1 148	26,47	1 148	958,8	53,27	0,00	3,4
01/12/2024	30,00	1 228	29,79	1 227	1 076,2	59,79	0,00	36,3
MAX	**37,3**	**1 248**	**36,9**	**1 441**	**1 228**	**65**	**2**	**99**
MOYEN	**28,1**	**1 072**	**27,8**	**1 140**	**1 005**	**55**	**0**	**26**
MIN	**17,8**	**625**	**20,3**	**921**	**752**	**42**	**0**	**0**
TOTAL	**337,1**	**12 863**	**333,2**	**13 678**	**12 065**	**659**	**6**	**306**
%Tps Pluie	**11%**							

	PR362 Raville							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	1,46	51	1,50	51	53,3	2,52	0,22	69,0
01/02/2024	2,33	58	2,33	59	83,9	3,49	0,58	71,6
01/03/2024	2,19	71	2,05	71	76,3	4,24	0,00	27,0
01/04/2024	2,09	71	2,07	71	75,0	4,16	0,00	0,0
01/05/2024	2,46	69	2,21	68	84,0	4,67	0,00	99,0
01/06/2024	1,14	33	1,49	32	47,3	2,63	0,00	0,0
01/07/2024	1,71	25	1,27	26	53,6	1,90	0,54	0,0
01/08/2024	1,08	46	1,09	45	39,2	2,18	0,00	0,0
01/09/2024	1,38	42	1,27	43	47,7	2,65	0,00	0,0
01/10/2024	3,47	73	3,27	74	121,4	6,18	0,29	0,0
01/11/2024	0,73	28	0,75	27	26,7	1,48	0,00	3,4
01/12/2024	0,84	31	0,83	29	30,1	1,67	0,00	36,3
MAX	**3,5**	**73**	**3,3**	**74**	**121**	**6**	**1**	**99**
MOYEN	**1,7**	**50**	**1,7**	**50**	**62**	**3**	**0**	**26**
MIN	**0,7**	**25**	**0,8**	**26**	**27**	**1**	**0**	**0**
TOTAL	**20,9**	**598**	**20,1**	**596**	**738**	**38**	**2**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- CRECY-COUVE

	PR170 Crécy							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	128,84	1 418	3 865	128,84	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	120,89	1 339	3 627	120,89	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	119,54	1 302	3 586	119,54	0,00	27,0
01/04/2024	21,35	264	96,30	1 023	3 529	117,35	0,15	0,0
01/05/2024	0,00	0	129,32	1 244	3 879	129,32	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	115,00	1 235	3 450	115,00	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	113,41	1 273	3 402	113,41	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	113,27	1 281	3 398	113,27	0,00	0,0
01/09/2024	0,30	12	119,12	1 355	3 582	119,41	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	133,75	1 494	4 013	133,75	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	127,04	1 458	3 811	127,04	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	145,72	1 524	4 372	145,72	0,00	36,3
MAX	**21,3**	**264**	**145,7**	**1 524**	**4 372**	**146**	**0**	**99**
MOYEN	**1,8**	**23**	**121,8**	**1 329**	**3 710**	**124**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**96,3**	**1 023**	**3 398**	**113**	**0**	**0**
TOTAL	**21,6**	**276**	**1 462,2**	**15 946**	**44 515**	**1 484**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**8%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR171 Bellassières							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	4,00	68	3,81	68	234,2	7,83	0,00	69,0
01/02/2024	3,78	62	3,69	63	223,8	7,48	0,00	71,6
01/03/2024	4,18	66	3,89	65	241,8	8,08	0,00	27,0
01/04/2024	3,96	64	3,82	65	232,3	7,77	0,01	0,0
01/05/2024	4,39	69	4,01	67	251,7	8,41	0,00	99,0
01/06/2024	3,41	57	3,27	58	200,3	6,70	0,00	0,0
01/07/2024	4,50	77	4,17	76	260,0	8,69	0,00	0,0
01/08/2024	4,95	91	4,61	91	286,6	9,58	0,00	0,0
01/09/2024	3,67	68	3,40	68	211,9	7,09	0,00	0,0
01/10/2024	3,94	72	3,64	71	227,1	7,59	0,00	0,0
01/11/2024	4,07	72	3,81	72	235,9	7,89	0,00	3,4
01/12/2024	4,17	72	3,95	72	243,4	8,14	0,00	36,3
MAX	**5,0**	**91**	**4,6**	**91**	**287**	**10**	**0**	**99**
MOYEN	**4,1**	**70**	**3,8**	**70**	**237**	**8**	**0**	**26**
MIN	**3,4**	**57**	**3,3**	**58**	**200**	**7**	**0**	**0**
TOTAL	**49,0**	**838**	**46,1**	**836**	**2 849**	**95**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**1%**							

- DREUX

	PR24 Fusillés							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	71,46	1 101	70,71	1 114	710,8	35,45	53,36	69,0
01/02/2024	96,86	851	67,97	1 028	824,2	65,02	49,91	71,6
01/03/2024	161,69	1 866	158,84	1 833	1 602,7	36,93	141,80	27,0
01/04/2024	30,66	704	30,81	689	307,3	37,50	11,98	0,0
01/05/2024	133,71	1 659	132,78	1 642	1 332,5	28,65	118,93	99,0
01/06/2024	73,08	1 047	72,82	1 030	729,5	28,81	58,54	0,0
01/07/2024	27,54	713	23,81	713	256,8	35,13	8,11	0,0
01/08/2024	96,94	1 150	99,14	1 259	980,4	34,63	80,73	0,0
01/09/2024	89,04	932	88,84	943	889,4	41,79	68,05	0,0
01/10/2024	135,60	1 629	138,27	1 691	1 369,4	48,18	112,85	0,0
01/11/2024	38,96	854	38,90	836	389,3	43,02	17,41	3,4
01/12/2024	31,19	749	32,05	719	316,2	39,03	12,10	36,3
MAX	**161,7**	**1 866**	**158,8**	**1 833**	**1 603**	**65**	**142**	**99**
MOYEN	**82,2**	**1 105**	**79,6**	**1 125**	**809**	**40**	**61**	**26**
MIN	**27,5**	**704**	**23,8**	**689**	**257**	**29**	**8**	**0**
TOTAL	**986,7**	**13 255**	**954,9**	**13 497**	**9 708**	**474**	**734**	**306**
%Tps Pluie	**12%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR01 Chemin de la Mare									
	POMPE 1		POMPE 2		DESODO		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	15,64	281	15,90	281	743,97	0	252,4	31,55	0,00	69,0
01/02/2024	15,85	287	15,50	287	695,97	0	250,8	31,35	0,00	71,6
01/03/2024	14,88	286	14,90	285	742,97	0	238,3	29,79	0,00	27,0
01/04/2024	16,02	297	16,08	298	719,97	0	256,8	32,10	0,00	0,0
01/05/2024	17,85	318	17,86	317	743,97	0	285,6	34,27	0,72	99,0
01/06/2024	14,62	286	14,99	286	719,97	0	236,9	29,61	0,00	0,0
01/07/2024	13,32	255	13,25	256	743,96	1	212,6	24,76	0,91	0,0
01/08/2024	9,93	213	9,98	213	743,97	0	159,3	19,91	0,00	0,0
01/09/2024	12,32	267	12,50	267	719,97	0	198,6	24,83	0,00	0,0
01/10/2024	16,68	339	17,04	338	744,97	0	269,8	33,09	0,32	0,0
01/11/2024	12,34	241	12,34	242	719,97	0	197,4	24,67	0,00	3,4
01/12/2024	14,02	263	14,07	262	743,97	0	224,7	27,64	0,22	36,3
MAX	**17,9**	**339**	**17,9**	**338**	**745,0**	**1**	**286**	**34**	**1**	**99**
MOYEN	**14,5**	**278**	**14,5**	**278**	**732,0**	**0**	**232**	**29**	**0**	**26**
MIN	**9,9**	**213**	**10,0**	**213**	**696,0**	**0**	**159**	**20**	**0**	**0**
TOTAL	**173,5**	**3 333**	**174,4**	**3 332**	**8 783,6**	**1**	**2 783**	**344**	**2**	**306**
%Tps Pluie	**8%**									

	PR02 Rue Muette									
	POMPE 1		POMPE 2		DESODO		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	74,30	1 402	72,81	1 415	743,88	0	735,6	1,64	72,68	69,0
01/02/2024	76,94	1 348	75,44	1 353	695,97	0	761,9	1,52	75,43	71,6
01/03/2024	79,07	1 297	77,71	1 297	742,96	0	783,9	1,36	77,70	27,0
01/04/2024	61,51	1 150	60,37	1 150	719,97	0	609,4	1,13	60,36	0,0
01/05/2024	56,31	1 085	55,22	1 085	743,97	0	557,7	1,07	55,21	99,0
01/06/2024	54,49	1 050	53,44	1 050	719,97	0	539,7	1,04	53,43	0,0
01/07/2024	56,31	1 085	55,22	1 085	743,97	0	557,7	1,07	55,21	0,0
01/08/2024	56,31	1 085	55,22	1 085	743,97	0	557,7	1,07	55,21	0,0
01/09/2024	54,49	1 050	53,44	1 050	719,97	0	539,7	1,04	53,43	0,0
01/10/2024	56,31	1 085	55,22	1 085	743,97	0	557,7	1,07	55,21	0,0
01/11/2024	54,49	1 050	53,44	1 050	719,97	0	539,7	1,04	53,43	3,4
01/12/2024	56,31	1 085	55,22	1 085	743,97	0	557,7	1,07	55,21	36,3
MAX	**79,1**	**1 402**	**77,7**	**1 415**	**744,0**	**0**	**784**	**2**	**78**	**99**
MOYEN	**61,4**	**1 148**	**60,2**	**1 149**	**731,9**	**0**	**608**	**1**	**60**	**26**
MIN	**54,5**	**1 050**	**53,4**	**1 050**	**696,0**	**0**	**540**	**1**	**53**	**0**
TOTAL	**736,8**	**13 772**	**722,8**	**13 790**	**8 782,5**	**0**	**7 298**	**14**	**723**	**306**
%Tps Pluie	**15%**									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

PR03 Bas Buisson

	POMPE 1		POMPE 2		DESODO		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	96,13	1 337	49,38	981	0,00	95	727,5	104,43	41,07	69,0
01/02/2024	111,80	1 342	0,00	0	0,00	0	559,0	111,80	0,00	71,6
01/03/2024	111,24	1 297	0,00	0	0,00	0	556,2	111,24	0,00	27,0
01/04/2024	92,95	1 144	0,00	0	0,00	0	464,7	92,95	0,00	0,0
01/05/2024	93,85	1 529	65,95	1 180	0,00	0	799,0	93,87	65,92	99,0
01/06/2024	67,32	1 196	65,87	1 196	0,00	0	665,9	67,32	65,87	0,0
01/07/2024	66,78	1 058	65,50	1 058	0,00	0	661,4	66,78	65,49	0,0
01/08/2024	60,08	990	58,88	990	0,00	0	594,8	60,09	58,87	0,0
01/09/2024	59,10	1 122	57,63	1 104	0,00	1	583,6	63,97	52,76	0,0
01/10/2024	16,92	347	79,38	1 718	0,00	0	481,5	94,03	2,27	0,0
01/11/2024	91,45	1 330	0,00	0	0,00	0	457,3	91,45	0,00	3,4
01/12/2024	110,30	1 489	0,00	0	0,00	0	551,5	110,30	0,00	36,3
MAX	**111,8**	**1 529**	**79,4**	**1 718**	**0,0**	**95**	**799**	**112**	**66**	**99**
MOYEN	**81,5**	**1 182**	**36,9**	**686**	**0,0**	**8**	**592**	**89**	**29**	**26**
MIN	**16,9**	**347**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**457**	**60**	**0**	**0**
TOTAL	**977,9**	**14 181**	**442,6**	**8 227**	**0,0**	**96**	**7 102**	**1 068**	**352**	**306**
%Tps Pluie	**5%**									

PR05 Flonville

	POMPE 1		POMPE 2		DESODO		COMPRESSEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	72,82	559	68,45	562	743,96	0	0,00	0	943,0	12,17	64,55	69,0
01/02/2024	203,30	817	37,21	901	695,97	0	0,00	0	851,0	215,58	12,47	71,6
01/03/2024	144,97	1 376	48,92	1 456	742,97	0	0,00	0	910,0	153,45	20,21	27,0
01/04/2024	118,71	510	41,33	527	719,97	0	0,00	0	926,0	150,26	4,89	0,0
01/05/2024	104,00	534	42,72	556	743,97	0	0,00	0	926,0	136,56	5,08	99,0
01/06/2024	128,55	486	45,76	523	719,96	0	0,00	0	895,0	135,31	19,49	0,0
01/07/2024	73,50	450	57,21	454	743,95	1	0,00	0	832,0	28,27	51,21	0,0
01/08/2024	44,50	425	44,07	425	743,97	0	0,00	0	620,0	0,41	44,07	0,0
01/09/2024	62,33	324	62,00	325	719,97	0	0,00	0	894,0	0,33	62,00	0,0
01/10/2024	59,58	295	59,28	295	744,97	0	0,00	0	834,0	0,28	59,28	0,0
01/11/2024	135,95	356	45,66	425	719,96	0	0,00	0	712,0	109,49	36,04	3,4
01/12/2024	144,84	740	48,02	814	743,97	0	0,00	0	954,0	160,08	16,38	36,3
MAX	**203,3**	**1 376**	**68,5**	**1 456**	**745,0**	**1**	**0,0**	**0**	**954**	**216**	**65**	**99**
MOYEN	**107,8**	**573**	**50,1**	**605**	**732,0**	**0**	**0,0**	**0**	**858**	**92**	**33**	**26**
MIN	**44,5**	**295**	**37,2**	**295**	**696,0**	**0**	**0,0**	**0**	**620**	**0**	**5**	**0**
TOTAL	**1 293,1**	**6 872**	**600,6**	**7 263**	**8 783,6**	**1**	**0,0**	**0**	**10 297**	**1 102**	**396**	**306**
%Tps Pluie	**6%**											

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR06 Clos Blaise							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	13,78	5 167	314,3	13,78	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	12,80	4 766	237,5	12,80	0,00	71,6
01/03/2024	1,35	554	15,42	5 523	349,6	14,15	1,31	27,0
01/04/2024	3,19	1 365	12,45	5 023	382,7	9,36	3,14	0,0
01/05/2024	10,66	4 256	11,31	4 445	461,4	0,82	10,57	99,0
01/06/2024	9,26	3 948	9,35	3 966	436,6	0,18	9,21	0,0
01/07/2024	11,55	4 345	10,99	4 162	468,7	0,59	10,95	0,0
01/08/2024	7,52	2 823	8,99	3 362	272,7	1,87	7,32	0,0
01/09/2024	1,72	672	11,16	4 294	313,9	9,48	1,70	0,0
01/10/2024	0,00	0	14,47	4 742	347,2	14,48	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	12,34	4 069	277,6	12,34	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	12,06	3 769	244,2	12,06	0,00	36,3
MAX	**11,6**	**4 345**	**15,4**	**5 523**	**469**	**14**	**11**	**99**
MOYEN	**3,8**	**1 497**	**12,1**	**4 441**	**342**	**8**	**4**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**9,0**	**3 362**	**238**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**45,2**	**17 963**	**145,1**	**53 288**	**4 106**	**102**	**44**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

	PR11 Bergeronnette							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	17,24	969	258,5	17,23	0,00	69,0
01/02/2024	0,01	2	16,02	1 096	240,4	16,03	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	18,66	1 249	279,9	18,66	0,00	27,0
01/04/2024	0,00	0	16,28	1 438	244,1	16,28	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	18,57	1 319	278,6	18,58	0,00	99,0
01/06/2024	4,06	877	8,74	1 189	192,0	4,69	3,99	0,0
01/07/2024	9,93	1 884	10,32	1 885	303,7	5,97	7,02	0,0
01/08/2024	7,75	296	8,19	297	239,1	14,53	0,71	0,0
01/09/2024	9,26	388	9,54	387	282,0	18,80	0,00	0,0
01/10/2024	9,97	380	10,54	380	307,7	20,51	0,00	0,0
01/11/2024	9,09	317	9,78	318	282,9	18,86	0,00	3,4
01/12/2024	9,14	312	9,99	312	286,9	19,13	0,00	36,3
MAX	**10,0**	**1 884**	**18,7**	**1 885**	**308**	**21**	**7**	**99**
MOYEN	**4,9**	**371**	**12,8**	**903**	**266**	**16**	**1**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**8,2**	**297**	**192**	**5**	**0**	**0**
TOTAL	**59,2**	**4 456**	**153,9**	**10 839**	**3 196**	**189**	**12**	**306**
%Tps Pluie	**4%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR14 Sénarmont			
	POMPE 1		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	6,86	619	295,1	69,0
01/02/2024	7,03	613	302,5	71,6
01/03/2024	7,01	617	301,6	27,0
01/04/2024	1,04	87	44,6	0,0
01/05/2024	4,30	478	184,8	99,0
01/06/2024	5,89	834	253,2	0,0
01/07/2024	6,47	750	278,4	0,0
01/08/2024	5,09	577	218,8	0,0
01/09/2024	6,24	631	268,2	0,0
01/10/2024	89,06	652	3 829,5	0,0
01/11/2024	502,65	25 943	21 614,0	3,4
01/12/2024	167,41	343 753	7 198,7	36,3
MAX	**502,7**	**343 753**	**21 614**	**99**
MOYEN	**67,4**	**31 296**	**2 899**	**26**
MIN	**1,0**	**87**	**45**	**0**
TOTAL	**809,1**	**375 554**	**34 789**	**306**
%Tps Pluie	**84%**			

	PR15 Facel Vega							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	1,52	54	1,59	54	46,7	3,11	0,00	69,0
01/02/2024	0,37	15	0,44	16	12,2	0,81	0,00	71,6
01/03/2024	0,80	29	0,87	29	25,0	1,67	0,00	27,0
01/04/2024	0,42	16	0,43	15	12,7	0,84	0,00	0,0
01/05/2024	0,42	16	0,42	15	12,7	0,84	0,00	99,0
01/06/2024	0,44	17	0,47	17	13,7	0,92	0,00	0,0
01/07/2024	0,52	21	0,58	22	16,5	1,10	0,00	0,0
01/08/2024	0,26	10	0,28	10	8,1	0,54	0,00	0,0
01/09/2024	0,39	15	0,42	15	12,2	0,81	0,00	0,0
01/10/2024	0,64	23	0,68	23	19,8	1,32	0,00	0,0
01/11/2024	0,38	14	0,40	14	11,8	0,78	0,00	3,4
01/12/2024	0,33	12	0,38	13	10,6	0,71	0,00	36,3
MAX	**1,5**	**54**	**1,6**	**54**	**47**	**3**	**0**	**99**
MOYEN	**0,5**	**20**	**0,6**	**20**	**17**	**1**	**0**	**26**
MIN	**0,3**	**10**	**0,3**	**10**	**8**	**1**	**0**	**0**
TOTAL	**6,5**	**242**	**7,0**	**243**	**202**	**13**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**30%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR16 Lucien Dupuis					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	2,85	248	2,13	246	74,6	69,0
01/02/2024	9,05	188	7,27	181	244,9	71,6
01/03/2024	59,38	220	25,84	214	1 278,3	27,0
01/04/2024	14,35	46	1,01	44	230,4	0,0
01/05/2024	3,71	209	3,26	209	104,6	99,0
01/06/2024	0,44	51	0,42	51	12,9	0,0
01/07/2024	0,36	43	0,34	42	10,5	0,0
01/08/2024	0,38	47	0,36	46	11,0	0,0
01/09/2024	0,37	46	0,36	46	10,9	0,0
01/10/2024	0,63	75	0,61	75	18,6	0,0
01/11/2024	0,34	41	0,34	42	10,2	3,4
01/12/2024	0,38	44	0,35	43	11,0	36,3
MAX	**59,4**	**248**	**25,8**	**246**	**1 278**	**99**
MOYEN	**7,7**	**105**	**3,5**	**103**	**168**	**26**
MIN	**0,3**	**41**	**0,3**	**42**	**10**	**0**
TOTAL	**92,2**	**1 258**	**42,3**	**1 239**	**2 018**	**306**
%Tps Pluie	**83%**					

	PR17 Adèle Foucher							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	7,88	263	7,82	263	314,0	15,70	0,00	69,0
01/02/2024	8,63	288	8,40	287	340,7	17,04	0,00	71,6
01/03/2024	9,77	325	9,47	325	384,7	19,24	0,00	27,0
01/04/2024	9,88	331	9,64	331	390,4	19,41	0,06	0,0
01/05/2024	9,90	338	9,75	339	393,0	19,64	0,00	99,0
01/06/2024	9,65	332	9,57	332	384,3	19,21	0,00	0,0
01/07/2024	10,18	297	10,05	296	404,7	18,72	0,76	0,0
01/08/2024	9,19	303	9,06	303	365,1	18,25	0,00	0,0
01/09/2024	10,44	302	10,29	302	414,6	20,73	0,00	0,0
01/10/2024	10,98	280	11,27	280	445,1	21,88	0,19	0,0
01/11/2024	9,29	251	9,24	250	370,7	18,54	0,00	3,4
01/12/2024	10,75	380	10,65	374	427,9	21,27	0,06	36,3
MAX	**11,0**	**380**	**11,3**	**374**	**445**	**22**	**1**	**99**
MOYEN	**9,7**	**308**	**9,6**	**307**	**386**	**19**	**0**	**26**
MIN	**7,9**	**251**	**7,8**	**250**	**314**	**16**	**0**	**0**
TOTAL	**116,5**	**3 690**	**115,2**	**3 682**	**4 635**	**230**	**1**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR18 Notre Dâme					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	1,11	196	0,94	192	81,9	69,0
01/02/2024	1,36	242	1,16	240	100,8	71,6
01/03/2024	0,78	136	0,67	134	57,9	27,0
01/04/2024	0,62	110	0,53	108	45,9	0,0
01/05/2024	1,87	329	1,62	329	139,6	99,0
01/06/2024	0,28	51	0,24	50	20,9	0,0
01/07/2024	0,03	6	0,02	5	2,3	0,0
01/08/2024	0,17	31	0,14	30	12,5	0,0
01/09/2024	0,17	30	0,14	30	12,4	0,0
01/10/2024	0,92	139	0,79	138	68,2	0,0
01/11/2024	0,04	7	0,03	6	2,7	3,4
01/12/2024	0,01	2	0,01	2	0,8	36,3
MAX	**1,9**	**329**	**1,6**	**329**	**140**	**99**
MOYEN	**0,6**	**107**	**0,5**	**105**	**45**	**26**
MIN	**0,0**	**2**	**0,0**	**2**	**1**	**0**
TOTAL	**7,4**	**1 279**	**6,3**	**1 264**	**546**	**306**
%Tps Pluie	**58%**					

	PR19 Evesham							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	2,15	119	2,25	119	66,0	4,40	0,00	69,0
01/02/2024	1,92	100	1,85	99	56,5	3,77	0,00	71,6
01/03/2024	173,82	211	51,07	214	3 373,4	185,20	19,85	27,0
01/04/2024	1,78	104	1,78	105	53,4	3,56	0,00	0,0
01/05/2024	88,29	84	76,29	87	2 468,7	15,14	74,72	99,0
01/06/2024	49,97	69	80,34	71	1 954,5	126,00	2,15	0,0
01/07/2024	111,85	33	123,61	36	3 531,9	206,73	14,36	0,0
01/08/2024	1,67	15	65,56	17	1 008,4	67,11	0,06	0,0
01/09/2024	142,40	68	77,11	73	3 292,6	163,46	28,02	0,0
01/10/2024	98,05	139	44,62	144	2 140,1	129,66	6,51	0,0
01/11/2024	31,10	52	31,18	52	934,3	2,51	29,89	3,4
01/12/2024	1,30	58	1,23	60	37,9	2,44	0,04	36,3
MAX	**173,8**	**211**	**123,6**	**214**	**3 532**	**207**	**75**	**99**
MOYEN	**58,7**	**88**	**46,4**	**90**	**1 576**	**76**	**15**	**26**
MIN	**1,3**	**15**	**1,2**	**17**	**38**	**2**	**0**	**0**
TOTAL	**704,3**	**1 052**	**556,9**	**1 077**	**18 918**	**910**	**176**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR21 Métézeaux							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	11,37	532	13,10	530	73,4	24,20	0,13	69,0
01/02/2024	10,14	476	11,04	475	63,5	21,18	0,00	71,6
01/03/2024	11,18	509	17,45	505	85,9	28,36	0,14	27,0
01/04/2024	11,37	529	12,01	530	70,1	23,38	0,00	0,0
01/05/2024	11,67	536	14,23	533	77,7	25,78	0,06	99,0
01/06/2024	12,54	593	24,02	578	109,7	35,49	0,53	0,0
01/07/2024	12,19	594	14,74	593	80,8	26,36	0,29	0,0
01/08/2024	11,35	565	11,53	564	68,6	22,88	0,00	0,0
01/09/2024	1,82	73	2,47	72	12,9	3,66	0,31	0,0
01/10/2024	12,01	712	14,51	706	79,6	26,46	0,03	0,0
01/11/2024	11,60	670	12,45	671	72,1	24,05	0,00	3,4
01/12/2024	12,96	706	12,03	704	75,0	24,82	0,08	36,3
MAX	**13,0**	**712**	**24,0**	**706**	**110**	**35**	**1**	**99**
MOYEN	**10,9**	**541**	**13,3**	**538**	**72**	**24**	**0**	**26**
MIN	**1,8**	**73**	**2,5**	**72**	**13**	**4**	**0**	**0**
TOTAL	**130,2**	**6 495**	**159,6**	**6 461**	**869**	**287**	**2**	**306**
%Tps Pluie	**6%**							

	PR22 Osmeaux							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	16,18	726	14,45	849	459,5	30,56	0,03	69,0
01/02/2024	4,09	161	38,08	1 729	632,5	42,14	0,02	71,6
01/03/2024	6,20	367	90,03	4 439	1 443,4	96,19	0,02	27,0
01/04/2024	0,00	0	17,50	1 129	262,6	17,52	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	16,49	1 002	247,4	16,49	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	8,96	518	134,5	8,97	0,00	0,0
01/07/2024	0,01	3	5,33	309	80,2	5,34	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	59,45	2 185	891,7	59,45	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	61,56	2 733	923,4	61,57	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	12,65	713	189,8	12,65	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	14,11	788	211,6	14,11	0,00	36,3
MAX	**16,2**	**726**	**90,0**	**4 439**	**1 443**	**96**	**0**	**99**
MOYEN	**2,2**	**105**	**28,2**	**1 366**	**456**	**30**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**26,5**	**1 257**	**338,6**	**16 394**	**5 477**	**365**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**28%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR23 Parc des Expos							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,61	31	0,59	30	54,0	1,20	0,00	69,0
01/02/2024	0,60	31	0,60	32	53,9	1,20	0,00	71,6
01/03/2024	0,87	45	0,86	45	77,6	1,73	0,00	27,0
01/04/2024	0,35	18	0,39	19	33,3	0,74	0,00	0,0
01/05/2024	1,82	93	1,91	92	167,5	3,72	0,00	99,0
01/06/2024	5,61	278	5,92	278	518,9	11,52	0,00	0,0
01/07/2024	0,21	11	0,25	12	20,3	0,45	0,00	0,0
01/08/2024	1,91	95	1,99	94	175,2	3,89	0,00	0,0
01/09/2024	0,55	28	0,56	28	49,7	1,10	0,00	0,0
01/10/2024	0,59	32	0,63	32	54,7	1,22	0,00	0,0
01/11/2024	0,79	41	0,80	41	71,3	1,58	0,00	3,4
01/12/2024	0,37	19	0,36	20	32,7	0,73	0,00	36,3
MAX	**5,6**	**278**	**5,9**	**278**	**519**	**12**	**0**	**99**
MOYEN	**1,2**	**60**	**1,2**	**60**	**109**	**2**	**0**	**26**
MIN	**0,2**	**11**	**0,2**	**12**	**20**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**14,3**	**722**	**14,8**	**723**	**1 309**	**29**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

	PR25 Celestin Fresney							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	5,37	531	5,37	531	161,1	0,00	5,37	69,0
01/02/2024	4,92	480	4,92	480	147,5	0,00	4,92	71,6
01/03/2024	5,04	523	5,04	523	151,1	0,00	5,04	27,0
01/04/2024	4,65	530	4,65	530	139,5	0,00	4,65	0,0
01/05/2024	4,79	582	4,79	582	143,6	0,00	4,79	99,0
01/06/2024	4,90	599	4,90	599	146,9	0,00	4,89	0,0
01/07/2024	3,96	536	3,96	536	118,8	0,00	3,96	0,0
01/08/2024	3,71	763	3,71	762	111,3	0,00	3,71	0,0
01/09/2024	4,40	652	4,40	652	131,9	0,00	4,40	0,0
01/10/2024	4,21	558	4,21	558	126,4	0,00	4,21	0,0
01/11/2024	4,32	618	4,32	618	129,7	0,00	4,32	3,4
01/12/2024	4,44	549	4,44	549	133,2	0,00	4,44	36,3
MAX	**5,4**	**763**	**5,4**	**762**	**161**	**0**	**5**	**99**
MOYEN	**4,6**	**577**	**4,6**	**577**	**137**	**0**	**5**	**26**
MIN	**3,7**	**480**	**3,7**	**480**	**111**	**0**	**4**	**0**
TOTAL	**54,7**	**6 921**	**54,7**	**6 920**	**1 641**	**0**	**55**	**306**
%Tps Pluie	**11%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR29 Delescluze							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	60,30	3 036	6,40	334	2 334,6	66,70	0,00	69,0
01/02/2024	81,87	2 399	33,47	491	4 036,9	94,27	21,07	71,6
01/03/2024	33,61	1 470	35,50	1 470	2 418,7	69,11	0,00	27,0
01/04/2024	32,45	1 441	34,10	1 442	2 329,5	66,47	0,09	0,0
01/05/2024	34,07	1 537	36,01	1 537	2 452,8	69,94	0,14	99,0
01/06/2024	35,25	1 608	37,17	1 607	2 534,6	72,42	0,00	0,0
01/07/2024	29,10	1 353	30,61	1 357	2 089,7	59,01	0,69	0,0
01/08/2024	25,75	1 160	26,71	1 160	1 836,2	52,33	0,14	0,0
01/09/2024	32,56	872	34,09	872	2 333,0	66,44	0,22	0,0
01/10/2024	32,30	868	34,02	869	2 321,4	66,33	0,00	0,0
01/11/2024	31,35	853	32,89	853	2 248,3	64,24	0,00	3,4
01/12/2024	33,35	903	34,53	903	2 376,0	67,88	0,00	36,3
MAX	**81,9**	**3 036**	**37,2**	**1 607**	**4 037**	**94**	**21**	**99**
MOYEN	**38,5**	**1 458**	**31,3**	**1 075**	**2 443**	**68**	**2**	**26**
MIN	**25,7**	**853**	**6,4**	**334**	**1 836**	**52**	**0**	**0**
TOTAL	**462,0**	**17 500**	**375,5**	**12 895**	**29 312**	**815**	**22**	**306**
%Tps Pluie	**15%**							

- ECLUZELLES

	PR390 Jean Moulin							
	POMPE 1		POMPE 2		DESODO		Volume débitmètre (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	20,23	466	20,01	466	0,00	0	415	69,0
01/02/2024	19,92	455	19,83	456	0,00	0	400	71,6
01/03/2024	22,25	508	21,64	508	0,00	0	445	27,0
01/04/2024	21,90	501	21,09	499	0,00	0	437	0,0
01/05/2024	22,05	522	21,25	522	0,00	0	449	99,0
01/06/2024	20,27	456	20,02	457	0,00	0	432	0,0
01/07/2024	34,20	396	34,00	395	0,00	0	456	0,0
01/08/2024	35,83	342	35,52	342	0,00	0	437	0,0
01/09/2024	32,33	300	32,05	300	0,00	0	393	0,0
01/10/2024	86,10	426	85,71	426	0,00	0	960	0,0
01/11/2024	37,23	313	36,95	313	0,00	0	435	3,4
01/12/2024	26,85	429	26,35	430	0,00	0	436	36,3
MAX	**86,1**	**522**	**85,7**	**522**	**0,0**	**0**	**960**	**99**
MOYEN	**31,6**	**426**	**31,2**	**426**	**0,0**	**0**	**475**	**26**
MIN	**19,9**	**300**	**19,8**	**300**	**0,0**	**0**	**393**	**0**
TOTAL	**379,1**	**5 114**	**374,4**	**5 114**	**0,0**	**0**	**5 695**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- EZY-SUR-EURE

	PR420 Château											
	POMPE 1		POMPE 2		POMPE 3		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	743,97	0	743,97	0	0,00	0	743,97	0	92 251,8	297,59	595,17	69,0
01/02/2024	695,95	1	695,95	2	0,00	0	695,95	1	86 298,2	278,96	556,47	71,6
01/03/2024	742,87	2	742,95	1	0,00	0	742,86	1	92 120,8	298,40	593,71	27,0
01/04/2024	719,96	1	719,96	1	0,00	0	719,96	1	89 275,5	289,12	575,40	0,0
01/05/2024	736,43	5	736,43	5	0,00	0	743,79	7	91 317,6	295,72	588,57	99,0
01/06/2024	716,99	19	718,50	18	0,00	0	719,72	16	89 000,3	289,41	573,04	0,0
01/07/2024	629,49	980	480,37	588	0,00	0	459,19	1 188	68 811,8	502,54	303,66	0,0
01/08/2024	682,26	3 168	9,24	8	0,00	0	0,00	0	42 873,0	676,77	7,36	0,0
01/09/2024	719,61	16	15,71	19	0,00	0	0,00	0	45 589,5	710,20	12,56	0,0
01/10/2024	743,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	46 125,9	743,97	0,00	0,0
01/11/2024	719,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	44 637,9	719,97	0,00	3,4
01/12/2024	743,97	9	24,00	0	0,00	0	0,00	0	47 613,9	767,97	0,00	36,3
MAX	**744,0**	**3 168**	**744,0**	**588**	**0,0**	**0**	**744,0**	**1 188**	**92 252**	**768**	**595**	**99**
MOYEN	**716,3**	**350**	**407,3**	**54**	**0,0**	**0**	**402,1**	**101**	**69 660**	**489**	**317**	**26**
MIN	**629,5**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**42 873**	**279**	**0**	**0**
TOTAL	**8 595,4**	**4 201**	**4 887,1**	**642**	**0,0**	**0**	**4 825,4**	**1 214**	**835 916**	**5 871**	**3 806**	**306**
%Tps Pluie	16%											

- GARNAY

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR50 Locarchives							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	6,35	107	6,16	107	150,1	12,47	0,02	69,0
01/02/2024	3,86	73	3,93	72	93,4	7,68	0,05	71,6
01/03/2024	2,99	55	3,28	57	75,3	6,20	0,04	27,0
01/04/2024	25,07	148	25,69	154	609,1	22,44	14,16	0,0
01/05/2024	33,08	392	31,51	397	775,1	45,67	9,46	99,0
01/06/2024	19,82	354	19,65	353	473,7	37,83	0,82	0,0
01/07/2024	23,89	207	25,22	207	589,3	26,40	11,36	0,0
01/08/2024	14,39	254	15,00	255	352,6	28,06	0,67	0,0
01/09/2024	24,07	364	26,45	360	606,3	41,48	4,52	0,0
01/10/2024	34,71	368	36,61	367	855,9	45,05	13,14	0,0
01/11/2024	11,51	201	12,30	201	285,7	23,81	0,00	3,4
01/12/2024	11,17	202	11,40	203	270,8	22,56	0,00	36,3
MAX	**34,7**	**392**	**36,6**	**397**	**856**	**46**	**14**	**99**
MOYEN	**17,6**	**227**	**18,1**	**228**	**428**	**27**	**5**	**26**
MIN	**3,0**	**55**	**3,3**	**57**	**75**	**6**	**0**	**0**
TOTAL	**210,9**	**2 725**	**217,2**	**2 733**	**5 137**	**320**	**54**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

	PR51 Garage Renault					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	712,87	53	30,96	53	7 438,3	69,0
01/02/2024	663,85	57	32,48	55	6 963,3	71,6
01/03/2024	699,70	55	35,42	55	7 351,2	27,0
01/04/2024	674,99	54	41,62	57	7 166,1	0,0
01/05/2024	72,37	5	677,54	5	7 499,1	99,0
01/06/2024	209,29	6	512,37	6	7 216,6	0,0
01/07/2024	375,42	24	343,74	24	7 191,6	0,0
01/08/2024	32,71	5	560,58	5	5 932,9	0,0
01/09/2024	108,80	7	612,70	7	7 215,0	0,0
01/10/2024	166,84	155	581,45	156	7 482,8	0,0
01/11/2024	174,00	21	516,42	6	6 904,1	3,4
01/12/2024	650,03	31	0,48	15	6 505,1	36,3
MAX	**712,9**	**155**	**677,5**	**156**	**7 499**	**99**
MOYEN	**378,4**	**39**	**328,8**	**37**	**7 072**	**26**
MIN	**32,7**	**5**	**0,5**	**5**	**5 933**	**0**
TOTAL	**4 540,9**	**473**	**3 945,8**	**444**	**84 866**	**306**
%Tps Pluie	**1%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR52 Chamblean							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	12,84	200	51,73	201	645,7	64,57	0,00	69,0
01/02/2024	19,19	211	41,38	163	605,7	60,57	0,00	71,6
01/03/2024	15,43	253	12,57	201	280,1	28,01	0,00	27,0
01/04/2024	12,99	208	12,92	208	259,1	25,87	0,02	0,0
01/05/2024	13,68	229	13,92	229	276,0	27,60	0,00	99,0
01/06/2024	11,17	193	13,84	237	250,1	25,00	0,00	0,0
01/07/2024	7,89	140	63,18	297	710,7	69,80	0,64	0,0
01/08/2024	10,91	192	10,70	191	216,1	21,61	0,00	0,0
01/09/2024	21,48	362	3,82	80	253,0	25,30	0,00	0,0
01/10/2024	143,97	339	16,16	53	1 601,3	158,91	0,61	0,0
01/11/2024	28,47	398	0,00	0	284,7	28,47	0,00	3,4
01/12/2024	28,49	386	0,00	0	284,9	28,49	0,00	36,3
MAX	**144,0**	**398**	**63,2**	**297**	**1 601**	**159**	**1**	**99**
MOYEN	**27,2**	**259**	**20,0**	**155**	**472**	**47**	**0**	**26**
MIN	**7,9**	**140**	**0,0**	**0**	**216**	**22**	**0**	**0**
TOTAL	**326,5**	**3 111**	**240,2**	**1 860**	**5 667**	**564**	**1**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

	PR53 Rue des Creuses							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	107,19	3 161	378,68	1 580	14 576,2	306,04	89,91	69,0
01/02/2024	164,58	1 594	206,84	799	11 142,7	251,67	59,88	71,6
01/03/2024	114,51	2 018	248,30	1 009	10 884,5	216,37	73,23	27,0
01/04/2024	117,30	2 652	66,03	307	5 499,7	141,09	21,11	0,0
01/05/2024	136,37	20 040	0,00	0	4 091,2	136,37	0,00	99,0
01/06/2024	119,60	18 065	0,00	0	3 588,1	119,57	0,00	0,0
01/07/2024	116,30	8 444	0,00	0	3 488,9	116,32	0,00	0,0
01/08/2024	89,35	4 150	0,00	0	2 680,4	76,62	0,00	0,0
01/09/2024	104,45	4 478	0,00	0	3 133,6	86,36	0,00	0,0
01/10/2024	125,76	14 147	0,00	0	3 772,8	108,25	0,00	0,0
01/11/2024	117,93	10 888	0,00	0	3 538,0	100,53	0,00	3,4
01/12/2024	127,47	7 814	0,00	0	3 824,0	106,89	0,00	36,3
MAX	**164,6**	**20 040**	**378,7**	**1 580**	**14 576**	**306**	**90**	**99**
MOYEN	**120,1**	**8 121**	**75,0**	**308**	**5 852**	**147**	**20**	**26**
MIN	**89,3**	**1 594**	**0,0**	**0**	**2 680**	**77**	**0**	**0**
TOTAL	**1 440,8**	**97 451**	**899,9**	**3 695**	**70 220**	**1 766**	**244**	**306**
%Tps Pluie	**54%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR55 Volhard							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,33	24	0,32	20	11,0	0,65	0,00	69,0
01/02/2024	0,26	16	0,29	17	9,4	0,55	0,00	71,6
01/03/2024	0,25	16	0,23	15	8,1	0,48	0,00	27,0
01/04/2024	0,10	11	0,34	98	7,5	0,43	0,00	0,0
01/05/2024	0,22	14	0,24	14	7,9	0,46	0,00	99,0
01/06/2024	0,22	15	0,22	14	7,5	0,44	0,00	0,0
01/07/2024	0,25	15	0,23	16	8,2	0,48	0,00	0,0
01/08/2024	0,29	17	0,28	17	9,7	0,57	0,00	0,0
01/09/2024	0,22	12	0,20	12	7,2	0,42	0,00	0,0
01/10/2024	0,27	18	0,26	17	9,0	0,53	0,00	0,0
01/11/2024	0,11	7	0,33	22	7,4	0,43	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	0,42	27	7,2	0,42	0,00	36,3
MAX	**0,3**	**24**	**0,4**	**98**	**11**	**1**	**0**	**99**
MOYEN	**0,2**	**14**	**0,3**	**24**	**8**	**0**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,2**	**12**	**7**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**2,5**	**165**	**3,4**	**289**	**100**	**6**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**4%**							

	PR56 Puits Godeaux					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	610,23	72	7,32	64	9 263,2	69,0
01/02/2024	100,91	174	3,23	171	1 562,0	71,6
01/03/2024	0,00	0	16,58	483	248,6	27,0
01/04/2024	0,00	0	10,75	897	161,3	0,0
01/05/2024	0,00	0	10,96	930	164,4	99,0
01/06/2024	0,00	0	11,40	909	171,0	0,0
01/07/2024	0,00	0	11,69	973	175,4	0,0
01/08/2024	0,00	0	10,05	910	150,7	0,0
01/09/2024	0,00	0	11,75	1 233	176,3	0,0
01/10/2024	0,00	0	12,88	1 091	193,2	0,0
01/11/2024	0,00	0	171,21	716	2 568,1	3,4
01/12/2024	0,00	0	658,34	87	9 875,1	36,3
MAX	**610,2**	**174**	**658,3**	**1 233**	**9 875**	**99**
MOYEN	**59,3**	**21**	**78,0**	**705**	**2 059**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**3,2**	**64**	**151**	**0**
TOTAL	**711,1**	**246**	**936,2**	**8 464**	**24 709**	**306**
%Tps Pluie	**96%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR400 Boulevard Henri 4							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	31,50	1 312	39,97	1 307	2 144,0	70,62	0,42	69,0
01/02/2024	64,41	1 211	79,19	1 169	4 308,1	75,30	34,15	71,6
01/03/2024	44,52	1 624	60,08	1 578	3 137,8	97,04	3,78	27,0
01/04/2024	25,66	1 119	31,69	1 116	1 720,7	54,88	1,24	0,0
01/05/2024	31,14	1 261	38,12	1 259	2 077,8	62,59	3,33	99,0
01/06/2024	17,25	754	21,23	755	1 154,5	36,46	1,01	0,0
01/07/2024	15,54	649	18,91	649	1 033,5	32,07	1,19	0,0
01/08/2024	10,63	437	12,32	437	688,5	21,57	0,69	0,0
01/09/2024	17,53	775	21,67	770	1 176,0	37,87	0,66	0,0
01/10/2024	73,67	1 700	170,21	2 053	7 316,4	177,42	33,23	0,0
01/11/2024	63,91	1 524	719,97	0	23 516,2	656,05	63,91	3,4
01/12/2024	74,47	1 783	743,97	0	24 553,2	669,49	74,47	36,3
MAX	**74,5**	**1 783**	**744,0**	**2 053**	**24 553**	**669**	**74**	**99**
MOYEN	**39,2**	**1 179**	**163,1**	**924**	**6 069**	**166**	**18**	**26**
MIN	**10,6**	**437**	**12,3**	**0**	**688**	**22**	**0**	**0**
TOTAL	**470,2**	**14 149**	**1 957,3**	**11 093**	**72 827**	**1 991**	**218**	**306**
%Tps Pluie	**78%**							

	PR401 Moulin					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	1,93	89	0,00	0	19,3	69,0
01/02/2024	2,21	103	0,00	0	22,1	71,6
01/03/2024	2,27	105	0,00	0	22,7	27,0
01/04/2024	7,43	73	0,00	0	74,3	0,0
01/05/2024	1,70	82	0,00	2	17,0	99,0
01/06/2024	1,59	74	0,00	1	15,9	0,0
01/07/2024	1,32	61	0,00	0	13,2	0,0
01/08/2024	1,18	55	0,00	0	11,8	0,0
01/09/2024	1,65	75	0,00	0	16,5	0,0
01/10/2024	43,61	208	0,00	0	436,1	0,0
01/11/2024	1,49	68	0,00	0	14,9	3,4
01/12/2024	1,73	76	0,00	1	17,3	36,3
MAX	**43,6**	**208**	**0,0**	**2**	**436**	**99**
MOYEN	**5,7**	**89**	**0,0**	**0**	**57**	**26**
MIN	**1,2**	**55**	**0,0**	**0**	**12**	**0**
TOTAL	**68,1**	**1 069**	**0,0**	**4**	**681**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR402 Peupliers							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	95,85	913	52,03	912	1 478,8	147,87	0,00	69,0
01/02/2024	102,96	504	33,33	508	1 362,9	133,40	1,44	71,6
01/03/2024	79,29	1 007	291,19	1 007	3 704,9	370,48	0,00	27,0
01/04/2024	58,46	1 218	52,40	1 218	1 108,6	110,86	0,00	0,0
01/05/2024	21,62	596	19,88	597	415,0	41,50	0,00	99,0
01/06/2024	11,38	308	9,78	294	211,7	18,77	1,20	0,0
01/07/2024	8,16	255	7,84	259	160,0	15,50	0,24	0,0
01/08/2024	8,34	245	7,67	240	160,1	15,60	0,21	0,0
01/09/2024	9,62	266	9,10	269	187,2	18,64	0,04	0,0
01/10/2024	173,04	731	266,84	738	4 398,8	371,14	34,37	0,0
01/11/2024	3,91	64	595,28	65	5 991,9	599,08	0,05	3,4
01/12/2024	20,15	676	97,57	675	1 177,2	117,63	0,04	36,3
MAX	**173,0**	**1 218**	**595,3**	**1 218**	**5 992**	**599**	**34**	**99**
MOYEN	**49,4**	**565**	**120,2**	**565**	**1 696**	**163**	**3**	**26**
MIN	**3,9**	**64**	**7,7**	**65**	**160**	**16**	**0**	**0**
TOTAL	**592,8**	**6 783**	**1 442,9**	**6 782**	**20 357**	**1 960**	**38**	**306**
%Tps Pluie	**56%**							

	PR403 Piste cyclable					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	0,00	0	299,31	937	2 993,1	69,0
01/02/2024	0,00	0	482,76	363	4 827,6	71,6
01/03/2024	0,00	7	228,86	1 214	2 288,6	27,0
01/04/2024	0,00	0	563,49	1 038	5 634,9	0,0
01/05/2024	0,00	5	675,38	131	6 753,8	99,0
01/06/2024	0,00	0	467,78	457	4 677,8	0,0
01/07/2024	0,00	1	406,84	564	4 068,4	0,0
01/08/2024	0,00	0	180,38	759	1 803,8	0,0
01/09/2024	0,00	0	121,16	967	1 211,6	0,0
01/10/2024	0,00	0	493,81	483	4 938,1	0,0
01/11/2024	0,00	0	296,08	735	2 960,8	3,4
01/12/2024	0,00	7	353,49	721	3 535,0	36,3
MAX	**0,0**	**7**	**675,4**	**1 214**	**6 754**	**99**
MOYEN	**0,0**	**2**	**380,8**	**697**	**3 808**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**121,2**	**131**	**1 212**	**0**
TOTAL	**0,0**	**20**	**4 569,3**	**8 369**	**45 694**	**306**
%Tps Pluie	**4%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR404 Plaquin					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	9,65	53	10,46	54	201,1	69,0
01/02/2024	14,48	84	14,64	84	291,2	71,6
01/03/2024	40,12	196	39,65	195	797,6	27,0
01/04/2024	21,74	114	21,30	115	430,4	0,0
01/05/2024	22,57	122	21,30	123	438,8	99,0
01/06/2024	22,20	120	20,77	120	429,7	0,0
01/07/2024	22,94	124	21,46	124	444,0	0,0
01/08/2024	22,94	124	21,46	124	444,0	0,0
01/09/2024	22,20	120	20,77	120	429,7	0,0
01/10/2024	22,94	124	21,46	124	444,0	0,0
01/11/2024	22,20	120	20,77	120	429,7	3,4
01/12/2024	22,94	124	21,46	124	444,0	36,3
MAX	**40,1**	**196**	**39,6**	**195**	**798**	**99**
MOYEN	**22,2**	**119**	**21,3**	**119**	**435**	**26**
MIN	**9,7**	**53**	**10,5**	**54**	**201**	**0**
TOTAL	**266,9**	**1 425**	**255,5**	**1 427**	**5 224**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

	PR406 Rue d'Ezy/Cimetière					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	0,00	0	2,19	91	54,6	69,0
01/02/2024	0,00	0	2,58	108	64,5	71,6
01/03/2024	0,00	1	2,49	106	62,2	27,0
01/04/2024	0,00	0	2,64	112	66,1	0,0
01/05/2024	0,03	2	4,06	113	102,2	99,0
01/06/2024	0,00	0	0,00	0	0,0	0,0
01/07/2024	0,00	1	3,34	75	83,4	0,0
01/08/2024	0,00	0	2,43	87	60,6	0,0
01/09/2024	0,00	0	2,93	113	73,4	0,0
01/10/2024	0,00	0	3,47	126	86,7	0,0
01/11/2024	0,00	0	2,83	95	70,7	3,4
01/12/2024	0,00	0	2,65	81	66,3	36,3
MAX	**0,0**	**2**	**4,1**	**126**	**102**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**2,6**	**92**	**66**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**0,0**	**4**	**31,6**	**1 107**	**791**	**306**
%Tps Pluie	**12%**					

- LE BOULLAY-MIVOYE

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR120 Boullay Mivoye								
	COMPRESSEUR 1		COMPRESSEUR 2		VANNE 1		VANNE 2		
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	18,82	236	18,67	233	18,08	341	15,46	246	69,0
01/02/2024	62,97	592	203,21	588	128,84	4 101	118,19	3 715	71,6
01/03/2024	91,85	496	620,12	496	338,68	12 214	333,63	12 028	27,0
01/04/2024	88,88	480	600,12	480	327,75	11 820	322,87	11 640	0,0
01/05/2024	112,92	496	591,96	490	352,94	12 610	312,69	11 152	99,0
01/06/2024	194,24	480	459,32	450	399,06	13 800	218,17	7 260	0,0
01/07/2024	200,72	496	474,63	465	412,36	14 260	225,44	7 502	0,0
01/08/2024	218,94	463	480,07	432	415,70	14 509	229,02	7 755	0,0
01/09/2024	274,92	899	472,19	912	349,15	12 846	269,47	9 890	0,0
01/10/2024	282,34	7 462	320,49	6 940	0,00	0	298,41	12 979	0,0
01/11/2024	352,72	3 773	272,70	3 293	0,00	0	382,49	15 274	3,4
01/12/2024	431,82	2 431	94,82	1 249	80,63	2 699	358,26	12 786	36,3
MAX	**431,8**	**7 462**	**620,1**	**6 940**	**415,7**	**14 509**	**382,5**	**15 274**	**99**
MOYEN	**194,3**	**1 525**	**384,0**	**1 336**	**235,3**	**8 267**	**257,0**	**9 352**	**26**
MIN	**18,8**	**236**	**18,7**	**233**	**0,0**	**0**	**15,5**	**246**	**0**
TOTAL	**2 331,1**	**18 304**	**4 608,3**	**16 028**	**2 823,2**	**99 200**	**3 084,1**	**112 227**	**306**

	PR121 Fonville								
	POMPE 1		POMPE 2		BRASSAGE				
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	147,13	217	130,40	216	3,61	433	793	584	69,0
01/02/2024	148,53	184	135,60	184	2,98	358	555	564	71,6
01/03/2024	176,24	196	145,15	194	3,20	364	299	638	27,0
01/04/2024	142,25	168	129,30	168	2,76	331	0	534	0,0
01/05/2024	147,12	199	130,84	199	3,31	397	0	536	99,0
01/06/2024	121,83	184	110,63	183	3,02	362	0	448	0,0
01/07/2024	111,60	226	102,92	227	3,77	452	0	418	0,0
01/08/2024	104,36	220	88,79	219	3,59	431	0	375	0,0
01/09/2024	117,08	219	104,30	220	3,46	415	0	431	0,0
01/10/2024	114,99	198	126,75	197	1,94	233	374	470	0,0
01/11/2024	192,95	712	26,55	85	0,47	56	649	442	3,4
01/12/2024	298,98	1 991	0,00	0	0,00	0	793	606	36,3
MAX	**299,0**	**1 991**	**145,1**	**227**	**3,8**	**452**	**793**	**638**	**99**
MOYEN	**151,9**	**393**	**102,6**	**174**	**2,7**	**319**	**289**	**504**	**26**
MIN	**104,4**	**168**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**375**	**0**
TOTAL	**1 823,1**	**4 714**	**1 231,2**	**2 092**	**32,1**	**3 832**	**3 463**	**6 046**	**306**
%Tps Pluie	**88%**								

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- LE BOULLAY-THIERRY

	PR110 Minières					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	228,46	937	166,46	938	2 090	69,0
01/02/2024	128,65	1 147	101,49	1 141	1 918	71,6
01/03/2024	127,83	1 527	126,74	1 528	1 624	27,0
01/04/2024	101,88	1 189	85,70	1 189	0	0,0
01/05/2024	270,43	992	180,37	1 240	0	99,0
01/06/2024	394,10	600	169,57	600	0	0,0
01/07/2024	407,24	620	175,22	620	0	0,0
01/08/2024	127,79	1 664	114,79	1 635	0	0,0
01/09/2024	105,02	1 680	107,06	1 650	0	0,0
01/10/2024	95,31	1 506	91,69	1 490	0	0,0
01/11/2024	82,76	1 136	94,11	1 134	521	3,4
01/12/2024	84,97	1 242	94,98	1 242	1 736	36,3
MAX	**407,2**	**1 680**	**180,4**	**1 650**	**2 090**	**99**
MOYEN	**179,5**	**1 187**	**125,7**	**1 201**	**657**	**26**
MIN	**82,8**	**600**	**85,7**	**600**	**0**	**0**
TOTAL	**2 154,4**	**14 240**	**1 508,2**	**14 407**	**7 889**	**306**
%Tps Pluie	**100%**					

	PR111 Bourg						
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Pluviométrie (mm)	EDF (KWh)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	0,00	0	0,00	0	0	69,0	0,0
01/02/2024	165,98	235	0,00	6	2 246	71,6	1 161,4
01/03/2024	468,48	1 077	0,01	7	5 247	27,0	3 011,0
01/04/2024	291,14	2 202	0,00	0	3 724	0,0	1 928,5
01/05/2024	371,65	1 890	0,00	0	5 114	99,0	2 511,0
01/06/2024	0,00	0	0,00	0	0	0,0	4,2
01/07/2024	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0
01/08/2024	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0
01/09/2024	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0
01/10/2024	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0
01/11/2024	0,00	0	0,00	0	0	3,4	0,0
01/12/2024	0,00	0	0,00	0	0	36,3	0,0
MAX	**468,5**	**2 202**	**0,0**	**7**	**5 247**	**99**	
MOYEN	**108,1**	**450**	**0,0**	**1**	**1 361**	**26**	
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAL	**1 297,3**	**5 404**	**0,0**	**13**	**16 331**	**306**	
%Tps Pluie	**70%**						

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- LURAY

	PR60 Ancienne Mairie							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	156,67	711	0,00	0	2 663,3	156,67	0,00	69,0
01/02/2024	102,96	694	0,00	0	1 750,3	102,96	0,00	71,6
01/03/2024	61,05	888	0,00	0	1 037,8	61,04	0,00	27,0
01/04/2024	28,87	445	0,00	0	490,8	28,87	0,00	0,0
01/05/2024	29,63	1 090	0,00	0	503,6	29,63	0,00	99,0
01/06/2024	30,74	1 143	0,00	0	522,6	30,75	0,00	0,0
01/07/2024	27,31	853	0,00	0	464,3	27,31	0,00	0,0
01/08/2024	23,40	655	0,00	0	397,7	23,40	0,00	0,0
01/09/2024	22,38	660	0,00	0	380,4	22,38	0,00	0,0
01/10/2024	23,12	682	0,00	0	393,1	23,12	0,00	0,0
01/11/2024	22,38	660	0,00	0	380,4	22,38	0,00	3,4
01/12/2024	23,12	682	0,00	0	393,1	23,12	0,00	36,3
MAX	**156,7**	**1 143**	**0,0**	**0**	**2 663**	**157**	**0**	**99**
MOYEN	**46,0**	**764**	**0,0**	**0**	**781**	**46**	**0**	**26**
MIN	**22,4**	**445**	**0,0**	**0**	**380**	**22**	**0**	**0**
TOTAL	**551,6**	**9 163**	**0,0**	**0**	**9 377**	**552**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**61%**							

	PR61 Maurice Violette							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	14,73	819	15,48	819	2 024,3	30,23	0,00	69,0
01/02/2024	14,06	768	14,10	768	1 886,6	28,16	0,00	71,6
01/03/2024	14,90	803	14,55	802	1 973,2	29,47	0,00	27,0
01/04/2024	15,15	728	14,79	728	2 006,2	26,98	1,48	0,0
01/05/2024	14,81	778	15,90	778	2 057,0	30,60	0,06	99,0
01/06/2024	15,65	788	15,91	788	2 114,4	29,39	1,08	0,0
01/07/2024	16,14	706	14,28	705	2 038,3	27,40	1,49	0,0
01/08/2024	13,10	658	12,51	658	1 716,4	25,60	0,00	0,0
01/09/2024	15,15	762	16,32	761	2 108,8	30,39	0,54	0,0
01/10/2024	19,17	825	16,83	825	2 412,4	35,07	0,46	0,0
01/11/2024	15,81	835	15,84	834	2 120,9	31,67	0,00	3,4
01/12/2024	17,09	875	16,06	830	2 221,2	33,16	0,00	36,3
MAX	**19,2**	**875**	**16,8**	**834**	**2 412**	**35**	**1**	**99**
MOYEN	**15,5**	**779**	**15,2**	**775**	**2 057**	**30**	**0**	**26**
MIN	**13,1**	**658**	**12,5**	**658**	**1 716**	**26**	**0**	**0**
TOTAL	**185,8**	**9 345**	**182,6**	**9 296**	**24 680**	**358**	**5**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR62 Gas Bernier							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	17,02	111	0,00	0	340,5	17,02	0,00	69,0
01/02/2024	15,10	93	0,00	0	302,0	15,10	0,00	71,6
01/03/2024	16,08	97	0,00	0	321,7	16,08	0,00	27,0
01/04/2024	15,60	91	0,00	0	312,0	15,60	0,00	0,0
01/05/2024	16,10	96	0,09	14	323,9	16,20	0,00	99,0
01/06/2024	16,12	106	0,00	0	322,3	16,12	0,00	0,0
01/07/2024	15,45	101	0,01	4	309,1	15,45	0,00	0,0
01/08/2024	13,61	91	0,00	0	272,2	13,61	0,00	0,0
01/09/2024	16,43	104	0,00	0	328,6	16,43	0,00	0,0
01/10/2024	18,05	112	0,00	0	361,0	18,05	0,00	0,0
01/11/2024	18,60	114	0,00	2	372,1	18,60	0,00	3,4
01/12/2024	21,33	121	0,00	0	426,6	21,33	0,00	36,3
MAX	**21,3**	**121**	**0,1**	**14**	**427**	**21**	**0**	**99**
MOYEN	**16,6**	**103**	**0,0**	**2**	**333**	**17**	**0**	**26**
MIN	**13,6**	**91**	**0,0**	**0**	**272**	**14**	**0**	**0**
TOTAL	**199,5**	**1 237**	**0,1**	**20**	**3 992**	**200**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**9%**							

- MARVILLE-MOUTIERS-BRULE

	PR130 Bourg								
	POMPE 1		POMPE 2		BRASSAGE		Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	144,23	1 082	0,00	0	9,02	1 082	4 419	2 689	69,0
01/02/2024	261,89	1 040	0,00	0	8,54	1 025	4 100	4 783	71,6
01/03/2024	421,62	1 541	0,00	0	12,78	1 534	3 911	7 497	27,0
01/04/2024	332,13	1 836	0,00	0	15,26	1 831	0	5 945	0,0
01/05/2024	397,80	1 801	0,00	0	14,99	1 799	0	7 079	99,0
01/06/2024	187,97	1 778	0,00	0	14,79	1 775	0	3 477	0,0
01/07/2024	170,28	1 090	0,00	0	9,07	1 089	0	3 074	0,0
01/08/2024	349,38	771	0,00	0	6,35	762	0	6 191	0,0
01/09/2024	419,40	751	8,57	74	6,20	744	0	7 396	0,0
01/10/2024	0,00	0	538,46	2 463	0,00	0	4 877	9 222	0,0
01/11/2024	0,00	0	464,49	3 678	0,00	0	9 449	7 922	3,4
01/12/2024	0,00	0	460,87	3 721	0,00	0	10 134	7 772	36,3
MAX	**421,6**	**1 836**	**538,5**	**3 721**	**15,3**	**1 831**	**10 134**	**9 222**	**99**
MOYEN	**223,7**	**974**	**122,7**	**828**	**8,1**	**970**	**3 074**	**6 087**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**2 689**	**0**
TOTAL	**2 684,7**	**11 690**	**1 472,4**	**9 936**	**97,0**	**11 641**	**36 890**	**73 046**	**306**
%Tps Pluie	**85%**								

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR131 Imbermais								
	POMPE 1		POMPE 2		BRASSAGE		Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	44,11	321	128,07	621	10,42	939	931	383	69,0
01/02/2024	0,00	0	182,10	830	9,18	826	662	357	71,6
01/03/2024	0,00	0	206,83	838	9,31	838	354	409	27,0
01/04/2024	0,00	0	226,71	785	8,71	784	0	435	0,0
01/05/2024	0,00	0	277,78	706	7,85	706	0	524	99,0
01/06/2024	0,00	0	328,21	535	5,94	535	0	604	0,0
01/07/2024	0,21	3	488,18	557	3,43	309	0	846	0,0
01/08/2024	0,00	0	362,25	2 026	19,58	1 762	0	671	0,0
01/09/2024	0,00	0	188,37	2 766	30,69	2 762	0	427	0,0
01/10/2024	0,00	0	271,15	2 495	27,38	2 464	456	613	0,0
01/11/2024	38,49	857	305,40	1 105	20,23	1 821	941	751	3,4
01/12/2024	71,17	1 701	85,11	1 700	37,78	3 401	1 025	367	36,3
MAX	**71,2**	**1 701**	**488,2**	**2 766**	**37,8**	**3 401**	**1 025**	**846**	**99**
MOYEN	**12,8**	**240**	**254,2**	**1 247**	**15,9**	**1 429**	**364**	**532**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**85,1**	**535**	**3,4**	**309**	**0**	**357**	**0**
TOTAL	**154,0**	**2 882**	**3 050,2**	**14 964**	**190,5**	**17 147**	**4 369**	**6 386**	**306**
%Tps Pluie	**88%**								

	PR132 Vovette						
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	84,33	4 107	1,77	37	128	211	69,0
01/02/2024	160,26	2 923	9,85	68	88	311	71,6
01/03/2024	68,08	266	71,01	266	48	273	27,0
01/04/2024	34,39	295	35,77	295	0	153	0,0
01/05/2024	37,55	278	48,31	277	0	172	99,0
01/06/2024	22,43	344	14,95	344	0	91	0,0
01/07/2024	16,89	264	15,93	262	0	83	0,0
01/08/2024	55,82	160	38,84	160	0	1	0,0
01/09/2024	72,16	159	55,09	158	0	0	0,0
01/10/2024	156,17	88	66,79	85	32	0	0,0
01/11/2024	87,66	123	91,16	124	104	0	3,4
01/12/2024	90,00	148	80,58	149	133	0	36,3
MAX	**160,3**	**4 107**	**91,2**	**344**	**133**	**311**	**99**
MOYEN	**73,8**	**763**	**44,2**	**185**	**44**	**108**	**26**
MIN	**16,9**	**88**	**1,8**	**37**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**885,7**	**9 155**	**530,0**	**2 225**	**533**	**1 295**	**306**
%Tps Pluie	**94%**						

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR133 Blainville								
	POMPE 1		POMPE 2		BRASSAGE		Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage			
01/01/2024	231,96	3 245	0,00	0	27,05	3 245	12 249	2 540	69,0
01/02/2024	247,15	1 935	0,34	27	15,76	1 883	6 976	2 468	71,6
01/03/2024	376,99	1 524	0,00	0	12,44	1 492	5 004	3 612	27,0
01/04/2024	259,79	1 611	0,00	0	13,35	1 601	0	2 433	0,0
01/05/2024	267,97	2 138	0,00	0	17,83	2 138	0	2 519	99,0
01/06/2024	214,84	2 152	0,00	0	17,92	2 149	0	2 057	0,0
01/07/2024	216,28	2 402	0,00	0	20,02	2 401	0	2 050	0,0
01/08/2024	235,78	1 944	0,00	0	16,09	1 930	0	2 175	0,0
01/09/2024	272,94	1 679	0,00	0	13,57	1 627	0	2 490	0,0
01/10/2024	402,41	1 311	0,00	0	7,03	843	6 014	3 624	0,0
01/11/2024	335,81	1 427	0,00	0	10,31	1 236	10 678	3 067	3,4
01/12/2024	348,76	935	0,00	0	1,05	126	11 497	3 201	36,3
MAX	**402,4**	**3 245**	**0,3**	**27**	**27,1**	**3 245**	**12 249**	**3 624**	**99**
MOYEN	**284,2**	**1 859**	**0,0**	**2**	**14,4**	**1 723**	**4 368**	**2 686**	**26**
MIN	**214,8**	**935**	**0,0**	**0**	**1,1**	**126**	**0**	**2 050**	**0**
TOTAL	**3 410,7**	**22 303**	**0,3**	**27**	**172,4**	**20 671**	**52 418**	**32 236**	**306**
%Tps Pluie	**87%**								

- MEZIERES-EN-DROUAIS

	PR380 Grande Rue							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	24,78	603	25,45	602	904,3	50,24	0,00	69,0
01/02/2024	19,92	503	20,34	504	724,8	40,27	0,00	71,6
01/03/2024	23,25	580	23,91	580	848,8	47,16	0,00	27,0
01/04/2024	21,55	550	22,18	549	787,3	43,74	0,00	0,0
01/05/2024	18,27	484	18,79	485	667,2	37,07	0,00	99,0
01/06/2024	16,13	441	17,30	440	601,7	33,43	0,00	0,0
01/07/2024	15,92	441	17,01	442	592,8	32,93	0,00	0,0
01/08/2024	14,22	389	15,18	388	529,1	29,39	0,00	0,0
01/09/2024	15,26	399	16,31	399	568,3	31,57	0,00	0,0
01/10/2024	46,83	891	48,22	891	1 711,0	95,05	0,00	0,0
01/11/2024	32,96	794	34,05	794	1 206,3	67,02	0,00	3,4
01/12/2024	32,23	777	33,41	778	1 181,5	65,64	0,00	36,3
MAX	**46,8**	**891**	**48,2**	**891**	**1 711**	**95**	**0**	**99**
MOYEN	**23,4**	**571**	**24,3**	**571**	**860**	**48**	**0**	**26**
MIN	**14,2**	**389**	**15,2**	**388**	**529**	**29**	**0**	**0**
TOTAL	**281,3**	**6 852**	**292,2**	**6 852**	**10 323**	**573**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**13%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR381 Etangs							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	2,22	57	2,10	57	77,7	4,32	0,00	69,0
01/02/2024	2,03	51	1,97	52	71,9	3,99	0,00	71,6
01/03/2024	1,92	50	1,76	48	66,3	3,68	0,00	27,0
01/04/2024	1,63	44	1,56	44	57,5	3,19	0,00	0,0
01/05/2024	2,40	66	2,29	65	84,4	4,69	0,00	99,0
01/06/2024	1,99	55	1,84	55	68,9	3,83	0,00	0,0
01/07/2024	1,81	50	1,71	50	63,4	3,52	0,00	0,0
01/08/2024	1,56	43	1,50	43	55,0	3,06	0,00	0,0
01/09/2024	1,46	40	1,43	41	52,1	2,89	0,00	0,0
01/10/2024	1,74	48	1,60	46	60,2	3,34	0,00	0,0
01/11/2024	1,63	45	1,59	46	58,1	3,22	0,00	3,4
01/12/2024	1,68	45	1,56	44	58,3	3,24	0,00	36,3
MAX	**2,4**	**66**	**2,3**	**65**	**84**	**5**	**0**	**99**
MOYEN	**1,8**	**50**	**1,7**	**49**	**64**	**4**	**0**	**26**
MIN	**1,5**	**40**	**1,4**	**41**	**52**	**3**	**0**	**0**
TOTAL	**22,1**	**594**	**20,9**	**591**	**774**	**43**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**14%**							

	PR382 Marsauceux							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	14,17	540	15,58	538	446,3	28,93	0,41	69,0
01/02/2024	13,50	497	14,47	503	419,6	26,94	0,52	71,6
01/03/2024	15,05	568	16,31	557	470,5	31,36	0,00	27,0
01/04/2024	14,13	530	14,66	517	431,7	28,51	0,13	0,0
01/05/2024	14,04	564	15,14	551	437,6	29,18	0,00	99,0
01/06/2024	15,53	572	15,44	584	464,5	30,97	0,00	0,0
01/07/2024	14,99	571	15,52	575	457,6	30,51	0,00	0,0
01/08/2024	10,97	448	11,68	462	339,7	22,65	0,00	0,0
01/09/2024	14,28	551	14,36	550	429,5	28,63	0,00	0,0
01/10/2024	15,19	584	15,48	588	460,1	30,67	0,00	0,0
01/11/2024	14,45	545	14,86	541	439,6	29,31	0,00	3,4
01/12/2024	15,67	546	16,62	555	484,4	32,03	0,13	36,3
MAX	**15,7**	**584**	**16,6**	**588**	**484**	**32**	**1**	**99**
MOYEN	**14,3**	**543**	**15,0**	**543**	**440**	**29**	**0**	**26**
MIN	**11,0**	**448**	**11,7**	**462**	**340**	**23**	**0**	**0**
TOTAL	**172,0**	**6 516**	**180,1**	**6 521**	**5 281**	**350**	**1**	**306**
%Tps Pluie	**4%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- SAINTE-GEMME-MORONVAL

	PR370 Route de Chérisy							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	458,68	896	0,02	13	8 256,5	458,67	0,01	69,0
01/02/2024	405,43	811	0,00	0	7 297,8	405,43	0,00	71,6
01/03/2024	569,91	2 500	0,00	0	10 258,4	569,91	0,00	27,0
01/04/2024	420,69	2 684	0,00	0	7 572,5	420,69	0,00	0,0
01/05/2024	376,31	5 455	0,00	0	6 773,6	376,31	0,00	99,0
01/06/2024	337,78	6 210	0,00	0	6 080,0	337,78	0,00	0,0
01/07/2024	329,41	6 484	0,00	0	5 929,3	329,41	0,00	0,0
01/08/2024	303,23	7 146	0,00	0	5 458,2	303,23	0,00	0,0
01/09/2024	342,11	6 410	0,00	0	6 158,0	342,11	0,00	0,0
01/10/2024	610,31	2 570	0,00	0	10 985,6	610,31	0,00	0,0
01/11/2024	442,13	5 442	0,00	0	7 958,4	442,13	0,00	3,4
01/12/2024	493,08	5 679	0,00	0	8 875,4	493,08	0,00	36,3
MAX	**610,3**	**7 146**	**0,0**	**13**	**10 986**	**610**	**0**	**99**
MOYEN	**424,1**	**4 357**	**0,0**	**1**	**7 634**	**424**	**0**	**26**
MIN	**303,2**	**811**	**0,0**	**0**	**5 458**	**303**	**0**	**0**
TOTAL	**5 089,1**	**52 287**	**0,0**	**13**	**91 604**	**5 089**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**15%**							

	PR371 Christian Valensi							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,04	10	72,41	2 855	1 304,2	72,44	0,01	69,0
01/02/2024	0,00	0	70,75	2 796	1 273,5	70,75	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	82,71	3 148	1 488,8	82,71	0,00	27,0
01/04/2024	0,00	0	69,84	2 783	1 257,1	69,84	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	71,82	2 931	1 292,7	71,82	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	70,97	2 872	1 277,4	70,97	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	71,12	2 881	1 280,1	71,12	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	65,89	3 239	1 186,0	65,89	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	68,88	3 492	1 239,9	68,88	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	143,71	4 837	2 586,8	143,71	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	76,96	3 854	1 385,3	76,96	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	81,32	4 032	1 463,7	81,32	0,00	36,3
MAX	**0,0**	**10**	**143,7**	**4 837**	**2 587**	**144**	**0**	**99**
MOYEN	**0,0**	**1**	**78,9**	**3 310**	**1 420**	**79**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**65,9**	**2 783**	**1 186**	**66**	**0**	**0**
TOTAL	**0,0**	**10**	**946,4**	**39 720**	**17 036**	**946**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR40 Ecluzelles					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	0,00	0	147,58	2 790	1 918,5	69,0
01/02/2024	25,88	7	158,01	1 936	2 390,6	71,6
01/03/2024	193,53	0	372,03	2 049	7 352,3	27,0
01/04/2024	0,36	1	141,10	2 494	1 838,9	0,0
01/05/2024	0,00	0	97,57	1 984	1 268,4	99,0
01/06/2024	43,29	932	28,63	632	934,9	0,0
01/07/2024	60,59	1 325	0,00	0	787,7	0,0
01/08/2024	53,55	1 190	0,00	0	696,1	0,0
01/09/2024	65,33	1 444	0,00	0	849,3	0,0
01/10/2024	535,54	672	4,48	6	7 020,3	0,0
01/11/2024	717,14	8	0,00	0	9 322,8	3,4
01/12/2024	265,16	2 054	0,00	0	3 447,0	36,3
MAX	**717,1**	**2 054**	**372,0**	**2 790**	**9 323**	**99**
MOYEN	**163,4**	**636**	**79,1**	**991**	**3 152**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**696**	**0**
TOTAL	**1 960,4**	**7 633**	**949,4**	**11 891**	**37 827**	**306**
%Tps Pluie	**53%**					

	PR41 Vallon							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	28,26	1 038	28,46	1 035	1 077,7	56,71	0,00	69,0
01/02/2024	29,38	936	29,25	936	1 113,9	58,62	0,00	71,6
01/03/2024	150,94	1 476	131,23	1 578	5 361,3	213,22	34,47	27,0
01/04/2024	18,58	733	18,53	733	705,1	37,11	0,00	0,0
01/05/2024	10,20	438	10,41	438	391,5	20,61	0,00	99,0
01/06/2024	7,63	343	7,67	343	290,7	15,30	0,00	0,0
01/07/2024	8,63	335	9,12	335	337,1	17,74	0,00	0,0
01/08/2024	6,18	290	6,23	289	235,8	12,41	0,00	0,0
01/09/2024	6,64	307	6,75	306	254,4	13,39	0,00	0,0
01/10/2024	285,37	1 410	264,29	1 420	10 443,5	151,78	198,94	0,0
01/11/2024	18,07	788	18,06	788	686,6	36,14	0,00	3,4
01/12/2024	23,91	1 090	24,74	1 089	924,3	48,65	0,00	36,3
MAX	**285,4**	**1 476**	**264,3**	**1 578**	**10 443**	**213**	**199**	**99**
MOYEN	**49,5**	**765**	**46,2**	**774**	**1 818**	**57**	**19**	**26**
MIN	**6,2**	**290**	**6,2**	**289**	**236**	**12**	**0**	**0**
TOTAL	**593,8**	**9 184**	**554,7**	**9 290**	**21 822**	**682**	**233**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- SAULNIERES

	PR180 Bretonnières							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	94,20	2 536	0,00	0	1 130	94,20	0,00	69,0
01/02/2024	86,09	2 298	0,00	0	1 033	86,09	0,00	71,6
01/03/2024	81,44	1 919	0,00	0	977	81,44	0,00	27,0
01/04/2024	78,21	256	0,00	0	939	78,21	0,00	0,0
01/05/2024	80,04	274	0,00	0	960	80,04	0,00	99,0
01/06/2024	66,27	258	0,00	0	795	66,27	0,00	0,0
01/07/2024	68,36	273	0,00	0	820	68,36	0,00	0,0
01/08/2024	58,48	253	0,00	0	702	58,48	0,00	0,0
01/09/2024	64,40	275	0,00	0	773	64,40	0,00	0,0
01/10/2024	84,60	350	0,00	0	1 015	84,60	0,00	0,0
01/11/2024	79,17	676	0,00	0	950	79,17	0,00	3,4
01/12/2024	86,19	709	0,00	0	1 034	86,19	0,00	36,3
MAX	**94,2**	**2 536**	**0,0**	**0**	**1 130**	**94**	**0**	**99**
MOYEN	**77,3**	**840**	**0,0**	**0**	**927**	**77**	**0**	**26**
MIN	**58,5**	**253**	**0,0**	**0**	**702**	**58**	**0**	**0**
TOTAL	**927,4**	**10 077**	**0,0**	**0**	**11 129**	**927**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**17%**							

	PR181 Saulnières							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	133,65	1 451	1 297	133,65	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	121,93	1 417	952	121,93	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	105,85	1 317	457	105,85	0,00	27,0
01/04/2024	0,00	0	117,46	1 240	0	117,46	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	122,63	1 039	0	122,63	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	110,18	1 342	0	110,18	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	102,28	1 423	0	102,28	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	87,78	1 451	0	87,78	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	99,99	1 624	0	99,99	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	114,15	1 658	596	114,15	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	115,27	2 196	1 036	115,27	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	177,78	1 321	1 160	177,78	0,00	36,3
MAX	**0,0**	**0**	**177,8**	**2 196**	**1 297**	**178**	**0**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**117,4**	**1 457**	**458**	**117**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**87,8**	**1 039**	**0**	**88**	**0**	**0**
TOTAL	**0,0**	**0**	**1 408,9**	**17 479**	**5 498**	**1 409**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**88%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR182 Impasse de la Butte					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	3,87	61	2,26	62	80,8	69,0
01/02/2024	3,52	54	1,91	54	71,7	71,6
01/03/2024	3,96	61	2,02	59	78,9	27,0
01/04/2024	5,38	60	2,06	60	98,3	0,0
01/05/2024	4,71	65	2,19	64	91,0	99,0
01/06/2024	5,80	198	2,13	198	104,6	0,0
01/07/2024	2,90	99	1,87	93	63,0	0,0
01/08/2024	2,54	-5 463	1,99	72	59,8	0,0
01/09/2024	2,45	2	1,99	69	58,6	0,0
01/10/2024	2,43	2	2,00	71	58,6	0,0
01/11/2024	2,28	2	1,68	57	52,2	3,4
01/12/2024	2,72	3	1,98	66	62,0	36,3
MAX	**5,8**	**198**	**2,3**	**198**	**105**	**99**
MOYEN	**3,5**	**-405**	**2,0**	**77**	**73**	**26**
MIN	**2,3**	**-5 463**	**1,7**	**54**	**52**	**0**
TOTAL	**42,6**	**-4 855**	**24,1**	**925**	**879**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

	PR183 Marronnières					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	2,76	794	2,71	794	62,8	69,0
01/02/2024	2,56	745	2,51	745	58,2	71,6
01/03/2024	2,93	891	2,88	889	66,8	27,0
01/04/2024	2,58	724	2,51	723	58,5	0,0
01/05/2024	2,91	834	2,87	835	66,5	99,0
01/06/2024	2,42	716	2,41	716	55,6	0,0
01/07/2024	2,58	770	2,56	766	59,1	0,0
01/08/2024	2,29	-67 214	2,21	626	51,7	0,0
01/09/2024	2,28	2	2,24	593	51,9	0,0
01/10/2024	2,44	2	2,38	604	55,4	0,0
01/11/2024	2,29	2	2,26	558	52,3	3,4
01/12/2024	2,62	3	2,55	621	59,5	36,3
MAX	**2,9**	**891**	**2,9**	**889**	**67**	**99**
MOYEN	**2,6**	**-5 144**	**2,5**	**706**	**58**	**26**
MIN	**2,3**	**-67 214**	**2,2**	**558**	**52**	**0**
TOTAL	**30,6**	**-61 731**	**30,1**	**8 470**	**698**	**306**
%Tps Pluie	**9%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR184 Mairie 1							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	2	4,55	154	136,1	4,56	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	4,35	146	130,2	4,36	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	1	5,20	168	155,7	5,22	0,00	27,0
01/04/2024	0,00	0	4,88	157	146,0	4,89	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	5,11	164	152,9	5,12	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	5,06	159	151,6	5,08	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	5,02	168	150,2	5,04	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	4,98	172	148,8	4,99	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	4,68	161	139,9	4,69	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	5,35	178	159,9	5,36	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	5,08	169	151,9	5,09	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	10,53	221	315,5	10,55	0,00	36,3
MAX	**0,0**	**2**	**10,5**	**221**	**315**	**11**	**0**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**5,4**	**168**	**162**	**5**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**4,3**	**146**	**130**	**4**	**0**	**0**
TOTAL	**0,0**	**3**	**64,8**	**2 017**	**1 938**	**65**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**14%**							

	PR185 Mairie 2							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	10,06	126	7,62	201	527,5	17,63	0,00	69,0
01/02/2024	9,82	124	7,11	187	505,4	16,91	0,00	71,6
01/03/2024	10,25	131	7,33	191	524,8	17,56	0,00	27,0
01/04/2024	9,79	135	6,78	172	493,4	16,51	0,03	0,0
01/05/2024	10,23	138	8,12	203	547,3	18,32	0,00	99,0
01/06/2024	10,26	133	8,71	216	565,1	18,91	0,00	0,0
01/07/2024	10,51	132	7,71	201	543,7	18,20	0,00	0,0
01/08/2024	7,86	96	5,63	158	402,1	13,46	0,00	0,0
01/09/2024	9,24	112	8,38	209	524,9	17,55	0,00	0,0
01/10/2024	10,53	128	8,98	223	581,1	19,44	0,00	0,0
01/11/2024	10,39	131	8,64	217	567,3	18,98	0,00	3,4
01/12/2024	11,18	139	9,09	239	604,3	20,21	0,00	36,3
MAX	**11,2**	**139**	**9,1**	**239**	**604**	**20**	**0**	**99**
MOYEN	**10,0**	**127**	**7,8**	**201**	**532**	**18**	**0**	**26**
MIN	**7,9**	**96**	**5,6**	**158**	**402**	**13**	**0**	**0**
TOTAL	**120,1**	**1 525**	**94,1**	**2 417**	**6 387**	**214**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**5%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR186 Sablonnière							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	36,16	473	46,23	713	2 447,6	66,16	0,00	69,0
01/02/2024	32,98	404	43,66	669	2 277,7	61,53	0,00	71,6
01/03/2024	33,99	415	44,80	701	2 342,3	63,23	0,00	27,0
01/04/2024	41,29	493	48,80	742	2 667,1	72,05	0,09	0,0
01/05/2024	45,59	541	53,01	799	2 923,9	79,00	0,00	99,0
01/06/2024	86,68	1 025	88,36	1 233	5 177,9	139,91	0,00	0,0
01/07/2024	46,56	552	79,22	1 040	3 715,0	100,23	0,32	0,0
01/08/2024	0,00	0	40,83	578	1 224,0	32,99	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	47,02	636	1 410,4	37,98	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	55,13	716	1 653,9	44,53	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	55,10	701	1 652,9	44,50	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	62,46	772	1 874,3	50,42	0,00	36,3
MAX	**86,7**	**1 025**	**88,4**	**1 233**	**5 178**	**140**	**0**	**99**
MOYEN	**26,9**	**325**	**55,4**	**775**	**2 447**	**66**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**40,8**	**578**	**1 224**	**33**	**0**	**0**
TOTAL	**323,2**	**3 903**	**664,6**	**9 300**	**29 367**	**793**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**0%**							

	PR187 Mare Plate							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	5,10	98	5,19	97	308,3	10,31	0,00	69,0
01/02/2024	3,88	73	4,05	73	237,5	7,94	0,00	71,6
01/03/2024	3,75	66	3,85	67	227,7	7,61	0,00	27,0
01/04/2024	3,02	47	2,94	49	178,5	5,96	0,00	0,0
01/05/2024	3,77	63	3,67	61	222,8	7,45	0,00	99,0
01/06/2024	3,62	69	3,75	69	220,6	7,38	0,00	0,0
01/07/2024	4,29	79	4,27	80	256,4	8,57	0,00	0,0
01/08/2024	3,51	65	3,54	65	211,1	7,06	0,00	0,0
01/09/2024	4,46	77	4,37	76	264,7	8,85	0,00	0,0
01/10/2024	5,46	93	5,48	94	327,8	10,96	0,00	0,0
01/11/2024	5,62	98	5,63	98	337,1	11,27	0,00	3,4
01/12/2024	5,51	91	5,53	91	330,8	11,06	0,00	36,3
MAX	**5,6**	**98**	**5,6**	**98**	**337**	**11**	**0**	**99**
MOYEN	**4,3**	**77**	**4,4**	**77**	**260**	**9**	**0**	**26**
MIN	**3,0**	**47**	**2,9**	**49**	**178**	**6**	**0**	**0**
TOTAL	**52,0**	**919**	**52,3**	**920**	**3 123**	**104**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**12%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- THIMERT-GATELLES

	PR435 Thimert-Gatelles					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	531,46	811	33,66	809	10 172,1	69,0
01/02/2024	45,13	1 557	218,87	1 557	4 752,1	71,6
01/03/2024	0,36	8	743,55	7	13 390,3	27,0
01/04/2024	104,20	163	385,54	159	8 815,2	0,0
01/05/2024	213,70	838	68,47	839	5 079,0	99,0
01/06/2024	174,97	870	66,02	870	4 337,7	0,0
01/07/2024	180,80	899	68,22	899	4 482,3	0,0
01/08/2024	99,96	752	22,01	290	2 195,4	0,0
01/09/2024	59,48	660	0,00	0	1 070,7	0,0
01/10/2024	61,47	682	0,00	0	1 106,4	0,0
01/11/2024	136,82	1 069	0,00	0	2 462,8	3,4
01/12/2024	146,71	1 896	0,02	12	2 641,0	36,3
MAX	**531,5**	**1 896**	**743,6**	**1 557**	**13 390**	**99**
MOYEN	**146,3**	**850**	**133,9**	**454**	**5 042**	**26**
MIN	**0,4**	**8**	**0,0**	**0**	**1 071**	**0**
TOTAL	**1 755,0**	**10 205**	**1 606,3**	**5 442**	**60 505**	**306**
%Tps Pluie	**43%**					

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- TREON

	PR80 Maison médicale							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	5,98	202	101,6	5,97	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	5,43	185	92,3	5,43	0,00	71,6
01/03/2024	0,00	0	5,72	196	97,3	5,72	0,00	27,0
01/04/2024	0,00	0	5,66	195	96,1	5,65	0,00	0,0
01/05/2024	0,00	0	6,38	211	108,4	6,38	0,00	99,0
01/06/2024	0,00	0	5,25	183	89,3	5,25	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	6,31	225	107,2	6,30	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	5,74	204	97,6	5,74	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	6,01	211	102,2	6,01	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	6,18	216	105,1	6,18	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	6,13	208	104,2	6,13	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	7,34	235	124,7	7,34	0,00	36,3
MAX	**0,0**	**0**	**7,3**	**235**	**125**	**7**	**0**	**99**
MOYEN	**0,0**	**0**	**6,0**	**206**	**102**	**6**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**5,3**	**183**	**89**	**5**	**0**	**0**
TOTAL	**0,0**	**0**	**72,1**	**2 471**	**1 226**	**72**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**5%**							

	PR81 JM Hérault							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	32,56	829	73,34	828	1 384,2	105,90	0,00	69,0
01/02/2024	27,17	689	62,58	691	1 162,0	88,04	0,86	71,6
01/03/2024	32,13	832	73,18	831	1 368,7	104,11	0,60	27,0
01/04/2024	50,57	1 481	77,13	1 442	1 301,2	72,14	27,78	0,0
01/05/2024	59,89	1 953	80,78	1 922	1 288,9	57,86	41,41	99,0
01/06/2024	57,95	1 890	78,18	1 860	1 247,3	55,99	40,07	0,0
01/07/2024	59,89	1 953	80,78	1 922	1 288,9	57,86	41,41	0,0
01/08/2024	59,89	1 953	80,78	1 922	1 288,9	57,86	41,41	0,0
01/09/2024	57,95	1 890	78,18	1 860	1 247,3	55,99	40,07	0,0
01/10/2024	59,89	1 953	80,78	1 922	1 288,9	57,86	41,41	0,0
01/11/2024	57,95	1 890	78,18	1 860	1 247,3	55,99	40,07	3,4
01/12/2024	59,89	1 953	80,78	1 922	1 288,9	57,86	41,41	36,3
MAX	**59,9**	**1 953**	**80,8**	**1 922**	**1 384**	**106**	**41**	**99**
MOYEN	**51,3**	**1 606**	**77,1**	**1 582**	**1 284**	**69**	**30**	**26**
MIN	**27,2**	**689**	**62,6**	**691**	**1 162**	**56**	**0**	**0**
TOTAL	**615,7**	**19 266**	**924,7**	**18 982**	**15 403**	**827**	**356**	**306**
%Tps Pluie	**1%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR82 Grande Croix							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	21,25	2 037	20,21	1 850	787,7	16,28	12,59	69,0
01/02/2024	16,80	1 615	15,81	1 436	619,7	14,91	8,85	71,6
01/03/2024	19,03	1 819	18,14	1 623	706,2	15,60	10,78	27,0
01/04/2024	16,10	1 480	16,50	1 330	619,5	21,63	5,49	0,0
01/05/2024	14,74	1 211	15,09	1 165	566,7	22,09	3,87	99,0
01/06/2024	8,29	1 026	9,55	1 017	338,9	17,65	0,09	0,0
01/07/2024	6,68	781	7,54	762	270,3	13,73	0,25	0,0
01/08/2024	5,06	676	5,82	672	206,9	10,81	0,04	0,0
01/09/2024	6,68	746	6,74	681	254,9	10,98	1,22	0,0
01/10/2024	10,83	1 089	10,25	942	400,5	6,42	7,32	0,0
01/11/2024	17,86	1 576	16,69	1 438	656,4	4,25	15,15	3,4
01/12/2024	20,76	1 971	20,06	1 906	775,7	1,18	19,83	36,3
MAX	**21,3**	**2 037**	**20,2**	**1 906**	**788**	**22**	**20**	**99**
MOYEN	**13,7**	**1 336**	**13,5**	**1 235**	**517**	**13**	**7**	**26**
MIN	**5,1**	**676**	**5,8**	**672**	**207**	**1**	**0**	**0**
TOTAL	**164,1**	**16 027**	**162,4**	**14 822**	**6 203**	**156**	**85**	**306**
%Tps Pluie	**49%**							

	PR83 Val de Blaise							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	34,90	7 770	0,00	0	383,9	34,88	0,00	69,0
01/02/2024	32,30	7 086	0,00	0	355,3	32,29	0,00	71,6
01/03/2024	20,03	4 795	0,17	41	222,2	20,13	0,04	27,0
01/04/2024	0,00	0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	0,0
01/05/2024	0,01	25	92,18	200	1 014,1	91,81	0,01	99,0
01/06/2024	0,01	21	85,73	252	943,1	85,41	0,01	0,0
01/07/2024	0,00	0	27,79	325	305,7	27,79	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	24,74	287	272,1	24,74	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	23,27	282	255,9	23,27	0,00	0,0
01/10/2024	0,00	0	27,78	330	305,6	27,78	0,00	0,0
01/11/2024	0,00	0	27,27	287	300,0	27,27	0,00	3,4
01/12/2024	0,00	0	35,73	292	393,0	35,73	0,00	36,3
MAX	**34,9**	**7 770**	**92,2**	**330**	**1 014**	**92**	**0**	**99**
MOYEN	**7,3**	**1 641**	**28,7**	**191**	**396**	**36**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**87,2**	**19 697**	**344,7**	**2 296**	**4 751**	**431**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**22%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR84 Stade					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	1,07	51	0,98	48	20,5	69,0
01/02/2024	1,16	62	1,09	60	22,5	71,6
01/03/2024	1,05	66	1,01	61	20,6	27,0
01/04/2024	0,97	56	0,97	56	19,4	0,0
01/05/2024	1,42	84	1,39	84	28,1	99,0
01/06/2024	0,97	56	0,93	56	18,9	0,0
01/07/2024	1,11	67	1,01	62	21,3	0,0
01/08/2024	1,40	89	1,30	85	27,0	0,0
01/09/2024	1,61	97	1,56	93	31,7	0,0
01/10/2024	1,59	91	1,53	90	31,2	0,0
01/11/2024	1,40	73	1,22	67	26,2	3,4
01/12/2024	1,35	62	1,34	63	26,9	36,3
MAX	**1,6**	**97**	**1,6**	**93**	**32**	**99**
MOYEN	**1,3**	**71**	**1,2**	**69**	**25**	**26**
MIN	**1,0**	**51**	**0,9**	**48**	**19**	**0**
TOTAL	**15,1**	**854**	**14,3**	**825**	**294**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

	PR85 Fortisle							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	4,42	172	4,37	173	131,8	8,78	0,00	69,0
01/02/2024	3,81	146	3,76	145	113,5	7,57	0,00	71,6
01/03/2024	4,08	154	4,04	154	121,9	8,13	0,00	27,0
01/04/2024	3,65	138	3,63	138	109,3	7,28	0,00	0,0
01/05/2024	4,18	156	4,13	155	124,8	8,32	0,00	99,0
01/06/2024	3,77	146	3,72	146	112,4	7,49	0,00	0,0
01/07/2024	3,49	136	3,44	136	103,8	6,92	0,00	0,0
01/08/2024	3,87	153	3,83	153	115,5	7,61	0,05	0,0
01/09/2024	3,28	134	3,22	134	97,5	6,50	0,00	0,0
01/10/2024	3,55	144	3,46	143	105,1	7,01	0,00	0,0
01/11/2024	3,59	148	3,58	148	107,5	7,16	0,00	3,4
01/12/2024	3,54	141	3,47	140	105,2	7,01	0,00	36,3
MAX	**4,4**	**172**	**4,4**	**173**	**132**	**9**	**0**	**99**
MOYEN	**3,8**	**147**	**3,7**	**147**	**112**	**7**	**0**	**26**
MIN	**3,3**	**134**	**3,2**	**134**	**97**	**7**	**0**	**0**
TOTAL	**45,2**	**1 768**	**44,6**	**1 765**	**1 348**	**90**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**9%**							

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR86 Garancières							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	7,07	98	6,72	114	413,1	13,82	0,00	69,0
01/02/2024	3,75	81	4,47	81	246,3	8,24	0,00	71,6
01/03/2024	4,11	85	4,25	84	250,3	8,37	0,00	27,0
01/04/2024	4,22	82	4,72	76	267,9	8,95	0,00	0,0
01/05/2024	5,38	98	5,21	98	317,4	10,61	0,00	99,0
01/06/2024	2,97	67	3,11	66	182,2	6,10	0,00	0,0
01/07/2024	3,42	77	3,49	76	207,1	6,93	0,00	0,0
01/08/2024	3,22	77	3,46	77	200,2	6,70	0,00	0,0
01/09/2024	3,39	78	3,73	78	213,2	7,13	0,00	0,0
01/10/2024	3,53	77	3,45	79	209,0	6,99	0,00	0,0
01/11/2024	3,29	74	3,93	71	216,1	7,23	0,00	3,4
01/12/2024	3,65	74	4,25	73	236,9	7,92	0,00	36,3
MAX	**7,1**	**98**	**6,7**	**114**	**413**	**14**	**0**	**99**
MOYEN	**4,0**	**81**	**4,2**	**81**	**247**	**8**	**0**	**26**
MIN	**3,0**	**67**	**3,1**	**66**	**182**	**6**	**0**	**0**
TOTAL	**48,0**	**968**	**50,8**	**973**	**2 960**	**99**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**24%**							

	PR87 Rue du Val					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	2,47	231	1,79	231	54,1	69,0
01/02/2024	2,47	231	1,80	231	54,2	71,6
01/03/2024	2,60	243	1,93	244	57,6	27,0
01/04/2024	2,73	255	1,98	255	59,8	0,0
01/05/2024	5,09	473	3,70	473	111,6	99,0
01/06/2024	3,21	300	2,33	300	70,3	0,0
01/07/2024	2,97	277	2,18	271	65,4	0,0
01/08/2024	2,78	-18 658	2,03	257	61,1	0,0
01/09/2024	3,46	3	2,54	313	76,1	0,0
01/10/2024	2,60	3	1,90	239	57,2	0,0
01/11/2024	2,21	2	1,62	202	48,6	3,4
01/12/2024	2,36	2	1,75	209	52,2	36,3
MAX	**5,1**	**473**	**3,7**	**473**	**112**	**99**
MOYEN	**2,9**	**-1 386**	**2,1**	**269**	**64**	**26**
MIN	**2,2**	**-18 658**	**1,6**	**202**	**49**	**0**
TOTAL	**35,0**	**-16 637**	**25,5**	**3 225**	**768**	**306**
%Tps Pluie	**0%**					

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR89 Ancienne station							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	331,23	478	95,75	608	9 440	682,64	0,00	69,0
01/02/2024	123,94	209	191,21	1 120	8 671	503,64	0,00	71,6
01/03/2024	196,76	278	180,57	1 018	9 321	601,27	0,00	27,0
01/04/2024	332,99	446	105,89	516	9 137	700,06	0,00	0,0
01/05/2024	348,18	446	143,94	536	10 647	785,22	0,00	99,0
01/06/2024	251,28	307	150,31	802	8 765	640,37	0,00	0,0
01/07/2024	9,48	18	298,93	1 538	8 590	490,01	0,00	0,0
01/08/2024	0,00	0	280,18	1 452	7 311	445,23	0,00	0,0
01/09/2024	0,00	0	335,73	1 391	8 350	534,02	0,00	0,0
01/10/2024	64,07	80	310,47	1 821	8 890	595,07	0,00	0,0
01/11/2024	40,69	60	299,26	2 434	8 753	539,41	0,00	3,4
01/12/2024	322,10	486	168,50	715	9 765	485,26	0,00	36,3
MAX	**348,2**	**486**	**335,7**	**2 434**	**10 647**	**785**	**0**	**99**
MOYEN	**168,4**	**234**	**213,4**	**1 163**	**8 970**	**584**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**95,8**	**516**	**7 311**	**445**	**0**	**0**
TOTAL	**2 020,7**	**2 808**	**2 560,7**	**13 951**	**107 640**	**7 002**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**10%**							

- VERNOUILLET

	PR30 Piscine									
	POMPE 1		POMPE 2		POMPE 3		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	13,39	275	191,36	4 183	210,02	3 448	24 886,2	313,47	12,02	69,0
01/02/2024	0,00	0	178,98	4 367	191,57	4 363	22 233,0	282,08	9,02	71,6
01/03/2024	0,00	0	180,30	4 551	196,88	4 548	22 630,8	294,68	4,45	27,0
01/04/2024	0,00	0	174,20	4 327	188,51	4 325	21 762,6	273,00	10,77	0,0
01/05/2024	0,04	4	200,91	4 471	223,86	4 143	25 488,4	313,66	16,39	99,0
01/06/2024	0,00	0	356,41	8 759	0,00	0	21 384,7	285,90	0,00	0,0
01/07/2024	0,00	0	354,67	5 178	178,60	2 075	31 996,2	409,91	10,57	0,0
01/08/2024	0,00	0	193,43	3 697	273,90	3 680	28 039,9	357,62	10,81	0,0
01/09/2024	0,00	0	238,27	3 017	295,80	2 595	32 044,3	395,37	19,94	0,0
01/10/2024	0,00	0	525,61	3 531	124,78	534	39 023,5	487,72	20,38	0,0
01/11/2024	0,18	11	295,28	2 768	430,92	1 410	43 582,6	404,60	110,75	3,4
01/12/2024	0,00	0	576,32	3 498	655,74	572	73 924,0	152,06	521,15	36,3
MAX	**13,4**	**275**	**576,3**	**8 759**	**655,7**	**4 548**	**73 924**	**488**	**521**	**99**
MOYEN	**1,1**	**24**	**288,8**	**4 362**	**247,5**	**2 641**	**32 250**	**331**	**62**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**174,2**	**2 768**	**0,0**	**0**	**21 385**	**152**	**0**	**0**
TOTAL	**13,6**	**290**	**3 465,7**	**52 347**	**2 970,6**	**31 693**	**386 996**	**3 970**	**746**	**306**
%Tps Pluie	**18%**									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR34 Denis Papin Sud					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	556,04	41	0,00	0	83 406,3	69,0
01/02/2024	677,16	18	0,00	0	101 574,6	71,6
01/03/2024	298,16	609	0,00	0	44 724,2	27,0
01/04/2024	318,15	395	0,00	0	47 722,5	0,0
01/05/2024	305,94	1 276	0,00	0	45 890,9	99,0
01/06/2024	159,32	450	0,00	0	23 897,9	0,0
01/07/2024	135,87	2 205	0,00	0	20 380,5	0,0
01/08/2024	22,37	3 413	0,00	0	3 355,6	0,0
01/09/2024	38,36	4 723	0,00	0	5 754,1	0,0
01/10/2024	44,58	2 435	0,00	0	6 687,2	0,0
01/11/2024	14,62	2 230	0,00	0	2 192,5	3,4
01/12/2024	13,40	2 104	0,00	0	2 010,5	36,3
MAX	**677,2**	**4 723**	**0,0**	**0**	**101 575**	**99**
MOYEN	**215,3**	**1 658**	**0,0**	**0**	**32 300**	**26**
MIN	**13,4**	**18**	**0,0**	**0**	**2 011**	**0**
TOTAL	**2 584,0**	**19 899**	**0,0**	**0**	**387 597**	**306**
%Tps Pluie	**61%**					

	PR36 Hoche							
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,00	0	155,41	2 323	6 855,1	155,41	0,00	69,0
01/02/2024	0,00	0	143,52	1 980	5 449,4	143,52	0,00	71,6
01/03/2024	65,16	1 011	82,24	1 151	5 873,8	146,78	0,31	27,0
01/04/2024	157,64	2 143	0,00	0	6 400,8	157,64	0,00	0,0
01/05/2024	187,61	2 340	0,00	0	7 996,2	187,61	0,00	99,0
01/06/2024	144,37	2 088	0,00	0	5 736,5	144,37	0,00	0,0
01/07/2024	142,18	2 028	0,00	0	5 311,6	142,18	0,00	0,0
01/08/2024	116,51	1 813	0,00	0	4 321,4	116,51	0,00	0,0
01/09/2024	139,17	2 016	0,00	0	5 559,2	139,17	0,00	0,0
01/10/2024	158,75	2 042	0,00	0	5 869,3	158,75	0,00	0,0
01/11/2024	141,58	2 026	0,00	0	5 194,1	141,58	0,00	3,4
01/12/2024	157,62	2 312	0,00	0	6 962,3	157,62	0,00	36,3
MAX	**187,6**	**2 340**	**155,4**	**2 323**	**7 996**	**188**	**0**	**99**
MOYEN	**117,5**	**1 652**	**31,8**	**455**	**5 961**	**149**	**0**	**26**
MIN	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**4 321**	**117**	**0**	**0**
TOTAL	**1 410,6**	**19 819**	**381,2**	**5 454**	**71 530**	**1 791**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**13%**							

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

- VERT-EN-DROUAIS

	PR200 Waddington									
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	52,20	4 389	0,00	0	0,04	23	650,8	52,15	0,00	69,0
01/02/2024	47,14	3 744	0,00	0	0,01	1	589,1	47,14	0,00	71,6
01/03/2024	40,20	839	30,54	89	0,00	0	535,4	9,68	30,52	27,0
01/04/2024	35,35	109	35,16	109	0,00	0	471,7	0,19	35,16	0,0
01/05/2024	38,36	120	38,15	120	0,00	0	503,0	0,21	38,15	99,0
01/06/2024	29,08	94	28,92	94	0,00	0	381,3	0,16	28,92	0,0
01/07/2024	28,83	93	28,67	93	0,00	0	377,9	0,16	28,67	0,0
01/08/2024	28,83	93	28,67	93	0,00	0	377,9	0,16	28,67	0,0
01/09/2024	27,90	90	27,74	90	0,00	0	365,7	0,16	27,75	0,0
01/10/2024	28,83	93	28,67	93	0,00	0	377,9	0,16	28,67	0,0
01/11/2024	27,90	90	27,74	90	0,00	0	365,7	0,16	27,75	3,4
01/12/2024	28,83	93	28,67	93	0,00	0	377,9	0,16	28,67	36,3
MAX	**52,2**	**4 389**	**38,2**	**120**	**0,0**	**23**	**651**	**52**	**38**	**99**
MOYEN	**34,5**	**821**	**25,2**	**80**	**0,0**	**2**	**448**	**9**	**25**	**26**
MIN	**27,9**	**90**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**366**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**413,5**	**9 847**	**302,9**	**964**	**0,1**	**24**	**5 374**	**111**	**303**	**306**
%Tps Pluie	**22%**									

	PR201 Eglise									
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	95,50	634	96,25	635	15,86	1 269	725,5	153,40	0,00	69,0
01/02/2024	95,79	616	96,86	615	15,39	1 232	722,4	154,14	0,00	71,6
01/03/2024	106,32	451	105,96	541	3,61	289	787,4	82,49	54,68	27,0
01/04/2024	86,33	307	86,29	434	0,00	0	446,0	40,06	61,46	0,0
01/05/2024	113,58	412	113,55	538	0,00	0	781,2	58,87	76,91	99,0
01/06/2024	73,26	194	75,07	281	0,00	0	339,2	16,50	63,87	0,0
01/07/2024	66,85	194	66,60	239	0,00	0	333,9	10,64	60,11	0,0
01/08/2024	58,84	163	58,40	185	0,00	0	313,8	5,55	55,17	0,0
01/09/2024	67,24	198	66,98	198	0,00	0	247,6	0,26	66,98	0,0
01/10/2024	77,50	348	77,43	370	0,00	0	433,5	9,11	71,86	0,0
01/11/2024	19,14	108	78,91	612	0,00	0	363,2	57,87	13,07	3,4
01/12/2024	105,96	452	107,63	422	0,00	0	510,3	8,95	101,29	36,3
MAX	**113,6**	**634**	**113,5**	**635**	**15,9**	**1 269**	**787**	**154**	**101**	**99**
MOYEN	**80,5**	**340**	**85,8**	**423**	**2,9**	**233**	**500**	**50**	**52**	**26**
MIN	**19,1**	**108**	**58,4**	**185**	**0,0**	**0**	**248**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**966,3**	**4 077**	**1 029,9**	**5 070**	**34,9**	**2 790**	**6 004**	**598**	**625**	**306**
%Tps Pluie	**46%**									

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR202 Ruisseaux											
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		NUTRIOX		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	204,05	1 100	0,00	0	13,75	1 100	743,97	0	1 574,4	163,52	0,00	69,0
01/02/2024	219,16	1 000	0,00	0	12,50	1 001	695,94	1	1 598,4	175,30	0,00	71,6
01/03/2024	162,88	725	0,00	0	9,03	722	742,97	0	1 219,0	130,26	0,00	27,0
01/04/2024	111,14	485	0,00	0	6,06	485	719,97	1	813,7	89,09	0,00	0,0
01/05/2024	141,39	571	0,00	0	5,73	458	743,91	6	1 087,5	113,16	0,00	99,0
01/06/2024	108,70	284	0,00	0	3,52	282	719,97	0	508,3	86,98	0,00	0,0
01/07/2024	93,00	268	0,00	0	3,31	264	743,95	3	462,4	74,57	0,00	0,0
01/08/2024	92,08	226	0,00	0	2,74	219	743,96	4	402,9	73,90	0,00	0,0
01/09/2024	141,11	209	2,40	6	2,59	207	719,97	0	341,2	111,77	1,64	0,0
01/10/2024	197,16	331	0,00	0	2,54	203	744,97	3	611,0	157,92	0,00	0,0
01/11/2024	168,84	337	0,00	0	4,21	337	718,48	4	642,7	135,08	0,00	3,4
01/12/2024	174,19	439	0,00	0	5,46	437	743,95	5	675,9	139,56	0,00	36,3
MAX	**219,2**	**1 100**	**2,4**	**6**	**13,8**	**1 100**	**745,0**	**6**	**1 598**	**175**	**2**	**99**
MOYEN	**151,1**	**498**	**0,2**	**1**	**6,0**	**476**	**731,8**	**2**	**828**	**121**	**0**	**26**
MIN	**92,1**	**209**	**0,0**	**0**	**2,5**	**203**	**695,9**	**0**	**341**	**74**	**0**	**0**
TOTAL	**1 813,7**	**5 975**	**2,4**	**6**	**71,4**	**5 715**	**8 782,0**	**27**	**9 937**	**1 451**	**2**	**306**
%Tps Pluie	**54%**											

	PR203 Clos Barreau									
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	222,00	1 162	0,00	0	14,51	1 224	988,6	178,39	0,00	69,0
01/02/2024	230,29	1 024	0,00	0	12,80	1 039	966,8	184,93	0,00	71,6
01/03/2024	213,67	941	0,00	0	11,73	986	969,3	171,55	0,00	27,0
01/04/2024	162,46	786	0,00	0	7,43	638	754,5	130,49	0,00	0,0
01/05/2024	325,10	747	0,00	0	5,46	452	1 196,4	260,56	0,00	99,0
01/06/2024	355,37	251	0,00	0	3,11	250	667,9	284,23	0,00	0,0
01/07/2024	154,03	441	0,00	0	4,26	378	696,1	123,09	0,00	0,0
01/08/2024	141,64	511	0,00	0	5,18	438	672,7	113,11	0,00	0,0
01/09/2024	159,81	248	0,00	0	0,00	0	599,2	127,91	0,00	0,0
01/10/2024	189,02	314	0,00	0	0,00	0	721,8	151,28	0,00	0,0
01/11/2024	172,77	285	0,00	0	0,00	0	647,9	138,29	0,00	3,4
01/12/2024	219,29	375	0,00	0	0,00	0	920,4	175,53	0,00	36,3
MAX	**355,4**	**1 162**	**0,0**	**0**	**14,5**	**1 224**	**1 196**	**284**	**0**	**99**
MOYEN	**212,1**	**590**	**0,0**	**0**	**5,4**	**450**	**817**	**170**	**0**	**26**
MIN	**141,6**	**248**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**599**	**113**	**0**	**0**
TOTAL	**2 545,5**	**7 085**	**0,0**	**0**	**64,5**	**5 405**	**9 801**	**2 039**	**0**	**306**
%Tps Pluie	**28%**									

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR204 Corneilles									
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	23,90	345	23,40	335	0,00	0	240,6	0,50	23,39	69,0
01/02/2024	143,63	372	142,64	365	0,00	1	1 922,4	1,03	142,62	71,6
01/03/2024	22,99	458	22,29	458	0,01	1	315,4	0,72	22,28	27,0
01/04/2024	22,58	453	21,91	453	0,00	0	324,7	0,67	21,91	0,0
01/05/2024	23,82	486	23,10	484	0,00	0	331,3	0,72	23,10	99,0
01/06/2024	21,45	470	19,58	446	0,00	0	286,8	1,87	19,58	0,0
01/07/2024	21,81	478	18,90	432	0,00	1	290,7	2,91	18,89	0,0
01/08/2024	18,56	411	16,13	372	0,00	0	255,2	2,43	16,13	0,0
01/09/2024	20,52	462	19,78	461	0,00	0	288,8	0,73	19,78	0,0
01/10/2024	21,84	472	21,14	472	0,00	0	317,5	0,70	21,14	0,0
01/11/2024	22,19	481	21,49	472	0,00	0	328,4	0,71	21,49	3,4
01/12/2024	24,60	503	23,85	503	0,00	0	364,1	0,75	23,85	36,3
MAX	**143,6**	**503**	**142,6**	**503**	**0,0**	**1**	**1 922**	**3**	**143**	**99**
MOYEN	**32,3**	**449**	**31,2**	**438**	**0,0**	**0**	**439**	**1**	**31**	**26**
MIN	**18,6**	**345**	**16,1**	**335**	**0,0**	**0**	**241**	**1**	**16**	**0**
TOTAL	**387,9**	**5 391**	**374,2**	**5 253**	**0,0**	**3**	**5 266**	**14**	**374**	**306**
%Tps Pluie	**50%**									

	PR205 Orme											
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		COMPRESSEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	0,72	36	0,76	35	0,06	7	0,00	0	18,2	1,47	0,00	69,0
01/02/2024	0,53	26	0,56	26	0,03	4	0,00	0	13,6	1,09	0,00	71,6
01/03/2024	0,83	35	0,75	35	0,00	1	0,00	0	19,6	1,58	0,00	27,0
01/04/2024	0,56	27	0,56	26	0,00	0	0,00	0	13,8	1,12	0,00	0,0
01/05/2024	0,93	24	0,93	24	0,00	0	0,00	0	15,9	0,60	0,63	99,0
01/06/2024	1,05	17	1,03	17	0,00	0	0,00	0	14,1	0,02	1,03	0,0
01/07/2024	1,31	23	1,28	23	0,00	1	0,00	0	17,5	0,03	1,28	0,0
01/08/2024	0,86	35	0,91	36	0,00	0	0,00	0	18,2	1,11	0,33	0,0
01/09/2024	0,54	31	0,56	30	0,00	0	0,00	0	13,5	1,09	0,00	0,0
01/10/2024	0,61	36	0,67	38	0,00	0	0,00	0	15,9	1,28	0,00	0,0
01/11/2024	0,57	36	0,61	35	0,00	0	0,00	0	14,6	1,18	0,00	3,4
01/12/2024	0,77	43	0,82	43	0,00	0	0,00	0	19,8	1,60	0,00	36,3
MAX	**1,3**	**43**	**1,3**	**43**	**0,1**	**7**	**0,0**	**0**	**20**	**2**	**1**	**99**
MOYEN	**0,8**	**31**	**0,8**	**31**	**0,0**	**1**	**0,0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**26**
MIN	**0,5**	**17**	**0,6**	**17**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**9,3**	**369**	**9,4**	**368**	**0,1**	**13**	**0,0**	**0**	**195**	**12**	**3**	**306**
%Tps Pluie	**8%**											

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR206 Sablons									
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	4,54	88	4,42	88	0,00	0	60,6	0,11	4,42	69,0
01/02/2024	3,33	64	3,25	64	0,00	0	1 922,4	0,08	3,25	71,6
01/03/2024	3,46	72	3,39	70	0,00	0	315,4	0,16	3,34	27,0
01/04/2024	4,50	90	4,38	90	0,00	0	324,7	0,12	4,38	0,0
01/05/2024	4,65	93	4,53	93	0,00	0	331,3	0,12	4,53	99,0
01/06/2024	4,50	90	4,38	90	0,00	0	286,8	0,12	4,38	0,0
01/07/2024	4,65	93	4,53	93	0,00	0	290,7	0,12	4,53	0,0
01/08/2024	4,65	93	4,53	93	0,00	0	255,2	0,12	4,53	0,0
01/09/2024	4,50	90	4,38	90	0,00	0	288,8	0,12	4,38	0,0
01/10/2024	4,65	93	4,53	93	0,00	0	317,5	0,12	4,53	0,0
01/11/2024	4,50	90	4,38	90	0,00	0	328,4	0,12	4,38	3,4
01/12/2024	4,65	93	4,53	93	0,00	0	364,1	0,12	4,53	36,3
MAX	**4,7**	**93**	**4,5**	**93**	**0,0**	**0**	**1 922**	**0**	**5**	**99**
MOYEN	**4,4**	**87**	**4,3**	**87**	**0,0**	**0**	**424**	**0**	**4**	**26**
MIN	**3,3**	**64**	**3,2**	**64**	**0,0**	**0**	**61**	**0**	**3**	**0**
TOTAL	**52,6**	**1 049**	**51,2**	**1 047**	**0,0**	**0**	**5 086**	**1**	**51**	**306**
%Tps Pluie	**47%**									

	PR207 Luat											
	POMPE 1		POMPE 2		AGITATEUR		COMPRESSEUR		Volume pompé total (m3)	Temps marche 1 POMPE (h)	Temps marche 2 POMPES (h)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage				
01/01/2024	3,92	99	3,79	99	0,00	0	0,00	0	52,2	0,14	3,79	69,0
01/02/2024	3,85	101	3,72	101	0,00	0	0,00	0	51,3	0,14	3,72	71,6
01/03/2024	4,11	115	3,90	113	0,00	0	0,00	0	54,7	0,23	3,89	27,0
01/04/2024	3,93	112	3,78	112	0,00	0	0,00	0	52,3	0,15	3,78	0,0
01/05/2024	4,34	126	4,03	121	0,00	0	0,00	0	57,5	0,31	4,03	99,0
01/06/2024	3,90	119	3,70	118	0,00	0	0,00	0	51,6	0,19	3,70	0,0
01/07/2024	3,90	118	3,56	112	0,00	1	0,00	0	51,5	0,34	3,55	0,0
01/08/2024	4,46	134	4,18	131	0,00	0	0,00	0	59,2	0,29	4,18	0,0
01/09/2024	4,84	149	4,63	149	0,00	0	0,00	0	64,2	0,21	4,63	0,0
01/10/2024	5,48	163	5,25	165	0,00	0	0,00	0	72,8	0,23	5,25	0,0
01/11/2024	5,25	161	5,04	156	0,00	0	0,00	0	69,7	0,22	5,03	3,4
01/12/2024	5,73	165	5,50	165	0,00	0	0,00	0	76,0	0,23	5,50	36,3
MAX	**5,7**	**165**	**5,5**	**165**	**0,0**	**1**	**0,0**	**0**	**76**	**0**	**5**	**99**
MOYEN	**4,5**	**130**	**4,3**	**129**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**59**	**0**	**4**	**26**
MIN	**3,9**	**99**	**3,6**	**99**	**0,0**	**0**	**0,0**	**0**	**51**	**0**	**4**	**0**
TOTAL	**53,7**	**1 562**	**51,1**	**1 542**	**0,0**	**1**	**0,0**	**0**	**713**	**3**	**51**	**306**
%Tps Pluie	**3%**											

- VILLEMEUX-SUR-EURE

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR91 Saint-Pierre					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume pompé total (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	12,75	333	11,23	332	479,5	69,0
01/02/2024	11,59	314	9,87	314	429,3	71,6
01/03/2024	13,57	366	11,48	367	501,0	27,0
01/04/2024	12,01	341	10,22	340	444,8	0,0
01/05/2024	12,61	380	10,71	381	466,4	99,0
01/06/2024	10,88	348	9,44	348	406,4	0,0
01/07/2024	10,51	343	8,99	343	390,0	0,0
01/08/2024	9,42	326	8,20	324	352,4	0,0
01/09/2024	10,88	352	9,45	351	406,6	0,0
01/10/2024	16,36	492	14,27	492	612,7	0,0
01/11/2024	11,19	338	9,67	336	417,2	3,4
01/12/2024	11,95	351	10,64	352	451,9	36,3
MAX	**16,4**	**492**	**14,3**	**492**	**613**	**99**
MOYEN	**12,0**	**357**	**10,3**	**357**	**446**	**26**
MIN	**9,4**	**314**	**8,2**	**314**	**352**	**0**
TOTAL	**143,7**	**4 284**	**124,2**	**4 280**	**5 358**	**306**
%Tps Pluie	**5%**					

	PR92 Jardins					
	POMPE 1		POMPE 2		Volume débitmètre (m3)	Pluviométrie (mm)
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage		
01/01/2024	346,28	1 136	0,00	0	6 891	69,0
01/02/2024	308,32	1 235	0,19	12	3 650	71,6
01/03/2024	150,77	254	247,64	1 132	2 507	27,0
01/04/2024	162,04	932	145,99	916	0	0,0
01/05/2024	154,61	1 079	177,13	1 503	0	99,0
01/06/2024	139,72	1 293	125,92	1 292	0	0,0
01/07/2024	123,96	1 487	115,46	1 487	0	0,0
01/08/2024	107,87	1 208	102,00	1 207	0	0,0
01/09/2024	121,60	910	110,23	911	0	0,0
01/10/2024	204,62	552	209,21	551	4 381	0,0
01/11/2024	142,40	904	133,00	903	5 599	3,4
01/12/2024	145,09	946	152,33	945	5 898	36,3
MAX	**346,3**	**1 487**	**247,6**	**1 503**	**6 891**	**99**
MOYEN	**175,6**	**995**	**126,6**	**905**	**2 411**	**26**
MIN	**107,9**	**254**	**0,0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL	**2 107,3**	**11 936**	**1 519,1**	**10 859**	**28 926**	**306**
%Tps Pluie	**82%**					

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251015-CC2025-154-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/10/2025
Publication : 15/10/2025

	PR93 Mesnil Ponceau						
	POMPE 1		POMPE 2				
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	307,54	2 818	0,00	0	9 397	2 220	69,0
01/02/2024	284,40	1 732	0,07	24	5 184	2 020	71,6
01/03/2024	317,94	750	65,76	172	5 944	2 657	27,0
01/04/2024	183,55	974	87,81	732	0	1 797	0,0
01/05/2024	43,31	357	261,76	2 184	0	1 912	99,0
01/06/2024	17,17	178	234,70	2 346	0	1 586	0,0
01/07/2024	92,18	1 207	131,32	1 548	0	1 440	0,0
01/08/2024	92,39	1 190	102,21	1 177	0	1 257	0,0
01/09/2024	102,89	1 190	121,68	1 190	0	1 426	0,0
01/10/2024	132,18	672	302,96	671	6 366	2 723	0,0
01/11/2024	128,97	1 122	145,06	1 122	8 234	1 742	3,4
01/12/2024	140,69	1 214	158,33	1 214	8 773	1 897	36,3
MAX	**317,9**	**2 818**	**303,0**	**2 346**	**9 397**	**2 723**	**99**
MOYEN	**153,6**	**1 117**	**134,3**	**1 032**	**3 658**	**1 890**	**26**
MIN	**17,2**	**178**	**0,0**	**0**	**0**	**1 257**	**0**
TOTAL	**1 843,2**	**13 404**	**1 611,7**	**12 380**	**43 898**	**22 676**	**306**
%Tps Pluie	**83%**						

	PR94 Mauzaise						
	POMPE 1		POMPE 2				
	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Temps de marche (h)	Nombre démarrage	Volume débitmètre (m3)	EDF (KWh)	Pluviométrie (mm)
01/01/2024	133,51	589	0,00	0	291	177	69,0
01/02/2024	150,43	337	0,00	0	274	158	71,6
01/03/2024	50,96	354	0,00	0	288	88	27,0
01/04/2024	55,42	376	0,00	0	335	87	0,0
01/05/2024	171,35	1 965	0,00	0	370	168	99,0
01/06/2024	166,08	2 706	0,00	0	298	161	0,0
01/07/2024	93,88	1 174	0,00	0	324	104	0,0
01/08/2024	57,11	386	0,00	0	327	76	0,0
01/09/2024	49,55	248	0,00	0	326	73	0,0
01/10/2024	64,76	310	0,00	0	439	89	0,0
01/11/2024	53,60	252	0,00	0	311	90	3,4
01/12/2024	51,52	381	0,00	0	313	99	36,3
MAX	**171,3**	**2 706**	**0,0**	**0**	**439**	**177**	**99**
MOYEN	**91,5**	**757**	**0,0**	**0**	**325**	**114**	**26**
MIN	**49,5**	**248**	**0,0**	**0**	**274**	**73**	**0**
TOTAL	**1 098,2**	**9 078**	**0,0**	**0**	**3 896**	**1 370**	**306**
%Tps Pluie	**0%**						

19 rue des Osmeaux 28100 DREUX
Tél. 02 37 43 14 30
